

**UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE
APURÍMAC**

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN



**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL SECTOR
EDUCACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 2013 – 2014**

**TÉISIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

PEÑA PEDRAZA, Kathia

Abancay, Febrero del 2017

PERÚ



**UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS
DE APURÍMAC**

**FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN**



**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL SECTOR
EDUCACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 2013 – 2014**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

PEÑA PEDRAZA, Kathia

Abancay, Febrero del 2017

PERÚ



**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL SECTOR
EDUCACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 2013 – 2014**



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

DR. LEONARDO ADOLFO PRADO CARDENAS

Rector (I)

MG. MAURO HUAYAPA HUAYNACHO

Vicerrector Académico

DR. WILSON JHON MOLLOCONDO FLORES

Vicerrector de Investigación



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIDADES DE LA FACULTAD

MG. VÍCTOR CARMELINO VARGAS GODOY
Decano de la facultad de Administración

MG. ROSARIO LETICIA VALER MONTESINOS
Director de escuela Académico Profesional de Administración

MG. SILVIA SOLEDAD LOPEZ IBAÑEZ
Dirección de departamento académico de Administración






MIEMBROS DEL JURADO


UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Victor C. Vargas Godoy
DOCENTE ASOCIADO
E.A.P.A.

Mg. Víctor Carmelino VARGAS GODOY
Presidente


UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Rober Anibal Luciano Alipio
DOCENTE

Dr. Rober Aníbal LUCIANO ALIPIO
Primer miembro


UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Dr. Mauricio R. Escalante Cardenas
DOCENTE

Dr. Mauricio Raúl ESCALANTE CARDENAS
Segundo Miembro

CONSTANCIA DE CORRECCIÓN DE ESTILO

Quien suscribe, Licenciado en Educación con especialidad en comunicación.

HACE CONSTAR

Que el texto de informe final de la tesis **“MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 2013 - 2014”**, presentado por la bachiller **KATHIA PEÑA PEDRAZA**, fue revisado por el suscrito, habiendo corregido la parte formal, estructural y gramatical por tanto está expedito para su impresión final.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Abancay, Enero del año 2017



Félix Pataca Rodríguez
Esp. COMUNICACION
REG. N.º 11111111111111111111

Lic. Félix Pataca Rodríguez

Abancay, 26 de Enero del 2017

Mg. Rosario Leticia Valer Montesinos
DIRECTOR DE LA EAP. DE ADMINISTRACIÓN - FA – UNAMBA

Asunto: Visto bueno del Informe Final de Tesis

Es particularmente grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo comunicarle que en calidad de asesor doy visto bueno al informe final de Tesis titulado "MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN", presentado por la Bach, KATHIA PEÑA PEDRAZA, para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones y estima personal.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS DE ARURIMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

[Firma manuscrita]

.....
Dr. José Abdón Sotomayor Chahuaylla
DOCENTE ORDINARIO

Dr. José Abdón SOTOMAYOR CHAHUAYLLA
Docente Asesor

DEDICATORIA

A Dios por estar cada día en mi camino, por darme fe, esperanza y amor en mi vida y mi corazón, por haberme puesto en mi camino aquellas personas que han sido mi soporte y compañía.

Con todo mi amor y admiración para las personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento mis queridos padres.

Raúl Felipe y Simiona



AGRADECIMIENTO

A Dios por ser mi guía, mi protector y mi fuerza.

A mis padres y hermanos por su ánimo y apoyo en esta nueva etapa de mi vida académica.

A la universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, mi alma mater.

A la facultad de Administración y a todos sus docentes por los conocimientos impartidos que me dieron una nueva comprensión de la vida.

A mi asesor, Dr. José Abdón Sotomayor Chahuaylla por su tiempo comprensión e incansable apoyo.

Al Mg. Cristian Yunion Puga Peña, amigo y compañero que me colaborò desinteresadamente.

A todos mis amigos de la facultad que hicieron de la Universidad un lugar inolvidable que siempre añoraré.



RESÚMEN

La presente tesis tiene como finalidad describir el Monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión pública a nivel de perfil del sector educación elaborados en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac.

En la oficina Regional de Pre Inversión no dan énfasis en el seguimiento y monitoreo durante la formulación de proyectos de inversión pública, como resultado se observa proyectos viables en un tiempo mayor al tiempo establecido.

Por otro lado para lograr una buena gestión pública y contribuir al desarrollo del Gobierno Regional de Apurímac. Es importante contar con profesionales capacitados y con experiencia en formulación de proyectos educativos para dar solución a los problemas presentados, que cada proyecto cuente con su propio equipo multidisciplinario como indica en el plan de trabajo y/o términos de referencia, mayor coordinación con la Oficina de Programaciones e Inversiones, a la vez aumento del capital humano para que las evaluaciones se entreguen en el tiempo establecido por parte de la OPI, que los proyectos formulados cumplan con el tiempo establecidos en los planes de trabajo y términos de referencia, los coordinadores y jefes de proyectos tiene que estar en constante comunicación tomar decisiones en base a la situación actual en la que se encuentran dichos proyectos y tomar acciones de corrección en el tiempo más inmediato para facilitar un adecuado desarrollo de los proyectos, permitiendo dar paso a las siguientes etapas. Sin embargo durante el análisis de los cuadros estadísticos se pudo apreciar que los proyectos de inversión Pública del Sector Educación elaborados en la Oficina Regional de Pre Inversión, no cumplen el cronograma establecido (4 meses) en los planes de trabajo y términos de referencia.

Palabra clave: monitoreo, seguimiento, proyectos de inversión.

ABSTRACT

The present thesis aims to describe the Monitoring and monitoring of public investment projects at the level of the profile of the education sector prepared in the Regional Pre Investment Office of the Regional Government of Apurímac.

In the Regional Office of Pre-Investment do not emphasize the follow-up and monitoring during the formulation of public investment projects, as a result we see viable projects in a time greater than the established time.

On the other hand to achieve a good public management and contribute to the development of the Regional Government of Apurímac. It is important to have trained professionals with experience in formulating educational projects to solve the problems presented, each project has its own multidisciplinary team as indicated in the work plan and / or terms of reference, more coordination with the Office Program and Investments, at the same time an increase in human capital so that evaluations are delivered within the timeframe established by the IPO, that the formulated projects comply with the time established in the work plans and terms of reference, the coordinators and Project managers have to be in constant communication to make decisions based on the current situation in which these projects are located and take corrective actions in the most immediate time to facilitate an adequate development of the projects, allowing to take the following steps . However, during the analysis of the statistical tables, it was possible to appreciate that the Public Investment projects of the Education Sector prepared in the Regional Pre-Investment Office do not meet the established schedule (4 months) in the work plans and terms of reference.

Key word: monitoring, monitoring, investment projects.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Inversión Pública se implementa en nuestro país con la finalidad de elevar la calidad de las inversiones y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto público, para ello, se determinó como unidad básica de análisis al proyecto y su ciclo de vida.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto. Las disposiciones del SNIP se aplican a más de 1980 Unidades Formuladoras (UF) y más de 920 Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) de alrededor de 850 entidades sujetas al sistema entre Ministerios, Institutos, Escuelas Nacionales, Universidades Nacionales, Empresas de FONAFE, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas de Tratamiento Empresarial, etc.

Según **Celeste María Aguilar Sosa** en su proyecto de tesis titulado **“Análisis del actual sistema nacional de inversión pública de Honduras”– 2013**. Permite observar la situación actual del sistema de inversión pública para detectar oportunidades de mejora.

Por otra parte el estudio será de gran importancia en el aporte para la investigación, ya que puntualiza la importancia del Monitoreo y seguimiento de los proyectos, reconociendo cuellos de botella y elementos críticos, a la vez identificar los desafíos más comunes que intervienen en la inversión pública y construir una propuesta de mejora. La importancia de mejorar continuamente los procesos de inversión se debe a la necesidad de crecimiento del país, si el instrumento de política está bien diseñada los efectos positivos serian notorios principalmente en el desarrollo local fortaleciendo la democracia y gobernabilidad de las instituciones públicas, capacitación a los formuladores para mejorar la calidad del proyecto que presentan.

v

En el capítulo I se expone el problema de la investigación, descripción, enunciado, justificación y objetivos de la tesis en mención.

En el capítulo II hace referencia al Sistema nacional de Inversión Pública, así como su importancia. Descripción de la fase de pre inversión donde la elaboración de proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión se basa en las Guías metodológicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En el capítulo III se analiza el diseño metodológico que se va utilizar para la ejecución de la tesis. Es una investigación científica del tipo Básica porque no tiene propósitos aplicativos inmediatos, solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento, en cuanto al diseño de la investigación se utilizó el diseño no experimental longitudinal, donde se recolectan datos a través del tiempo en periodos específicos.

En el capítulo IV se muestra los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación, para la obtención de los indicadores, se empleó cuadros obtenidos de la documentación de proyectos priorizados ingresados a la Oficina Regional de Pre Inversión, fichas registradas en el Banco de Proyectos del SNIP durante el periodo 2013- 2014, Entrevistas al coordinador y formuladores de la Oficina Regional de Pre Inversión del Sector Educación.

El autor.

ABREVIATURA

SISPIP: Sistema de seguimiento de proyectos de inversión

PDT: Plan de Trabajo

TDR: Términos de Referencia

DGPM: Dirección General

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

OPI: Oficina de Programaciones e Inversiones

ORPI: Oficina Regional de Pre Inversión

UF: Unidad Formuladora

UE: Unidad Ejecutora

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MOSIP: Módulo para Seguimiento a la Inversión Pública

SOSEM: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

ÍNDICE

I. CAPÍTULO	1
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.....	1
1.1. Planteamiento del problema de investigación	1
1.1.1. Descripción del problema.....	1
1.1.2. Enunciado del problema.....	4
1.2. Justificación.....	5
1.3. Objetivos de la investigación	6
1.3.1. General.....	6
1.3.2. Específicos.....	6
II. CAPÍTULO	7
MARCO TEORICO.....	7
2.1. Antecedentes de la investigación	7
2.2. Marco Referencial	11
2.3. Definición de términos (Marco conceptual).....	37
III. CAPÍTULO	40
3.1. Tipo y diseño de la investigación.....	40
3.2. Población y muestra	40
3.3. Procedimiento de la investigación.....	41
IV. CAPÍTULO	43
RESULTADOS.....	43
4.1. PROCESO DEL COMITÉ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	43
4.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP PERIODO 2013.	49
4.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS, 2014	57
4.4. PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP AÑO 2014.....	62
4.5. ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCACION DURANTE EL PERIODO 2014	64
Conclusiones.....	84
Recomendaciones.....	85
Bibliografía.....	87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	<i>Quiénes conforman el SNIP</i>	13
Tabla 2	<i>Diferencia entre invierte Perú y el SNIP</i>	36
Tabla 3	<i>Priorización de proyectos según función, 2013</i>	43
Tabla 4	<i>Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac</i>	46
Tabla 5	<i>Modalidad de formulación de proyectos, 2013</i>	48
Tabla 6	<i>Fases de los proyectos registrados en el SNIP, 2013</i>	48
Tabla 7	<i>Niveles de estudio de los proyectos del sector educación, 2013</i>	50
Tabla 8	<i>Tiempo de formulación de los proyectos de la función educación, 2013</i>	51
Tabla 9	<i>Tiempo de formulación en la ORPI, 2013</i>	52
Tabla 10	<i>Tiempo de evaluación en la OPI, 2013</i>	52
Tabla 11	<i>Proyectos priorizados según función, 2014</i>	57
Tabla 12	<i>Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac, 2014</i>	59
Tabla 13	<i>Modalidad de formulación de proyectos, 2014</i>	61
Tabla 14	<i>Fases de proyectos registrados en el SNIP, 2014</i>	62
Tabla 15	<i>Nivel de estudio de los proyectos, 2014</i>	63
Tabla 16	<i>Tiempo de formulación de los proyectos de la función educación, 2014</i>	65
Tabla 17	<i>Tiempo de formulación de los proyectos ORPI, 2014</i>	66
Tabla 18	<i>Tiempo de evaluación de los proyectos OPI, 2014</i>	66

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1</i>	Proyectos antes del SNIP	12
<i>Figura 2</i>	Proyectos después del SNIP	12
<i>Figura 3</i>	Proceso de elaboración y evaluación de un Proyecto.....	22
<i>Figura 4</i>	Procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento.....	25
<i>Figura 5</i>	Proceso de seguimiento y monitoreo de un proyecto de inversión del GRAP.....	31
<i>Figura 6</i>	Priorización de los proyectos según sector, 2013	44
<i>Figura 7</i>	Intervención de los proyectos en las Provincias de Apurímac, 2013.....	47
<i>Figura 8</i>	Modalidad de formulación de proyectos, 2013	48
<i>Figura 9</i>	Fases de los proyectos registrados en el SNIP, 2013.....	49
<i>Figura 10</i>	Niveles de estudio de los proyectos del sector Educación, 2013.....	50
<i>Figura 11</i>	Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación, 2013.....	51
<i>Figura 12</i>	Tiempo de formulación de proyectos de la función Educación en ORPI, 2013	53
<i>Figura 13</i>	Tiempo de evaluación de proyectos de la función Educación en la OPI, 2013	53
<i>Figura 14</i>	Proyectos priorizados según función, 2014	58
<i>Figura 15</i>	Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac, 2014	60
<i>Figura 16</i>	Modalidad de formulación de proyectos, 2014	61
<i>Figura 17</i>	Proyectos registrados en el SNIP, 2014	63
<i>Figura 18</i>	Nivel de estudio de los proyectos, 2014	64
<i>Figura 19</i>	Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación, 2014	65
<i>Figura 20</i>	Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación en la ORPI, 2014.....	67
<i>Figura 21</i>	Tiempo de evaluación de los proyectos del sector Educación en la OPI, 2014.....	67

I. CAPÍTULO

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema de investigación

1.1.1. Descripción del problema

La importancia de la inversión pública resalta cuando esta se traduce en un crecimiento importante en la infraestructura física, que contribuye a impulsar la actividad productiva del país, así como en un mejoramiento de las actividades para la prestación de los servicios básicos.

El desarrollo de la infraestructura en el país es importante para continuar garantizando el crecimiento económico y mejorar nuestra competitividad.

Es por ello que los recursos que se asignen a inversión pública en el presupuesto deben orientarse a la reducción de brechas en sectores prioritarios, dentro de un marco de disciplina fiscal, por ello es importante realizar un seguimiento y monitoreo a las etapas del proyecto de inversión pública logrando una eficiente gestión pública. El seguimiento y monitoreo se realiza en todas las etapas de un proyecto de inversión pública según la *Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública*, en la etapa de pre inversión se utiliza el aplicativo informático Banco de Proyectos del SNIP donde se puede apreciar el estado de los proyectos en formulación, evaluación y proyectos viables registrados por la Oficina de Programaciones e Inversiones en coordinación de la Oficina Regional de Pre Inversión, mientras que la etapa de inversión gracias al sistema operativo de seguimiento y monitoreo SOSEM, (ex módulo para seguimiento a la inversión pública – MOSIP) de acuerdo a la directiva del sistema nacional de inversión pública – SNIP, permite verificar los avances de la ejecución de los proyectos con el fin de supervisar que la fase de inversión sea coherente y

consistente con las condiciones y parámetros de la declaratoria de viabilidad. En la etapa de post inversión según las Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública con la única finalidad son de conocer si fue adecuadamente planteados, ejecutado y está generando resultados.

Actualmente El MEF informó que en el antiguo sistema de inversión existía desorden y lentitud por las excesivas reformulaciones, los proyectos de inversión avanzaban y retrocedían con frecuencia. "Invierte Perú fortalece la fase inicial con una programación estratégica que agilizará la formulación y evaluación de los proyectos, evitando procesos innecesarios",

"El nuevo sistema de inversión, denominado INVIERTE PERÚ, durante este año obtendrá el Reglamento del Decreto Legislativo que reforma el antiguo Sistema de Inversión Pública, que durante el año en curso agilizará la aprobación de proyectos de inversión y flexibilizará su ejecución en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, los gobiernos regionales y locales ya no tendrán que presentar los estudios de perfil y factibilidad. Ahora presentarán un solo documento con la información necesaria para su aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas", "Con este sistema reduciremos los tiempos en la preparación de los proyectos a la mitad y haremos un mejor seguimiento a los mismos. Los peruanos necesitan mejores obras, más rápido; y los Gobernadores Regionales necesitan hacer menos trámites.

La finalidad del Gobierno Regional de Apurímac es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, para el cumplimiento con ello, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de todas sus gerencias Regionales viene formulando y ejecutando diversos tipos de proyectos de inversión pública en cada una de las provincias de la Región Apurímac, tales como proyectos de: educación, salud,

saneamiento, agricultura, energía y minas, protección social, transporte, cultura y deporte y otros. Sin embargo, estos no se desarrollan de manera óptima, uno de los motivos identificados es que no se cuenta con herramientas que permitan realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos de forma adecuada y detallada, así como tomar decisiones en base a la situación actual en la que se encuentran dichos proyectos y tomar acciones de corrección en el tiempo más inmediato para facilitar un adecuado desarrollo de los proyectos, lo cual no contribuye a una eficiente gestión pública del Gobierno Regional de Apurímac.

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica.

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. (28044, 2003)

Los proyectos formulados por las unidades formuladoras en el Gobierno Regional de Apurímac nacen de la necesidad de la población (autoridades, director de la UGELs y padres de familia) donde piden a través de reuniones a la oficina de Desarrollo Social encargado de proyectos de la función educación donde se da la priorización, esta cartera de proyectos es enviado a Gerencia General donde designa a la Oficina Regional de Pre Inversión para su formulación por las dos modalidades, administración directa y por contrata ambos tienen que ser aprobados por la oficina de programación e inversión, los actores principales de la elaboración de un proyecto son los coordinadores y jefes de cada proyecto donde monitorean la elaboración desde el plan de trabajo o contrata con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma planteado en el PDT y TDR

siguiendo las guías metodológicas establecidos por el SNIP hasta la viabilidad, desde el año 2014 la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac optó por poner en marcha un aplicativo SISPIP propio de la oficina, los proyectos son sistematizados y se observa la situación actual en este aplicativo donde ayuda a tomar acciones de corrección en el tiempo más inmediato y evita estancar, para poder continuar con la elaboración del proyecto y finalmente ser viable y ser inscrito con su respectivo código SNIP en el banco de proyectos por la Oficina de Programación e Inversión culminando la fase de pre inversión y pasar a la fase de Inversión, Garantizando un avance significativo en la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Apurímac.

1.1.2. Enunciado del problema

General

¿Cómo es el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac año 2013 - 2014?

Específicos

¿Cómo es el proceso de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac año 2013 - 2014?

¿Cómo están establecidos los plazos en el cronograma del plan de trabajo y términos de referencia de un proyecto de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación en la Oficina Regional

de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac año 2013 - 2014?

¿Cuál es el perfil requerido del profesional para un buen Monitoreo y Seguimiento de un proyecto de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación del Gobierno Regional de Apurímac?

1.2. Justificación

El presente trabajo de investigación permitirá conocer la situación actual de los proyectos del sector educación, para poder identificar los posibles cuellos de botella para intervenir y tomar las medidas correctivas ya que la formulación de los proyectos de inversión pública no se cumplen en los plazos establecidos ocasionado por el deficiente seguimiento y monitoreo por parte de los coordinadores y jefes de los proyectos de la función educación en la etapa de pre inversión.

Y a la vez constituirá una valiosa herramienta de trabajo, para todas las personas que actúan dentro de cada una de las áreas usuarias de la institución, especialmente a los responsables de la Oficina Regional de Pre Inversión con el fin de ayudar en la toma de decisiones, y por su importancia ayudara a todos los profesionales que ejercen un cargo público en dicha institución y a todas las personas usuarias de la Región Apurímac.

De otra parte como es natural y característica del sector público o de la gestión pública lo burocrático que es en la gestión administrativa, cada proceso están ligados al cumplimiento de las funciones estatales en los niveles operativos, técnicos y profesionales comprendidos en las tareas administrativas, así como los niveles especializados bajo sistemas independientes de carrera.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. General

Describir el monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac 2013 - 2014.

1.3.2. Específicos

Describir el proceso de monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac 2013 – 2014.

Describir los plazos establecidos en el cronograma del plan de trabajo y términos de referencia de los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del sector educación de la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac año 2013 – 2014.

Conocer el perfil de los profesionales involucrados en la elaboración de proyectos de inversión pública del sector educación del Gobierno Regional de Apurímac.

II. CAPÍTULO MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Rosa Antonieta Velasco Solano “Propuesta de una metodología técnica para el desarrollo de un Sistema Informático de Monitoreo y Evaluación de los programas y proyectos de inversión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.” - 2011- tesis para optar al título de Diploma Superior en Evaluación de la Gestión Pública, En esta tesis el autor le da énfasis al monitoreo y evaluación de programas y proyectos de inversión a través de un sistema informático con el objetivo de obtener información confiable, relevante, oportuna y actualizada sobre el proceso, además de comprender los principios de la gestión basada en resultados que permita fortalecer las habilidades de las unidades ejecutoras, facilitando en la toma de decisiones y hacer correcciones en el momento oportuno para así garantizar los resultados esperados.

El sistema informático permite sistematizar el monitoreo y evaluación de los proyectos con reportes rápidos en cada uno de sus componentes y fases, para realizar un sistema de monitoreo y evaluación es necesario contar con un grupo de profesionales que elaboren los instrumentos técnicamente y que sean fáciles de manejar e interpretar los resultados. (SOLANO, 2011)

Celeste María Aguilar Sosa “Análisis del actual sistema nacional de inversión pública de Honduras”– 2013- Tesis para optar el grado de Magister en gestión y políticas públicas, El objetivo del estudio es analizar la situación actual del sistema de

inversión pública en Honduras para detectar oportunidades de mejora, analizar fortalezas y debilidades del proceso de inversión, reconociendo cuellos de botella y elementos críticos, a la vez identificar los desafíos más comunes que intervienen en la inversión pública y construir una propuesta de mejora. La importancia de mejorar continuamente los procesos de inversión se debe a la necesidad de crecimiento del país, si el instrumento de política está bien diseñada los efectos positivos serían notorios principalmente en el desarrollo local fortaleciendo la democracia y gobernabilidad de las instituciones públicas. El banco integrado proyectos (BIP) es una herramienta de mucha importancia en el seguimiento de la inversión, porque muestra información actualizada de los proyectos de inversión pública para ellos se sugiere el manejo por especialistas para el mejoramiento de la gestión. Esta herramienta permite realizar un monitoreo periódico para poder analizar la situación en que se encuentra el sistema nacional de inversión pública de Honduras, la metodología utilizada es el Análisis de la información. Donde la información recopilada da cuenta de las características y elementos propios del sistema de inversión, además se reconoce la percepción en cuanto a necesidades de mejora del recurso humano entrevistado, dentro de las conclusiones del estudio se indica que se debe cumplir con las guías metodológicas, capacitar a los formuladores de esa manera se mejora la calidad del proyecto que presentan. El estudio será de gran importancia en el aporte para la investigación. (Sosa, 2013)

Ana Mercedes Salcedo "Seguimiento y Evaluación de la Gestión Estratégica del Ministerio de Administración Pública 2006 – 2010"– 2012- Tesis para optar el título de Máster en Alta Dirección Pública, el estudio se realizó debido a que no existe una

unidad de monitoreo y evaluación en el ministerio de Administración Pública que contenga registros necesarios que servirán como fuente de información, se realizó un seguimiento la planificación estratégica y operativa trimestral donde se evalúan el avance en el logro de los objetivos planeados para ese periodo, se realizan los ajustes correspondientes en caso no se hayan logrado los productos y metas en las fechas señaladas, es importante señalar que para facilitar la operatividad de estos planes, el MAP está inmerso en el diseño de un sistema de control de gestión que estará en funcionamiento en los próximos meses. El MAP, es también el órgano rector en materia de Evaluación del Desempeño Institucional, gracias al sistema del MAP que ha sido desglosado en cuanto a la institucionalización de los sistemas de Monitoreo y Evaluación en este trabajo, que permite tanto al Ministerio como a las demás instituciones públicas, visualizar el cumplimiento de los indicadores y permitirá entregar de manera puntual lo encomendado. Obtener lo correcto es una meta de cada país que está comprometido en la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación para servir y apoyar al sector público.

Una evaluación puede y debe informar en la toma de decisiones, es por lo general uno de los muchos recursos de información relevante, las preguntas sobre el desempeño de los programas del gobierno por lo general no tiene respuestas sencillas, las evaluaciones pueden y deben brindar información útil para dar lugar a debates sobre programas, su desempeño y dirección futura, Este trabajo servirá de gran importancia para la investigación. (Salcedo, Seguimiento y Evaluacion de la Gestion Estrategica del Ministerio de Administracion Publica 2006 - 2010., 2012)



Sebastián Andrés Bosch Castro “*Sistema de monitoreo inteligente para detectar fallas en inversor multinivel*” – 2013, Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería. Los avances tecnológicos relacionados con la electrónica de potencia y los convertidores estáticos de potencia, han permitido el desarrollo de sistemas de automatización más eficientes y sofisticados, económicos. Parte de este avance ha sido posible gracias al uso de los inversores multiniveles, los que permiten reducir los inconvenientes de los inversores de dos niveles. No obstante, al tener un mayor número de semiconductores, la probabilidad de falla del sistema completo aumenta, de no ser detectadas a tiempo, estas fallas pueden degradar el proceso productivo o detenerlo completamente, lo que conlleva necesariamente pérdidas económicas producto de detenciones no planificadas, por tanto es necesario el desarrollo de sistemas de monitoreo para este tipo de inversores, donde se detecte e identifique la ocurrencia de fallas, posibilitando una respuesta adecuada. El sistema de monitoreo realiza mediciones de corriente en las fases y la alimentación de inversor, con esta información determina si todos los semiconductores operan correctamente, o si ha ocurrido una falla en alguno de ellos, por ello se requiere un sistema de monitoreo y seguimiento de manera permanente. Este trabajo es importante en el aporte de la investigación. (Castro, 2013)

Nuria Forcada, Miguel Casals “*Experiencias exitosas en proyectos de plantas industriales. Revista Ingeniería de Construcción.*” – 2008, indica que las experiencias exitosas en proyectos de plantas industriales pueden ayudar a mejorar la gestión de proyectos, el monitoreo en las primeras etapas son

decisivas para el éxito de proyectos lo que ayudara al desarrollo de la investigación (Nuria Forcada, 2008)

2.2. Marco Referencial

ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Durante muchos años fue común que las entidades públicas pasen directamente de la idea de un proyecto a la elaboración del expediente técnico y de ahí a la ejecución de la obra, obteniendo como resultado proyectos que no resolvían problemas y que no contaban con recursos para su operación y mantenimiento. De esa manera se usaban ineficientemente los escasos recursos públicos destinados a inversión.



Figura 1 Proyectos antes del SNIP

Nota : extraído de la directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución
 Directoral N° 003-2011-EF/68.01, proyectos elaborados antes del SNIP

El SNIP busca optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, con el fin de que su uso tenga un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país.

La principal herramienta que usa el SNIP es el análisis de pre inversión, el cual permite una evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos previa a su ejecución.



Figura 2 Proyectos después del SNIP

Nota : extraído de la directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución
 Directoral N° 003-2011-EF/68.01, proyectos elaborados después del SNIP

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA

Son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.

El SNIP establece que todo proyecto de inversión pública debe seguir el ciclo de proyecto que comprende las fases de pre inversión, inversión y post inversión.

El SNIP es un sistema administrativo del estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los proyectos de inversión pública con ellos se busca la eficiencia, sostenibilidad y mayor impacto socio-económica, la inversión debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del estado de forma que estos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente.

Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto.

Tabla 1 *Quienes conforman el SNIP*

CONFORMAN	DESCRIPCION
EL SNIP	
• El Órgano Resolutivo	La más alta autoridad ejecutiva de la unidad, (Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministerios, etc.)
• Las Unidades Formuladoras (UF)	Órgano responsable de la formulación de los estudios de pre inversión.

-
- Las Encargadas de la evaluación y declaración de viabilidad de Oficinas de los PIP.
Programación e Inversiones (OPI)
- Las Unidades Ejecutoras (UE)
Responsables de la ejecución, operación, mantenimiento y evaluación ex post de los PIP en las diferentes entidades públicas de todos los niveles de Gobierno.

Fuente: Ministerios de economía y finanzas – inversión pública

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Un proyecto de inversión pública constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El PIP debe construir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de pre inversión.

No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

Fases

Los Proyectos de Inversión Pública se sujetan a las siguientes fases:

Pre inversión: Comprende la elaboración del perfil, del estudio de perfil y del estudio de factibilidad.

Inversión: Comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución del proyecto.

Post inversión: Comprende los procesos de control y evaluación ex post.

El Sistema Nacional de Inversión Pública opera durante la fase de Pre inversión a través del Banco de Proyectos. (Pública, 2006)

La elaboración del perfil es obligatoria. Las evaluaciones factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de las características del proyecto de inversión pública. Las excepciones se definen siguiendo la jerarquía de delegación establecida en el numeral 9.1 del Artículo 9. (PERUANO, 2009)

FASE DE PRE INVERSIÓN

Fase de Pre inversión

La Fase de Pre inversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.

Esta fase comprende la elaboración del Perfil, que además incluye el análisis a nivel de un estudio de Pre factibilidad, y la elaboración del estudio de Factibilidad. En cada uno de los estudios de pre inversión se busca mejorar la calidad de la información proveniente

del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisión de inversión.

La elaboración del Perfil es obligatoria. Los niveles de estudios de pre inversión mínimos que deberá tener un PIP para poder ser declarado viable por una OPI.

El órgano responsable de la evaluación del PIP, podrá recomendar estudios adicionales, dependiendo de las características o de la complejidad del proyecto.

La fase de pre inversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP.

Formulación de estudios de Pre inversión

Previo a la formulación de un PIP, la UF verifica en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, del que pretende formular, a efectos de evitar la duplicación de proyectos.

La UF elabora los estudios de pre inversión del PIP sobre la base de los Contenidos Mínimos para Estudios de Pre inversión (Anexos SNIP-05, SNIP-06, SNIP-07 y SNIP-08), teniendo en cuenta los términos de referencia o planes de trabajo aprobados, así como los contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que se dispongan. Asimismo, debe ser compatible con los Lineamientos de Política Sectorial, con el Plan Estratégico Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado, según corresponda.

La elaboración de los estudios de pre inversión considera los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10), así como la programación multianual de inversión pública del Sector, Gobierno

Regional o Local, según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y período de ejecución del PIP.

La responsabilidad por la formulación de los PIP es siempre de una entidad del sector público sujeta a las normas del SNIP.

Está prohibido el fraccionamiento de un PIP, bajo responsabilidad de la UF que formula y registra la intervención en el banco de proyectos y del órgano que lo declare viable de ser el caso.

Los estudios de pre inversión y sus respectivos anexos, que se elaboren y evalúen en el marco del SNIP tienen carácter de Declaración Jurada, y su veracidad constituye estricta responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que determinen la Contraloría General de la República y la legislación vigente. El órgano que declaró la viabilidad del PIP es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme al marco legal vigente.

Evaluación de los estudios de Pree inversión

Previo a la evaluación de un PIP, la OPI verifica que en el Banco de Proyectos no exista otro PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, del que será evaluado, a efectos de evitar la duplicación de proyectos.

La evaluación del proyecto debe considerar el análisis de los aspectos técnicos, metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomarán en cuenta los aspectos legales e institucionales relacionados a la formulación y ejecución del proyecto, así como la programación multianual de inversión pública del Sector, Gobierno Regional o Local, según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y período de ejecución del PIP.

Los Informes Técnicos que elaboren la OPI o la DGPM seguirán las Pautas para la Elaboración de Informes Técnicos (Anexo SNIP-16), debiendo recoger los aspectos desarrollados en el Protocolo de Evaluación. Los Informes Técnicos deben ser puestos en conocimiento de la UF que elaboró el estudio.

Cuando la OPI formule observaciones, debe pronunciarse de manera explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformulados o sustentados, no debiendo volver a observar un PIP sino por razones sobrevinientes a la primera evaluación.

La responsabilidad por la evaluación de los PIP es siempre de una Entidad del Sector Público sujeta a las normas del SNIP.

Procedimientos para la formulación, presentación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública Menores.

El Proyecto de Inversión Pública Menor, es aquella intervención que cumple con las características señaladas en el numeral 3.2 del artículo 3 de la presente Directiva y que, además, tiene un monto de inversión, a precios de mercado, igual o menor a S/. 1'200,000.00 (Un Millón Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).

La UF elabora el Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) y lo registra en el Banco de Proyectos, que asigna automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. La UF remite a la OPI la versión impresa del mismo, debidamente suscrito por su responsable, sin lo cual no se podrá iniciar la evaluación.

Al momento de registrar el PIP, la selección de la función, programa y subprograma, deberá realizarse considerando el área del servicio

en el que el PIP va a intervenir, independientemente de la codificación presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil Simplificado del PIP Menor, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, reflejando su evaluación en el Formato SNIP-06 y registra en el Banco de Proyectos dicha evaluación. Mediante dicho Formato, la OPI puede

- Declarar la viabilidad del proyecto, en cuyo caso llena el Formato SNIP-09;
- Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformulados; o
- Rechazar el PIP.

En caso que se declare la viabilidad del proyecto, el Responsable de la OPI deberá visar el Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 8.3 del artículo 8, y remitir copia de éste y de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la UE del PIP. Asimismo, en el plazo máximo de 05 días hábiles, remite copia de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la UF y a la DGPM.

Si, durante la evaluación del PIP Menor, el monto de inversión propuesto se incrementa por encima del monto señalado en el numeral 14.1 del presente artículo, se deberá llevar a cabo una nueva evaluación, considerando las normas aplicables a los Proyectos de Inversión Pública que no son PIP Menores. Si luego de declarado viable el PIP Menor, el monto de inversión propuesto se incrementa por encima del monto señalado en el numeral 14.1

del presente artículo, se deberá aplicar las disposiciones del artículo 27 de la presente Directiva.

Si durante la evaluación de un PIP cuyo monto de inversión originalmente estimado superaba el monto de S/. 1'200,000.00 (Un Millón Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), disminuye por debajo de dicho monto, la evaluación podrá realizarse considerando las normas aplicables a los PIP Menores, conforme lo determine la OPI.

Procedimientos para la presentación y evaluación de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Inversión Pública.

La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigna automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. La UF remite el Perfil en versión impresa y electrónica, a dicha OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03), sin lo cual no se podrá iniciar la evaluación.

Al momento de registrar el PIP, la selección de la función, programa y subprograma, deberá realizarse considerando el área del servicio en el que el PIP va a intervenir, independientemente de la codificación presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra dicha evaluación en el Banco de Proyectos. Con dicho Informe la OPI puede:

Aprobar el Perfil y autorizar la elaboración del estudio de Factibilidad;

Declarar la viabilidad del PIP, siempre que se enmarque en lo dispuesto por el artículo 22, en cuyo caso acompaña al Informe Técnico, el Formato SNIP-09; Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformulados; o Rechazar el PIP.

En caso corresponda declarar la viabilidad del proyecto con el estudio de Perfil, dicho estudio deberá formularse teniendo en cuenta los Contenidos mínimos generales para la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública señalados en el Anexo SNIP-05. Asimismo, el Responsable de la OPI deberá visar el Resumen Ejecutivo del estudio conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 8.3 del artículo 8, y remitir copia de dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE del PIP. Asimismo, remite copia del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UF del PIP

En el siguiente gráfico se esquematiza el proceso de presentación y evaluación del Perfil: la Figura N° 3 nos refleja el flujo de actividades de formulación de PIPs elaborados en planta.

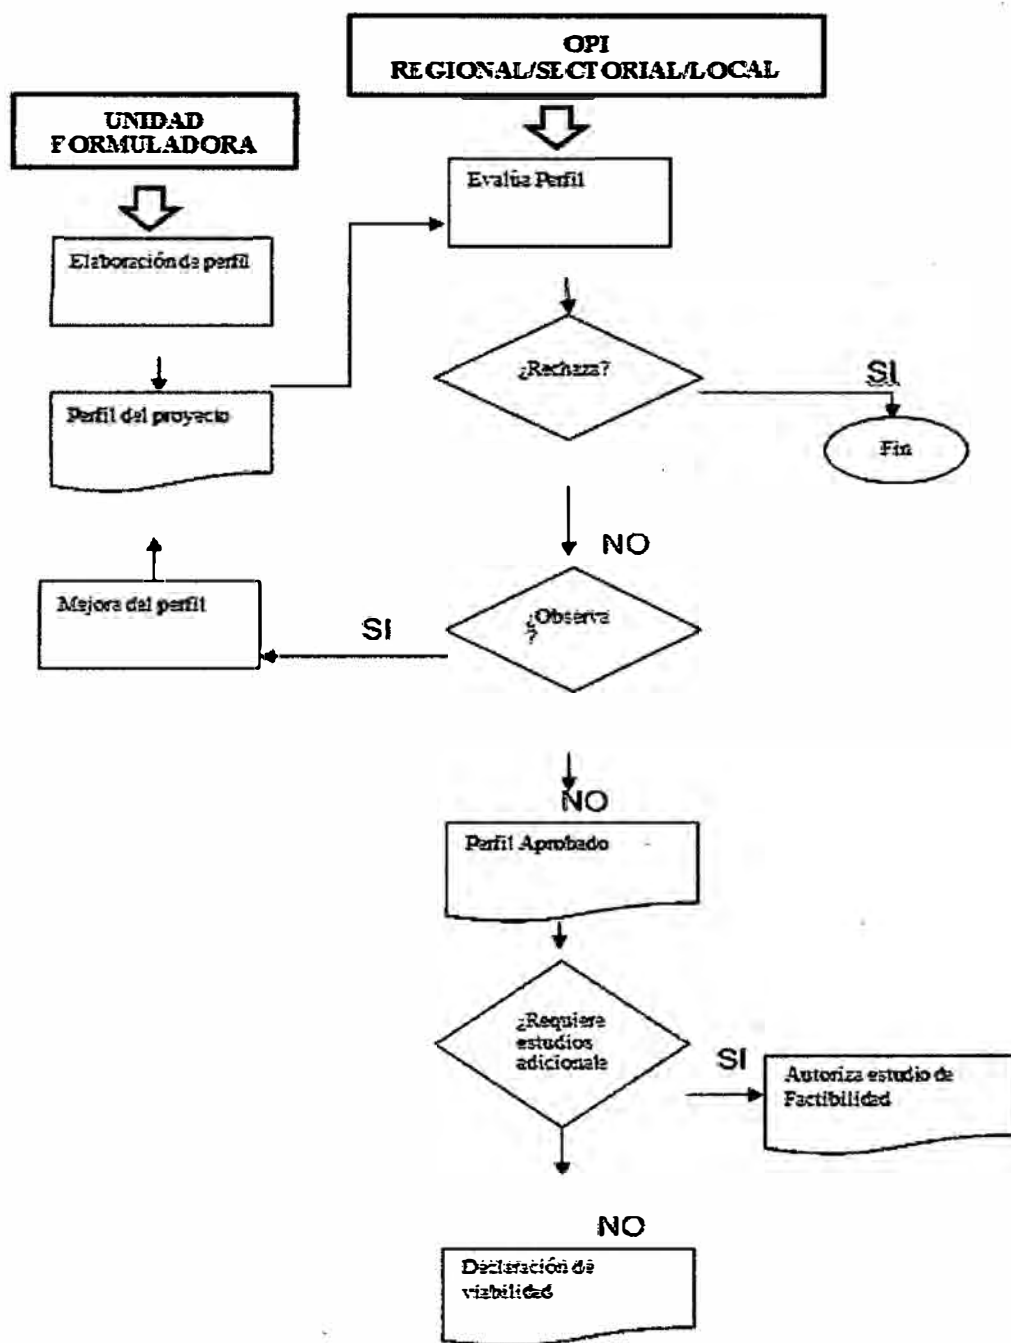


Figura 3 Proceso de elaboración y evaluación de un Proyecto

Nota: extraído del Ministerios de economía y Finanzas – inversión Pública, este flujograma nos muestra el camino para la formulación de un proyecto de inversión pública.

Procedimientos para la presentación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública financiados con endeudamiento.

Perfil

La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigna automáticamente la OPI sectorial responsable de su evaluación y remite el Perfil, en versión impresa y electrónica, a dicha OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03), sin la cual no se podrá iniciar la evaluación.

Al momento de registrar el PIP, la selección de la función, programa y subprograma, deberá realizarse considerando el área del servicio en el que el PIP va a intervenir, independientemente de la codificación presupuestal utilizada.

La OPI recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra en el Banco de Proyectos dicha evaluación. Con dicho Informe, la OPI puede:

Aprobar el Perfil y solicitar a la DGPM autorización para la elaboración del estudio de Factibilidad; Aprobar el Perfil y solicitar la declaración de viabilidad del PIP a la DGPM; Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformulados; o Rechazar el PIP.

La OPI remite a la DGPM el Perfil debidamente visado, en versión impresa y electrónica, acompañado del Informe Técnico, una vez recibidos dichos documentos, la DGPM verifica el registro del PIP,

el registro de la evaluación de la OPI y registra la fecha de su recepción en el Banco de Proyectos. La DGPM evalúa el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra dicha evaluación en el Banco de Proyectos. El Informe Técnico será remitido a la OPI, con copia a la UF. Con dicho Informe puede:

- Autorizar la elaboración del estudio de Factibilidad;
- Declarar la viabilidad del PIP, en cuyo caso acompaña al Informe Técnico el Formato SNIP-10;
- Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformulados; o
- Rechazar el PIP.

En el siguiente gráfico se esquematiza el proceso de presentación y evaluación del Perfil:

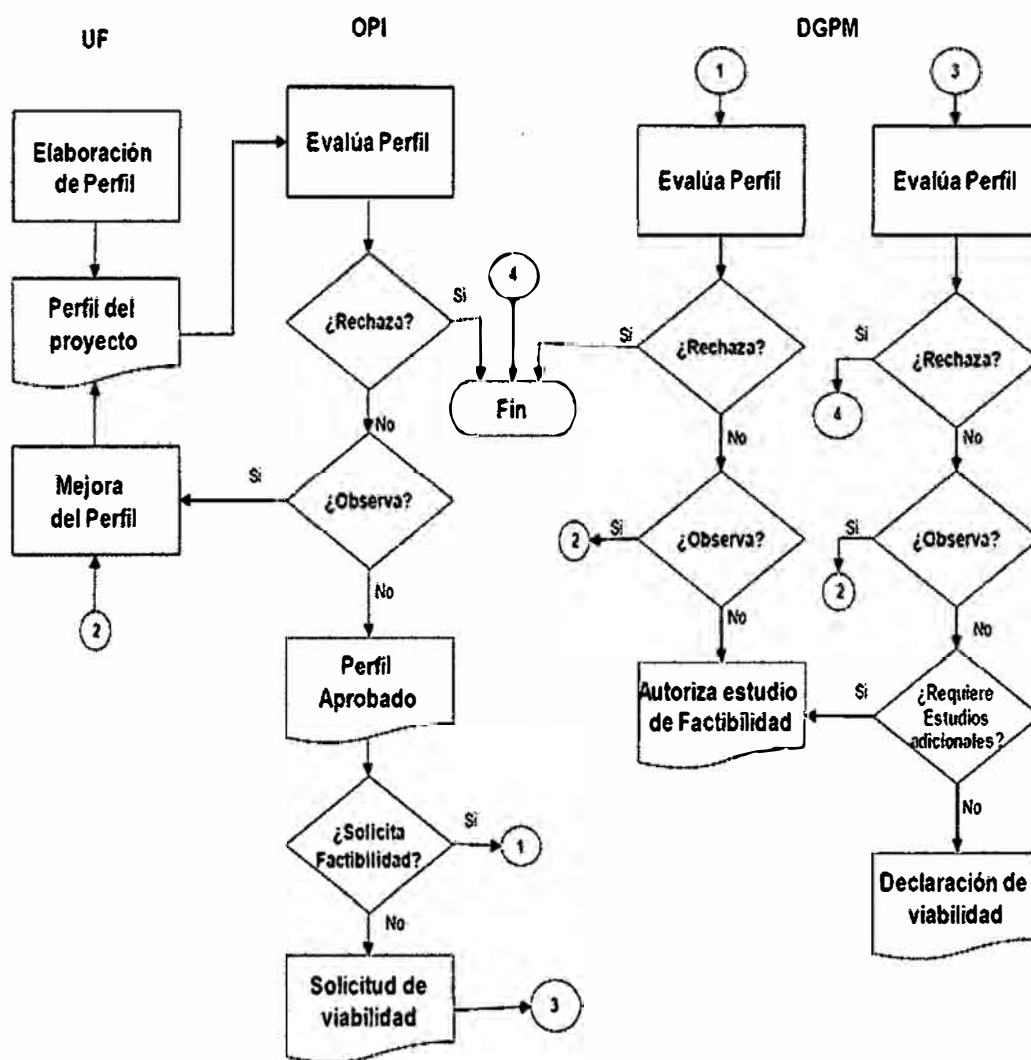


Figura 4 Procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento.

Nota: extraído del Ministerios de economía y Finanzas – Inversión Pública, este flujograma nos muestra el camino para la formulación de un proyecto de inversión pública, hasta la DGPM, para su posterior registro en el banco de proyectos.

Factibilidad

La UF sólo puede elaborar el estudio de Factibilidad después de recibida la autorización de la DGPM, la misma que debe registrarse en el Banco de Proyectos.

La UF elabora el estudio de Factibilidad, actualiza la información registrada en el Banco de Proyectos y remite el estudio de Factibilidad, en versión impresa y electrónica, a la OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03) actualizada.

Declaración de viabilidad

La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. Se aplica a un Proyecto de Inversión Pública que a través de sus estudios de pre inversión ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política y con los Planes de Desarrollo respectivos.

La declaración de viabilidad sólo podrá otorgarse si cumple con los siguientes requisitos:

- Ha sido otorgada a un PIP, de acuerdo a las definiciones establecidas.
- No se trata de un PIP fraccionado.
- La UF tiene las competencias legales para formular el proyecto.
- La OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad del proyecto.
- Las entidades han cumplido con los procedimientos que se señalan en la normatividad del SNIP.
- Los estudios de pre inversión del proyecto han sido elaborados considerando los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación y los Parámetros de Evaluación (Anexos SNIP-09 y SNIP-10).

- Los estudios de pre inversión del Proyecto han sido formulados considerando metodologías adecuadas de evaluación de proyectos, las cuales se reflejan en las Guías Metodológicas que publica la DGPM.
- Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y los beneficios del proyecto no están sobreestimados.

MODALIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.

Por la misma entidad (ADMINISTRACIÓN DIRECTA). La Entidad, con sus propios recursos y personal, elabora de manera directa la formulación de sus proyectos. Tal acción se realizará a través de sus áreas de estudios o de proyectos, siendo necesario que la Entidad cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, recursos humanos y logística que lo permita. En este caso la responsabilidad sobre la elaboración del mismo recae en el funcionario designado para tal labor.

Por externos (CONTRATA). Cuando la Entidad elabora sus proyectos de forma indirecta, a través de un consultor contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la Normativa de contrataciones por locación de servicio.

PAUTAS PARA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

El propósito de las presentes pautas es orientar la estructuración del contenido mínimo que se debe abordar en la elaboración de unos términos de referencia o plan de trabajo, según sea el caso.

1. Plantear la idea preliminar o hipótesis del problema o situación negativa que afecta a una población en particular o a un segmento de ella y que el estudio deberá corroborar durante el proceso de preparación y evaluación de la iniciativa de inversión. Se podrá acompañar con algunos antecedentes relacionados con la necesidad de dicha iniciativa, el proceso de planificación y priorización del cual se desprende tal necesidad y si ha existido algún ejercicio de optimización de los recursos disponibles para enfrentar la situación negativa que se intenta revertir.
2. El objetivo de la elaboración del estudio de pre inversión deberá vincularse con el sustento de la conveniencia para la sociedad de implementar la iniciativa de inversión.
3. Señalar el equipo mínimo de profesionales que se necesitan para analizar y estructurar la idea de inversión, así como los roles y funciones que cada uno cumplirá durante el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.
4. Señalar las principales actividades que se deberán desarrollar durante el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto y una aproximación del tiempo que tomará su desarrollo, identificando los principales hitos de supervisión y evaluación de los avances y/o entregables para estructurar el estudio de pre inversión. Se podrá apoyar en un gráfico que relacione las actividades con el tiempo que toma su desarrollo y en el que se visualice los momentos en que se presentan los avances o entregables del estudio para efectos de la supervisión.
5. Se deberá hacer explícito en los términos de referencia (o en el plan de trabajo) que el equipo profesional que elabore el estudio de pre inversión señale y sustente los instrumentos de apoyo en la recopilación de información (cuestionarios, entrevistas, encuestas,

entre otros), fuentes de información a revisar, así como el enfoque metodológico para abordar aspectos como el diagnóstico, el análisis de la oferta y demanda, el dimensionamiento de las alternativas de solución, la evaluación social del proyecto, entre otros que se juzguen relevantes para la estructuración del estudio.

6. Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, plantear un presupuesto para la elaboración del estudio, considerando el equipo profesional necesario, el tiempo que tomará el desarrollo de las actividades, el esfuerzo en recopilación de información, entre otros aspectos que se juzguen relevantes incluir. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 23

7. Establecer los perfiles del equipo profesional que se necesita para estructurar el proyecto, señalando la experiencia general y específica y el tiempo requerido para cada uno de ellas. Asimismo, se debe revelar la forma como se evaluarán a los profesionales.

8. Se deberá señalar el mecanismo de supervisión de la elaboración de los estudios y el responsable de realizarla.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El seguimiento es una acción permanente a lo largo del proceso de los proyectos, permite una revisión periódica del trabajo en su conjunto, tanto en su eficiencia en el manejo de recursos humanos y materiales como de su eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Es de vital importancia que el seguimiento se realice como una parte integrante del proyecto, acordada con los responsables de la gestión, para que no suceda como una mera supervisión. Recordemos que la función del seguimiento consiste

en aportar aprendizaje institucional y no en emitir dictámenes sobre resultados de un proceso.

El sistema de monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso resultados de la ejecución de un conjunto de actividades (proceso) en un período de tiempo, con base en indicadores previamente determinados. El seguimiento se refiere a un conjunto de acciones que permiten comprobar en qué medida se cumplen las metas propuestas en el sentido de eficiencia y eficacia. El monitoreo garantiza que se logre el resultado. El seguimiento registra si ese logro del resultado, unido a los logros de otros procesos, se ha hecho eficiente y eficaz. En el monitoreo se buscan las razones de las fallas comprobadas, con el objetivo de encontrar alternativas de solución. El monitoreo reporta logros para que las prácticas exitosas puedan ser replicadas y las erróneas revisadas. (CAAL) Dónde:

El seguimiento evalúa el resultado y el monitoreo garantiza el resultado.

PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El proceso de Monitoreo y Seguimiento supone el desarrollo de un protocolo de seguimiento que contemple la planificación de reuniones estructuradas para realizar el seguimiento a un portafolio priorizado de inversión previamente definido, permitiendo coordinar entre los involucrados las acciones necesarias para formular de manera adecuada un proyecto.

COMO SE IMPLEMENTA Y OPERA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO

La implementación y operación del seguimiento y monitoreo se inicia con la constitución del comité de monitoreo, en cuyo espacio se realiza la priorización de un portafolio o cartera de proyectos sobre los cuales se realizará el seguimiento y monitoreo. Luego, en

la parte operativa, se realiza la revisión periódica del portafolio o cartera de acuerdo a un protocolo formal, se validan y analizan los datos recabados y se informa a los involucrados en la formulación del PIP definiendo la modalidad ya sea por administración directa o contrata a fin de que se adopten las acciones correctivas y preventivas para mejorar la formulación de los proyectos de inversión. Esto se muestra a continuación.

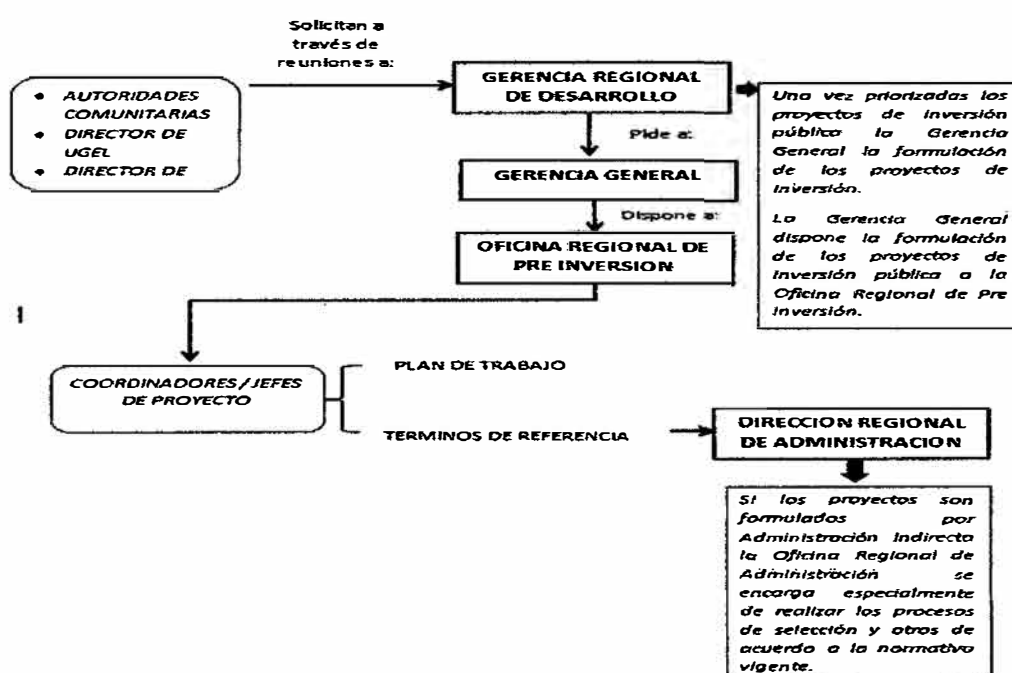


Figura 5 Proceso de seguimiento y monitoreo de un proyecto de inversión del GRAP

Nota: Extraído de la observación propia del proceso de seguimiento y monitoreo de la formulación de un proyecto en el Gobierno Regional de Apurímac.

COMITÉ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El comité de monitoreo y seguimiento que está conformado por los coordinadores y jefes de cada proyectos que están directamente vinculados y en constante coordinación sobre el proyecto desde la

elaboración del plan de trabajo y términos de referencia hasta la viabilidad del proyecto, tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las acciones de seguimiento, debiendo tomar decisiones respecto a las medidas administrativas, preventivas y correctivas que sean necesarias implementar para el cumplimiento eficaz, eficiente y con calidad de la programación de la fase de pre inversión de los proyectos a su cargo.

El comité de monitoreo y seguimiento es responsable de promover y verificar el cumplimiento del proceso de seguimiento de los proyectos en formulación.

El coordinador responsable del sector Educación recopila la información según el avance y consolida en el aplicativo SISPIP propio de la Oficina Regional de Pre Inversión.

FINALIDAD DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

El coordinador del sector de Educación tiene por finalidad promover y garantizar la elaboración de un proyecto de inversión pública, de manera tal que ayude a velar la calidad de la formulación de los proyectos, debiendo asegurar la eficacia, eficiencia y transparencia.

Para ello se deberá establecer procesos y procedimientos que institucionalicen las acciones necesarias para la formulación de proyectos de inversión pública.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO.

El coordinador es responsable de promover y verificar el cumplimiento del proceso de seguimiento de su portafolio priorizado de PIP y en general, de todos los PIP formulados por la Oficina Regional de Pre Inversión.

Responsable de organizar y llevar a cabo las revisiones de los proyectos del sector Educación y consolidar en el aplicativo informático SISPIP.

Validar la información anterior, su consolidación y su posterior envío a su órgano resolutorio, órgano de control y a la DGPM junto con un informe, a la Oficina de Programación e Inversión para la aprobación y viabilidad del proyecto y culminar la fase de Pre Inversión.

ACCIONES PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Reuniones del comité, el coordinador designara al jefe de proyecto de acuerdo al perfil solicitado para iniciar con la elaboración del plan de trabajo según el anexo 23 del SNIP y ser aprobada por la Oficina de Programaciones e Inversión una vez aprobada por esta Oficina se da inicio a la elaboraciones del proyecto según los plazos establecidos en el cronograma del PDT aprobado, el coordinador y jefe de proyecto de un proyecto de Inversión Pública tienen que estar en constante comunicación para corregir posibles cuellos de botellas donde no permitan continuar con la elaboración del proyecto y hacer cumplir los plazos establecidos por el cronograma del PDT. en caso sea por administración Indirecta se elaborara los términos de referencia una vez aprobada por la OPI se enviara a la Dirección Regional de Administración donde se hará las contrataciones de acuerdo a la normativa.

En ambas modalidades los coordinadores y jefes de proyecto tienen que estar en comunicación con la oficina de programaciones e inversión del Gobierno Regional y ser aprobada y viable y ser registrada en el aplicativo informático Banco de proyectos según el Anexo SNIP 02.

Sistematización de información de seguimiento y monitoreo, el jefe de proyecto da a conocer el avance al coordinador y se

consolida en el aplicativo informático SISPIP propio de la Oficina Regional de Pre Inversión desde el año 2014 donde se muestra la situación actual del proyecto, en el 2013 solo se solucionaban en reuniones.

Registro al banco de proyectos, los proyectos ya culminados y previamente aprobados por la oficina regional de programaciones e inversión son registrados en el aplicativo informático banco de proyectos según el *ANEXO SNIP 02*. (Finanzas M. d., 2011)

Aplicativo informático del Banco de Proyectos (BP), Según el ANEXO SNIP 02 es la herramienta que permite almacenar, actualizar y publicar las fichas de registro haciendo posible de esta manera la interacción informática entre las unidades formuladoras (UF), las oficinas de programación e inversión del sector (OPI) y la dirección General de política de inversiones (DGPI).

Ficha de registro, La ficha de registro es el documento mediante el cual se resume la información de los estudios de pre inversión y el estado actual del PIP. Solo las UF pueden ingresar y actualizar dicha ficha en el BP, correspondiendo a la OPI y la DGPI su evaluación. La UF debe registrar la información del PIP a través de la Ficha de Registro en el BP y presentarla (reporte de la Ficha de Registro del BP) a la OPI junto con el estudio de pre inversión correspondiente. La OPI deberá procesar sólo los estudios de pre inversión que se acompañen del reporte de la Ficha de Registro del BP correspondiente; además, una vez terminada la evaluación (aprobación, observación, rechazo) está obligada a registrar dicha evaluación en el BP. En caso corresponda, la DGPI evalúa el estudio de pre inversión y registra este resultado en el BP. La Ficha de Registro se adjunta como Formato SNIP-03. Para su llenado se deben observar las indicaciones señaladas más adelante. (MEF, 2011)

INVIERTE PERÚ

"El nuevo sistema de inversión, denominado Invierte Perú, agilizará la aprobación de proyectos de inversión y flexibilizará su ejecución en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, los gobiernos regionales y locales ya no tendrán que presentar los estudios de perfil y factibilidad. Ahora presentarán un solo documento con la información necesaria para su aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas".

"Con este sistema reduciremos los tiempos en la preparación de los proyectos a la mitad y haremos un mejor seguimiento a los mismos. Los peruanos necesitan mejores obras, más rápido; y los Gobernadores Regionales necesitan hacer menos trámites. Con esta reforma ganamos todos", agregó el ministro de Economía.

Asimismo, Invierte Perú solo permitirá ejecutar aquellos proyectos de inversión que cierren brechas en lo social y económico, y realizará un seguimiento a la ejecución financiera y física de las obras. Además, será la primera vez que el Perú llevará a cabo una programación multianual de proyectos lo que permitirá conocer su ejecución durante los próximos cinco años.

Según el MEF informó que en el antiguo sistema de inversión existía desorden y lentitud por las excesivas reformulaciones, los proyectos de inversión avanzaban y retrocedían con frecuencia. "Invierte Perú fortalece la fase inicial con una programación estratégica que agilizará la formulación y evaluación de los proyectos, evitando procesos innecesarios"

"En esta fase se evaluará el impacto de los proyectos y serán los gobiernos regionales y locales quienes darán viabilidad a sus proyectos. Lo único que nosotros vamos a decidir es la inversión presupuestal".

Asimismo, con el nuevo sistema se espera reducir el tiempo de aprobación de los proyectos a la mitad y llegar al 90% de ejecución del gasto público, que, actualmente es de 80%.

Otra de las debilidades del sistema era su desvinculación con el cierre de brechas. En cambio, Invierte Perú identificará cuáles son los proyectos que cierran brechas y cuáles no, a fin de priorizar la asignación de recursos.

Con el antiguo sistema existía calidad insuficiente en los proyectos interrumpiendo del proceso de inversión. La actual iniciativa facilitará la automatización de los estudios, garantizando su eficiencia sin perder la calidad. También contribuirá al seguimiento de la ejecución financiera y física de los proyectos; información que será pública.

Tabla 2 *Diferencia entre invierte Perú y el SNIP*

INVIERTE PERÚ	SNIP
IDENTIFICA Y PRIORIZA PROYECTOS QUE CIERRAN BRECHAS SOCIALES Y ECONOMICAS	NO IDENTIFICA NI PRIORIZA PROYECTOS QUE CIERRAN BRECHAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
RÁPIDO: MENOS PROCESOS un Solo proceso con la unidad formuladora del MEF	LENTO: EXCESIVAS FORMULACIONES Dos procesos con unidad formuladora y Oficinas de Proyectos de Inversión del MEF
ÁGIL Fortalece la fase inicial en la formulación y evaluación para aprobación	TARDÍO Los proyectos eran aprobados en una fase tardía y a veces reformulados
UN SOLO DOCUMENTO PARA APROBACIÓN	ESTUDIO DE PERFIL Y FACTIBILIDAD

<p>MENOS TIEMPO PARA APROBACION DE PROYECTOS La programación se enmarca en tres sistemas simultáneos (planeamiento, inversiones y presupuesto)</p>	<p>APROBACIÓN DEMORABA AÑOS Cada sistema lo revisaba uno después del otro</p>
<p>PROGRAMACIÓN MULTIANUAL</p>	<p>NO EXISTÍA UNA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS</p>
<p>PROMUEVE LA TRANSPARENCIA Información será publica y en paralelo con el SIAF, SEACE e INFOBRAS</p>	<p>INFORMACIÓN NO ERA PÚBLICA Solo la información de inversiones era publica</p>
<p>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y FISICO EN TIEMPO REAL En tiempo real y en paralelo los cuatro sistemas (SIAF, SEACE e INFOBRAS)</p>	<p>SEGUIMIENTO FINANCIERO Los sistemas actuaban independientemente</p>

Fuente: según la Asociación de Inversión en Infraestructura (AFIN) - 2017

2.3. Definición de términos (Marco conceptual)

BANCO DE PROYECTOS.- Banco de proyectos, herramienta que permite almacenar, actualizar y publicar las fichas de registro haciendo posible de esta manera la interacción informática entre las unidades formuladoras y unidades ejecutoras.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.- Estudio realizado durante la fase de instrucción para verificar si la propuesta de proyecto está bien fundamentada, y si es susceptible de cumplir con las necesidades de sus beneficiarios. Debe tener en consideración todos los aspectos políticos, técnicos, económicos, financieros, institucionales, de gestión, ambientales y de género.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.- Órgano de línea del Ministerio, rector del sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y como tal se constituye como la más alta autoridad técnico-

normativa en materia de inversión pública, a nivel nacional; encargado de diseñar los lineamientos de política de inversión pública, formula propone y aprueba, cuando corresponda normas. (Finanzas, Inversion Publica, s.f.)

INVIERTE PERÚ.- El nuevo sistema de inversión, que reemplazara al SNIP.

MONITOREO.- Ayuda a sistematizar las prácticas de seguimiento utilizadas hasta el momento y ofrece herramientas adicionales, si fuera necesario. El objetivo es mejorar la calidad y aumentar la eficacia del trabajo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO.- Actividad sistemática y permanente de recolección y análisis de datos para proveer, al equipo de gestión y a las principales partes interesadas, indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos, así como sobre la utilización de los fondos disponibles. Es muy importante para retroalimentar la gestión y la toma de decisiones.

PLAN DE TRABAJO.- Documento que define las actividades, los recursos y el tiempo necesario para lograr los resultados y el objetivo específico de un proyecto.

PRE INVERSIÓN.- Comprende la elaboración del perfil, del estudio de perfil y del estudio de factibilidad.

PROYECTO.- Intervención que consiste en una serie de actividades planeadas interrelacionadas, destinadas a alcanzar objetivos definidos, con un presupuesto determinado y en unos plazos concretos.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.- Constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.

SECTOR.- Conjunto de organismos con propósitos comunes que realizan acciones referidas a la gestión gubernamental.

SEGUIMIENTO.- Evalúa el resultado

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.- Es un sistema administrativo del estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los proyectos de inversión pública.

SISPIP.- Sistema de monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión pública, procesa y almacena información de los proyectos en formulación.

UNIDAD FORMULADORA.- Es el área responsable de la elaboración de los estudios de pre inversión, y los registra en el Banco de Proyectos del SNIP.

VIABILIDAD.- Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que demuestre ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales.

III. CAPÍTULO

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y diseño de la investigación

Tipo de la investigación

Este trabajo, es una investigación científica del tipo Básica porque no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento científico. Su objetivo son las teorías científicas. (Cutipa, 2009)

Diseño de la investigación

En el presente trabajo se utilizará el diseño no experimental longitudinal, se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. (Sampieri, 2010)

3.2. Población y muestra

Población

La principal característica de los proyectos de inversión pública del sector Educación es mejorar la calidad educativa de nuestra región, para lo cual se requiere tener en cartera proyectos bien elaborados, durante los años 2013 y 2014 se formularon 27 proyectos del sector educación por la Oficina Regional de Pre Inversión.

Muestra

- **Técnicas de muestreo: probabilístico**

La técnica de muestreo para determinar la operativización de los resultados utilizando el instrumento de Análisis documental donde se utilizara fichas de registro para ver el estado actual de

los proyectos del sector educación se tendrá la información de los 27 proyectos formulados entre los años 2013 y 2014.

- **Tamaño y cálculo del tamaño**

Se estudiará 27 proyectos de inversión pública del sector educación formulados por la Oficina Regional de Pre Inversión en los años 2013 y 2014, según SAMPIERI hace mención" si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". (SAMPIERI, 2010)

3.3. Procedimiento de la investigación

Revisión documental.- Se ha utilizado para obtener datos de las normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas, guías metodológicos relacionados con la formulación de proyectos del sector educación del Gobierno Regional de Apurímac.

Entrevistas.- Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideran fuentes de información, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio, se puede considerar como un dialogo o interacción que se realiza en una situación de cara a cara. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que conoce de lo que ha experimentado en el seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión pública del sector educación en la etapa de pre inversión.

Instrumentos.

- **Ficha bibliográfica.-** Instrumento utilizado para recopilar datos de las normas legales, administrativas, contables, de auditoría, de libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet relacionados con el trabajo de investigación.

- **Guía de Entrevista.**- Instrumento utilizado para llevar a cabo las entrevistas con el personal involucrado en la formulación y monitores de proyectos del sector educación.

Fuentes.

Para el presente estudio de investigación se contará con fuentes de información primaria y secundaria, de las fuentes de información secundaria, que serán las fichas de registro de los proyectos. Y las fuentes de información primaria tendremos datos proporcionados por la Oficina Regional de Pre Inversión.

Fuentes virtuales: El uso de los portales de información del MEF.

Aplicativo de consulta del Banco de Proyectos de Inversión Pública (SNIP- Net). El Banco de Proyectos SNIP- Net es un sistema administrativo del Estado peruano que promueve un uso eficiente de los recursos de inversión, buscando garantizar la sostenibilidad de los proyectos y los servicios públicos de calidad para el bienestar de la población.

Aplicativo de consulta SISPIP propio de la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac.

IV. CAPÍTULO RESULTADOS

4.1. PROCESO DEL COMITÉ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

4.1.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS SEGÚN FUNCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, PERIODO 2013

Tabla 3 Priorización de proyectos según función, 2013

	Frecuencia	Porcentaje
Educación	26	23,9
Transporte	18	16,5
Planeamiento, reserva y contingencia	7	6,4
Salud	1	,9
Medio Ambiente	15	13,8
Agropecuaria	6	5,5
Cultura y deporte	1	,9
Saneamiento	34	31,2
Energía	1	,9
Total	109	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión documental de los proyectos designados por Gerencia General a la Oficina Regional de Pre Inversión durante el periodo 2013.

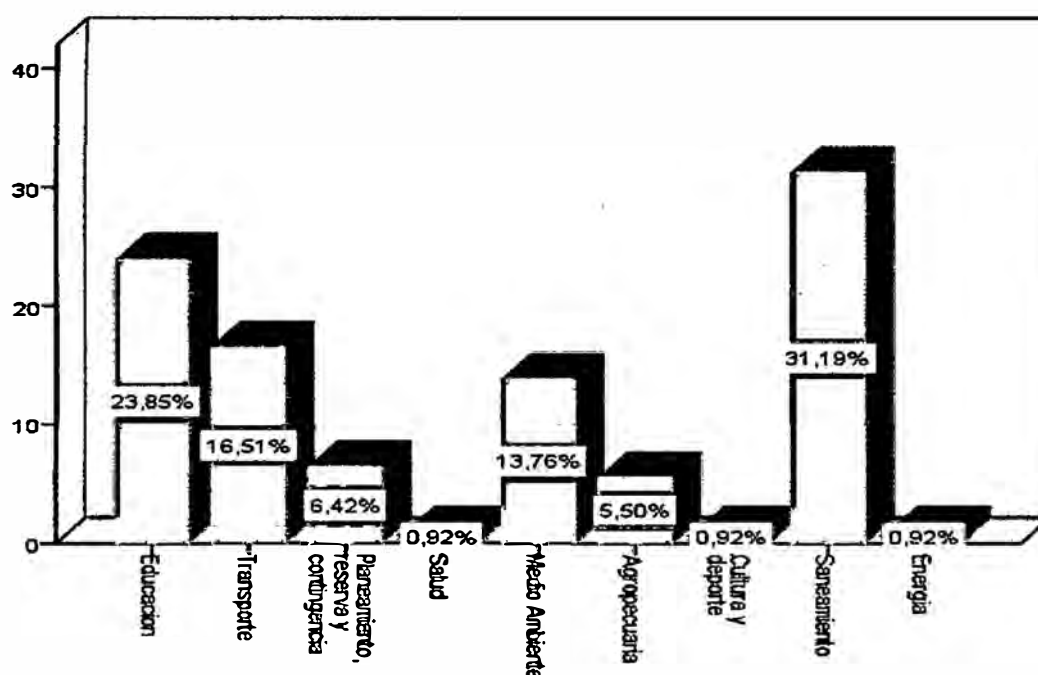


Figura 6 Priorización de los proyectos según sector, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 3, proyectos priorizados según los sectores en el departamento de Apurímac durante el periodo 2013.

Según la tabla 3 y la Figura 6 nos muestra que durante el periodo 2013 los proyectos de inversión pública priorizados según el sector de Saneamiento se encuentra con mayor porcentaje 31.19% (Agua y Desagüe) una de las necesidades básicas para el ser humano, se priorizaron en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Cotabamba, seguidamente del sector educación con 23.85% priorizados en el todas las provincias que es fundamental contar con centros educativos adecuados para el desarrollo de nuestra población, el sector Transporte con 16.51% es importante contar con vías pavimentadas y en buen estado y el sector de Medio Ambiente se encuentra con 13.76%, estos proyectos en mención tienen mayor porcentaje dentro de la priorización

para su formulación que se realiza en las oficinas del Gobierno Regional, los proyectos de Planteamiento reserva y contingencia están con 6.42% con intervención en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Grau, la Función Agropecuaria con 5.50% con intervención en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros, Finalmente los sectores de Salud con intervención en la Provincia de Cotabamba, Cultura -Deporte con intervención a nivel Regional y Energía en la provincia de Abancay se encuentran con 0.92%. Según Anexo 03.

La priorización tiene como finalidad el establecimiento de un orden jerárquico de los proyectos según sus bondades o impactos positivos que se genera en nuestra sociedad, tanto para responder a las demandas o aspiraciones de los usuarios concretos; pero también en función de los efectos positivos que provoca en el entorno colectivo o comunitario donde el proyecto se asienta. Los proyectos que están en los últimos puestos podrían no ser ejecutados o ser diferidos según los recursos disponibles. Obviamente no entran en este trabajo de priorización los Proyectos que han sido descartados antes de ser aprobados aún en su nivel de Perfil (adecuadamente sustentado).

Para la Función Educación los artículos 12 y 17 de la *Ley N° 28044, Ley General de Educación*, establecen que para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, el Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales; y, para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente.

4.1.2. Intervención de los proyectos de inversión pública en las provincias de Apurímac, periodo 2013.

Tabla 4 *Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Abancay	29	26,6
Andahuaylas	27	24,8
Antabamba	3	2,8
Cotabamba	23	21,1
Chincheros	4	3,7
Aymaraes	4	3,7
Grau	7	6,4
Regional	5	4,6
Más de una provincia	7	6,4
Total	109	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión documental de los proyectos designados por Gerencia General a la Oficina Regional de Pre Inversión durante el periodo 2013.

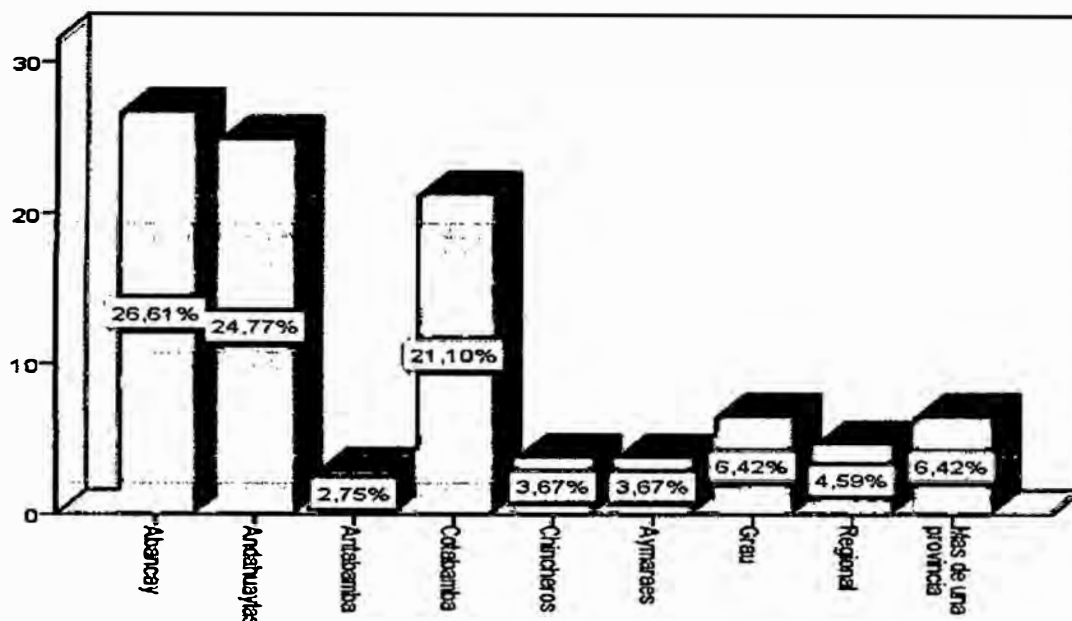


Figura 7 Intervención de los proyectos en las Provincias de Apurímac, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 4

En la tabla 4 y Figura 7 se observa que la intervención de los PIP, se han priorizados en las provincias de Abancay con un 26.61%, Andahuaylas 24.77%, Cotabamba 21.10% tienen mayor intervención en la formulación de Proyectos de inversión pública según la priorización en el año 2013 del Gobierno Regional de Apurímac a través de la Oficina Regional de Pre Inversión, Mientras que las demás provincias se encuentran con menor porcentaje en cuanto a su intervención como la provincia de Grau con un 6.42%, las provincias de Chincheros y Aymaraes con 3.67%, Provincia de Antabamba con un 2.75%, el 6.42% nos muestra los proyectos que tiene intervención en más de una provincia, y un 4.59% proyectos que se elaboran a nivel Regional.

4.1.3. Modalidad de formulación de los proyectos de inversión pública periodo 2013

Tabla 5 Modalidad de formulación de proyectos, 2013

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Administración directa	108	99,1
	Contrata	1	,9
	Total	109	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la recopilación de fichas extraídas de la Oficina Regional de Pre Inversión.



Figura 8 Modalidad de formulación de proyectos, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 5

Según la tabla 5 y la Figura 8 nos muestra que los proyectos priorizados por la modalidad de Administración Directa por la Oficina Regional de Pre Inversión durante el año 2013 fueron casi en su totalidad con un 99.08%, mientras que los proyectos por la modalidad de Contrata se encuentran con un 0.92%

4.1.4. Los proyectos de inversión pública en qué fase se encuentran registrados en el banco de proyectos del SNIP en el año 2013.

Tabla 6 Fases de los proyectos registrados en el SNIP, 2013

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Formulación	1	,9
	Viable	45	41,3
	Total	46	42,2
Perdidos	Sistema	63	57,8
Total		109	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2013.

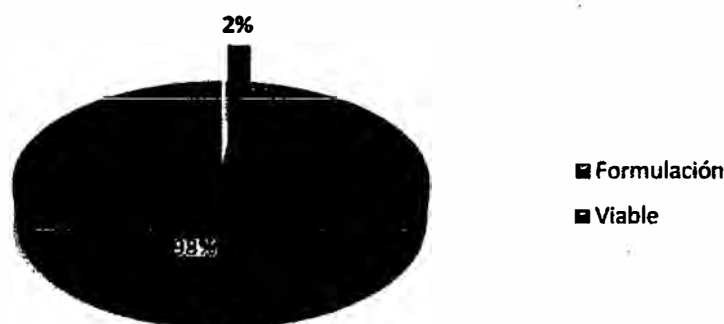


Figura 9 Fases de los proyectos registrados en el SNIP, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 6

Según la Tabla N° 6 y la Figura N°9, nos muestra que durante el año 2013 se registraron 46 proyectos de los 109 proyectos priorizados, en el Banco de Proyectos del SNIP, un 97.83% nos muestra los proyectos Viables durante ese año, mientras que un 2.17% nos muestra proyectos que se quedaron en la fase de Formulación, en la fase de Evaluación no se tuvo durante el año 2013, Según Anexo 04.

4.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP PERIODO 2013.

6.52%, cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 1'200,000.00. Proyectos elaborados a nivel de FACTIBILIDAD no se tuvo durante este periodo.

4.2.2. REGISTRO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCACIÓN, 2013.

4.2.3. Cuanto es el tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación, año 2013

Tabla 8 Tiempo de formulación de los proyectos de la función educación, 2013

	Frecuencia	Porcentaje
menor o igual a 3 meses	8	66,7
4 meses	1	8,3
mayor a 2 años	3	25,0
Total	12	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados del sector Educación en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2013.




Figura 11 Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 8

Según la Tabla 8 y la Figura 11 nos muestra que un 8.33% se formularon los proyectos del sector Educación en un tiempo de 4 meses y un 25% proyectos elaborados en menos de 3 meses ambos se encuentran en el tiempo establecido según la "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01", mientras que un 66.67% los proyectos son formulados mayor a 2 años, no cumpliendo con el tiempo establecido en el plan de trabajo según la directiva, donde implica mayor costo de formulación del proyecto y falta de credibilidad de la población en cuanto a la gestión, Según Anexo 05.

4.2.4. Tiempo de formulación y evaluación de los proyectos de la función Educación en las oficinas de ORPI y OPI del gobierno Regional de Apurímac, periodo 2013

Tabla 9 Tiempo de formulación en la ORPI, 2013

	Frecuencia	Porcentaje
menor a 3 meses	9	75,0
6 meses	1	8,3
más de 1 año	2	16,7
Total	12	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados del sector Educación en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2013.

Tabla 10 Tiempo de evaluación en la OPI, 2013

	Frecuencia	Porcentaje
menor a 3 meses	9	75,0
más de 1 año	3	25,0
Total	12	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados del sector Educación en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2013.




Figura 12 Tiempo de formulación de proyectos de la función Educación en ORPI, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla 9



Figura 13 Tiempo de evaluación de proyectos de la función Educación en la OPI, 2013

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla 10

Según la tabla 9, 10 y Figura 12, 13 podemos apreciar el tiempo de formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública del sector Educación, un 8.33% nos muestra proyectos formulados en menos a 3 meses, 16.67% proyectos formulados en 6 meses y un 75% en más de 1 año por la Oficina Regional de Pre Inversión Según la "Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01" el tiempo de formulación de un proyecto es de 4 meses, se puede apreciar que en su gran mayoría no se respeta este tiempo.

Mientras que la Oficina de Programaciones e Inversiones con un 25% evaluaron proyectos del sector Educación en menos de 3 meses y un 75% nos muestra la evaluación en más de 1 año, Según Anexo 06.

4.2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN SEGÚN LAS FICHAS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP, 2013.

PROYECTO N° 01: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa integrada Villa Gloria de nivel primario 54009 y nivel Secundario Villa Gloria del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Región Apurímac
Código SNIP N° 250282

Este proyecto da inicio el 26/02/2013 se trabajó en coordinación con la Oficina de Programaciones e inversiones 26/04/2013 entra a la Oficina Regional de Pre Inversión el 29/04/2013 y sale el 28/05/2014 durante el año 2014 se trabajó hasta el 31/12/2014, durante el año 2015 no se trabajó reingresa a la Oficina de Programaciones e Inversiones el 21/03/2016 y se da viabilidad el **25/07/2016**

PROYECTO N° 02: Mejoramiento de la aplicación en tic para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE. de nivel secundario de la UGEL Cotabambas - Región Apurímac *Código SNIP N°: 266905*

Este proyecto se registra en el banco de proyectos el 11/07/2013 y se llega a viabilizar el **16/09/2013**

PROYECTO N° 03: Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las iiee de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa.

Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas - Región Apurímac *Código SNIP N°: 275220*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 01/10/2013 y se llega a viabilizar el 22/10/2013

PROYECTO N° 04: Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria de la provincia de Chincheros - UGEL Chincheros - Región Apurímac *Código SNIP N°: 275005*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 27/09/2013 y se llega a viabilizar el 04/10/2013

PROYECTO N° 05: Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria del Distrito de Abancay. Provincia de Abancay - Región Apurímac *Código SNIP N°: 259303*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 08/05/2013 y se llega a viabilizar el 29/08/2013

PROYECTO N° 06: Mejoramiento de la aplicación TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las II.EE de nivel secundaria en 11 distritos de la Provincia de Andahuaylas - UGEL Andahuaylas - Región Apurímac *Código SNIP N°: 266491*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 06/07/2013 y se llega a viabilizar el 22/08/2013

PROYECTO N° 07: MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC *CÓDIGO SNIP N°: 246694*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 10/07/2013 y se llega a viabilizar el 05/03/2013

PROYECTO N° 08: Mejoramiento de las competencias de estudiantes y docentes, mediante la implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) en las Instituciones Educativas del nivel Secundario de las Ugels Aymaraes, Antabamba y Grau - Región Apurímac *Código SNIP N°: 257027*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 24/04/2013 y se llega a viabilizar el 04/06/2013

PROYECTO N° 09: Mejoramiento del Servicio Educativo de las IEl 670 Ratcay, IEl 207 Mollepiña, IEl 024 Curpahuasi, IEl 196 Ccoto, IEl 112 Chapamarca, IEl 201 Marquecca, de los Distritos de Curpahuasi y Chuquibambilla, PProvincia de Grau, Región Apurímac *Código SNIP N°: 250390*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 08/02/2013 y se llega a viabilizar el 24/09/2013

PROYECTO N° 10: Mejoramiento de la Aplicación de las TIC para el Adecuado Desarrollo de las Competencias de Estudiantes y Docentes en 16 IIEE de Nivel Secundaria de la Ugel Andahuaylas, Región Apurímac *Código SNIP N° 278163*

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 29/10/2013 y se llega a viabilizar el 13/11/2013

PROYECTO N° 11: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Chabuca Granda del Distrito Abancay, Provincia Abancay, Región Apurímac *Código SNIP N° 283035*

Este proyecto ingresa al Banco de Proyectos del SNIP el 20/12/2013 pasando como proyecto priorizado para el año 2014 donde se llega a viabilizar el 14/04/2014

PROYECTO N° 12: Mejoramiento de los Servicios Educativos en las Instituciones Educativas del nivel Primario de las Comunidades los Angeles, Sayhua, Pampahura, Matecclla, Distrito Huancarama-Andahuaylas-Apurímac
Código SNIP N° 251986

Este proyecto se registra en el Banco de Proyectos del SNIP el 27/02/2013 se trabajó en coordinación con la Oficina de Programaciones e Inversiones hasta el 27/12/2013 en el año 2014 entra a la Oficina Regional de Pre Inversión el 03/01/2014 se trabajó el proyecto hasta el 25/07/2014 se tuvo este proyecto en esta oficina hasta el 25/02/2015 con salida de OPI el 06/04/2015, se tuvo retenido en ORPI hasta el 29/02/2016 se culminó la fase de la elaboración y siendo viable el **17/10/2016**.

4.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS, 2014

4.3.1. Proyectos de inversión pública priorizados según función en el Gobierno Regional de Apurímac periodo 2014

Tabla 11 Proyectos priorizados según función, 2014

Proyectos Priorizados	Frecuencia	Porcentaje
Agropecuario	12	11,7
Comercio	4	3,9
Cultura y deporte	2	1,9
Educación	32	31,1
Energía	4	3,9
Infraestructura	7	6,8
Medio Ambiente	14	13,6
Minas	1	1,0
Orden público y seguridad	7	6,8

pesca	1	1,0
Productivo	4	3,9
Protección social	4	3,9
Salud	6	5,8
Turismo	5	4,9
Total	103	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión documental de los proyectos designados por Gerencia General a la Oficina Regional de Pre Inversión durante el periodo 2014.

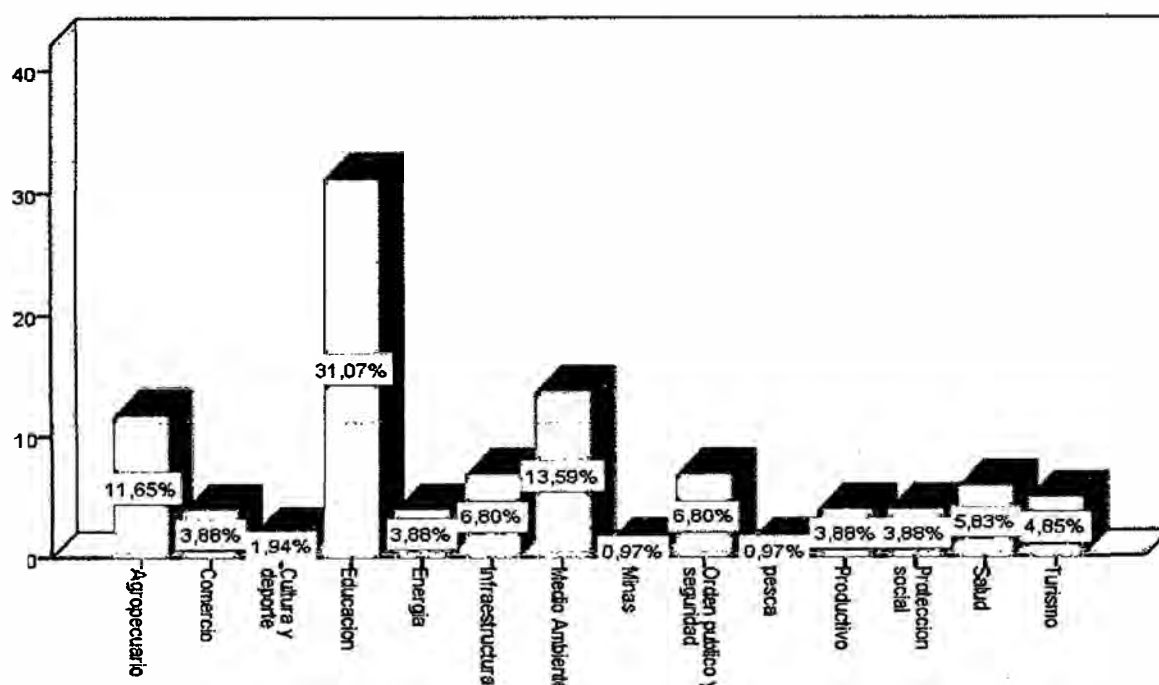


Figura 14 Proyectos priorizados según función, 2014

Fuente: elaboración propia en base a la Tabla 11

Según la Tabla 11 y la Figura 14 el Gobierno Regional de Apurímac durante el año 2014 los Proyectos de Inversión Pública priorizados, según las Oficinas a

cargo se centra más en la función de educación con 31.07%. Seguido de la función de Medio Ambiente con 13.59% (Recuperación de Áreas degradadas por Residuos Sólidos y limpieza pública), Función Agropecuario con 11.65%, con 6.80% se encuentran las funciones de Infraestructura, Orden público y seguridad, seguido de la Función de Salud con 5.83%, Turismo con 4.85%, las funciones de Protección social, Productivo, Energía y Comercio se encuentran con 3.88%, seguido de la función de Cultura y deporte con 1.94% y finalmente las funciones de Pesca, Minas con 0.97%, Según Anexo 07.

En el periodo 2014 se ha priorizado los proyectos de inversión pública tomando en cuenta la *Ley N° 28044, Ley General de Educación*, establecen que para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, el Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales; y, para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente

4.3.2. Intervención de los proyectos de inversión pública en las provincias de Apurímac, periodo 2014.

Tabla 12 *Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac, 2014*

Intervención de los proyectos	Frecuencia	Porcentaje
Abancay	24	23,3
Andahuaylas	8	7,8
Antabamba	9	8,7
Cotabamba	3	2,9

Chincheros	3	2,9
Aymaraes	3	2,9
Grao	9	8,7
Regional	36	35,0
Más de una provincia	8	7,8
Total	103	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión documental de los proyectos designados por Gerencia General a la Oficina Regional de Pre Inversión durante el periodo 2014.

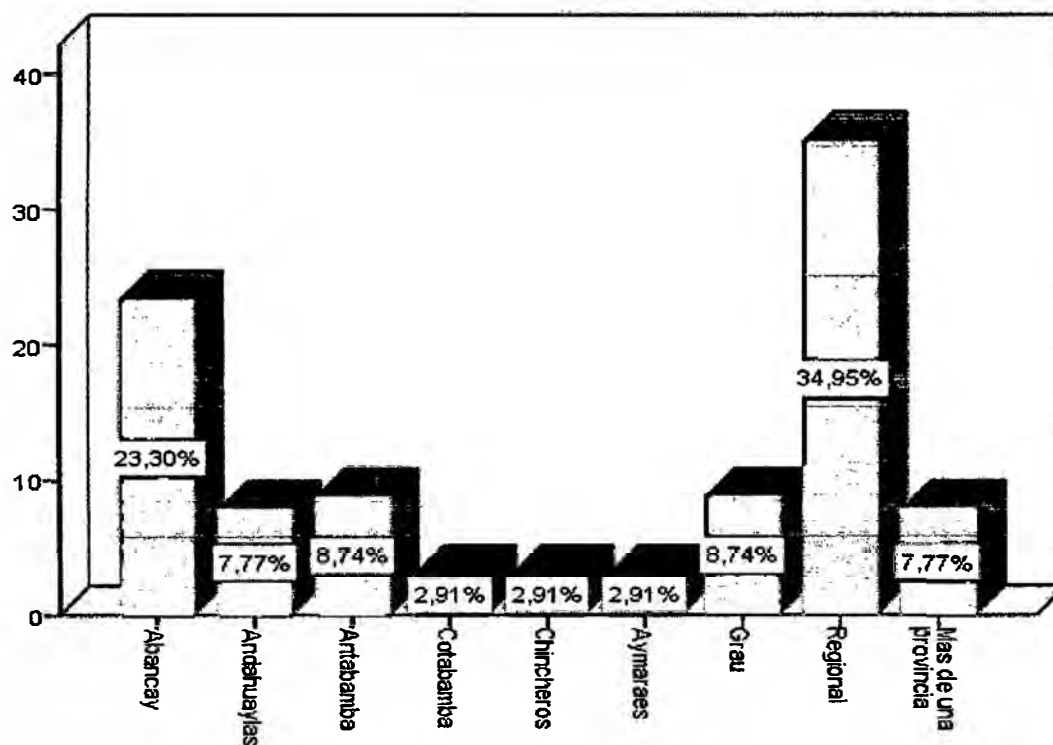


Figura 15 Intervención de los proyectos en las provincias de Apurímac, 2014

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 13

En la tabla 12 y Figura 15 se observa que la intervención de los proyectos inversión pública de cobertura Regional con un 34.95%, seguido de la Provincia de Abancay con un 23.30% en la priorización para su formulación los proyectos que intervienen serán de los sectores de Cultura y deporte,

Educación Salud, Agropecuario, Energía, Turismo, Infraestructura y Orden publica y Seguridad, con 8.74% las provincias de Antabamba y Grau, la intervención en más de una provincia y Andahuaylas con la intervención de las Funciones de Medio Ambiente, Educación, Infraestructura y Turismo fueron de 7.77%, y las provincias que tuvieron menor intervención fueron Cotabambas, Chincheros y Aymaraes con 2.91%

4.3.3. Modalidad de formulación de los proyectos de inversión pública periodo 2014

Tabla 13 Modalidad de formulación de proyectos, 2014

	Frecuencia	Porcentaje
Administración directa	80	77,7
Contrata	23	22,3
Total	103	100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión documental de los proyectos designados por Gerencia General a la Oficina Regional de Pre Inversión durante el periodo 2014.



Figura 16 Modalidad de formulación de proyectos, 2014

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 14

Según la tabla 13 y la Figura 16 nos muestra que un 77.67% los proyectos priorizados fueron por la modalidad de Administración Directa por la Oficina Regional de Pre Inversión durante el año 2014, mientras que un 22.33% nos indica que optaron por la modalidad de Contrata, para su respectiva formulación de los diversos proyectos.

4.4. PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP AÑO 2014

4.4.1. Los proyectos de inversión pública en qué fase se encuentran registrados en el banco de proyectos del SNIP en el año 2014

Tabla 14 Fases de proyectos registrados en el SNIP, 2014

Fases de proyectos registrados	Frecuencia	Porcentaje
Formulación	5	4,9
Evaluación	1	1,0
Viable	10	9,7
Total	16	15,5
Perdidos Sistema	87	84,5
Total	103	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2014.

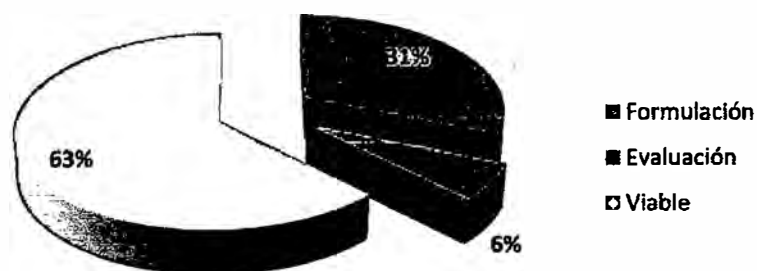


Figura 17 Proyectos registrados en el SNIP, 2014

Nota: Elaboración propia en base a la Tabla N° 14

Según la Tabla 14 y Figura 17, con un 62.50% se registraron proyectos viables, 31.25% se registraron proyectos en Formulación y finalmente con un 6.25% se registraron proyectos en Evaluación, Según Anexo 08.

4.4.2. Niveles de estudio de los proyectos de inversión pública año, 2014

Tabla 15 Nivel de estudio de los proyectos, 2014

Nivel de estudio proyectos		Frecuencia	Porcentaje
Válido	<= 1021964	2	1,9
	1021965 - 19939594	13	12,6
	20000000+	1	1,0
	Total	16	15,5
Perdidos	Sistema	87	84,5
Total		103	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos registrados en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2014.

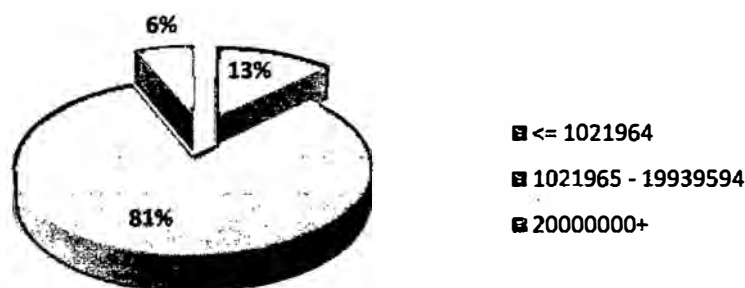


Figura 18 Nivel de estudio de los proyectos, 2014

Nota: Elaboración Propia en base a la Tabla N° 15

Según la Tabla 15 y la Figura 18, nos muestra proyectos a nivel de PERFIL con un 81.25% para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 20'000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Soles). Mientras que a nivel de PERFIL SIMPLIFICADO se obtuvo un 12.50% para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 1'200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil y 00/100 Soles). Proyectos elaborados a nivel de FACTIBILIDAD con un 6.25% para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean mayores a S/. 20'000,000.00 (Veinte Millones y 00/100 Soles).


4.5. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCACIÓN DURANTE EL PERIODO 2014

4.5.1. Cuanto es el tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación año 2014.

Tabla 16 Tiempo de formulación de los proyectos de la función educación, 2014

Tiempo de formulación	Frecuencia	Porcentaje
4 meses	1	14,3
1 año	1	14,3
mayor a 2 años	5	71,4
Total	7	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de los proyectos del sector Educación registrados en el banco de proyectos del SNIP, durante el periodo 2014.

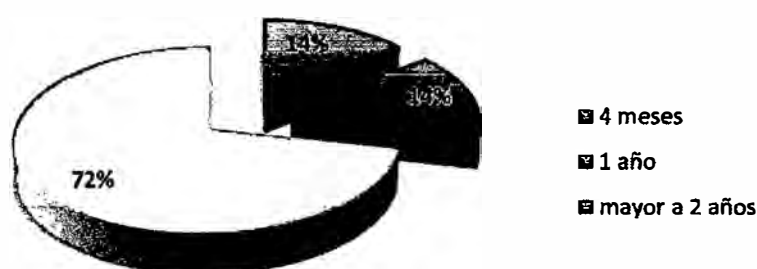**Figura 19** Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación, 2014

Nota: Elaboración Propia en base a la Tabla N° 16

Según la Tabla 16 y Figura 19, con un 71.43% nos muestra que se formularon proyectos del sector Educación en un tiempo mayor a 2 años, 14.29% nos indica que se formularon entre 4 meses y 1 año. Según la "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01", el tiempo de formulación de un proyecto es de 4 meses, se observa que el mayor porcentaje de proyectos formulados en el

sector Educación en la Oficina Regional de Pre Inversión no cumplen con el tiempo establecido, Según Anexo 09.

4.5.2. Tiempo de formulación y evaluación de los proyectos del sector Educación en las oficinas de ORPI y OPI del gobierno Regional de Apurímac, periodo 2014

Tabla 17 *Tiempo de formulación de los proyectos ORPI, 2014*

	Tiempo de formulación	Frecuencia	Porcentaje
Válido	menor a 3 meses	2	28,6
	1 año	1	14,3
	más de 1 año	4	57,1
	Total	7	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de las fichas del sector Educación registradas en el aplicativo SOSEM periodo, 2014

Tabla 18 *Tiempo de evaluación de los proyectos OPI, 2014*

	Tiempo de evaluación	Frecuencia	Porcentaje
Válido	menor a 3 meses	2	28,6
	6 meses	5	71,4
	Total	7	100,0

Fuente: Elaboración Propia, en base a la recopilación de información de las fichas del sector Educación registradas en el aplicativo SOSEM periodo, 2014




Figura 20 Tiempo de formulación de los proyectos del sector Educación en la ORPI, 2014

Nota: Elaboración Propia en base a la Tabla N° 17

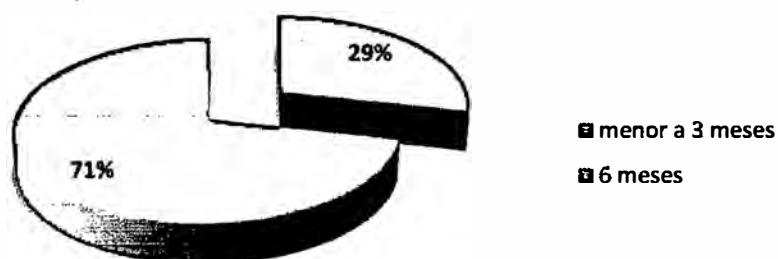


Figura 21 Tiempo de evaluación de los proyectos del sector Educación en la OPI, 2014

Nota: Elaboración Propia en base a la tabla N° 18

Según la tabla 17, 18 y Figura 20, 21 podemos apreciar el tiempo de formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública de la función

Educación, un 28.57% nos muestra proyectos formulados en menos a 3 meses, 14.29% proyectos formulados en 1 año y un 57.14% en más de 1 año por la Oficina Regional de Pre Inversión Según la *"Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01"* el tiempo de formulación de un proyecto es de 4 meses, se puede apreciar que en su gran mayoría no se respeta este tiempo.

Mientras que la Oficina de Programaciones e Inversiones con un 28.57% evaluó proyectos en menos de 3 meses y un 71.43% nos muestra la evaluación en 6 meses, Según Anexo 10.

Los plazos de evaluación de un PIP o Programa de Inversión, la OPI y la DGPM tienen, cada una, un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de recepción del Perfil; y cuarenta (40) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de recepción del estudio a nivel de Factibilidad. En el caso de solicitudes para aprobar Términos de Referencia de estudios de pre inversión, la OPI y la DGPI tienen, cada una, un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, para emitir el Informe Técnico correspondiente.

4.5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN SEGÚN LAS FICHAS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP, 2014.

PROYECTO N° 01: Mejoramiento del Servicio Educativo de las I.E.P 54046, I.E.P 54905, I.E.P 54873, I.E.P 54560, I.E.P 54041 del Distrito de Abancay y las I.E.P 54036, I.E.P 54075 del Distrito de Tamburco, Provincia de Abancay, Región Apurímac **CÓDIGO SNIP N°: 293572**

Este proyecto se registra en el Banco de proyectos del SNIP el 29/04/2014 durante el año 2014 se desarrolló en la oficina de ORPI en coordinación de la OPI hasta el 11/11/2014 permanece en la ORPI hasta el 20/06/2016 y se viabiliza el 19/08/2016

PROYECTO N° 02: Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.S David Samanez Ocampo del distrito de Tintay y la I.E.S Señor de animas del distrito de justo Apu Sahuaraura - Aymaraes – Apurímac *Código SNIP N°: 311015*

Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 según el registro del SISPIP aplicativo propio de la Oficina Regional de Pre Inversión se registra en el Banco de proyectos del SNIP el 16/02/2015 durante el año 2015 se desarrolló en la oficina de ORPI en coordinación de la OPI hasta el 26/11/2015 permanece en la ORPI hasta el 15/07/2016 y se viabiliza el 01/09/2016

PROYECTO N° 03: Mejoramiento del servicio educativo de la escuela superior de formación artística publica Chabuca Granda del distrito Abancay, provincia Abancay, Región Apurímac *Código SNIP N°: 283035*

Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 según el registro del SISPIP aplicativo propio de la Oficina Regional de Pre Inversión se registra en el Banco de proyectos del SNIP el 20/12/2013 y se viabiliza el 14/04/2014

PROYECTO N° 04: Mejoramiento del servicio educativo de la escuela superior de formación artística pública Chabuca Granda del distrito Abancay, provincia Abancay, Región Apurímac *Código SNIP N°: 250390*

Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 según el registro del SISPIP aplicativo propio de la Oficina Regional de Pre Inversión se registra en el Banco de proyectos del SNIP el 08/02/2013 y se viabiliza el 24/09/2015.

PROYECTO N° 05: Mejoramiento de la oferta de servicios educativos del nivel primario escolarizado de las IEP N° 54271 de totora, N° 54289 de Santa Rosa de Ancco, N° 54294 de Huacullo, N° 54292 de Kilcata, N° 54295 de Sonccoccocha y N° 54291 de Yumire del distrito Oropesa, provincia de Antabamba –Apurímac *Código SNIP N°: 246474*

Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 según el registro del SISPIP aplicativo propio de la Oficina Regional de Pre Inversión se registra en el

Banco de proyectos del SNIP el 12/29/2012 y se encuentra actualmente INACTIVO

PROYECTO N° 06: Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.S Ayahuay del distrito el oro, san juan bautista de la Salle del distrito de Oropesa, Giraldo contreras Trujillo del distrito de Antabamba y Antonio Raymondi del distrito de Pachaconas de la , Provincia de Antabamba – Apurímac *Código SNIP N°: 250205*

Este proyecto se desarrolló durante el año 2014 según el registro del SISPIP aplicativo propio de la Oficina Regional de Pre Inversión se registra en el Banco de proyectos del SNIP el 12/29/2013 se desarrolló hasta el 19/12/2013 en coordinación con las oficinas de ORPI y OPI en la oficina de ORPI se encontró hasta 07/01/2014 durante el año 2014 se desarrolló el proyecto hasta el 30/12/2014 retomando el 17/12/2015 a la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Antabamba donde se viabiliza a cargo de la gerencia en mención el 23/03/2016

PROYECTOS SIN REGISTRO:

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en los tres niveles de la i.e. el Carmelo de molino pata, distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac.

Mejoramiento del servicio de educación, primaria en las instituciones educativas: I.E.P N° 54395 Huayo, I.E.P. N° 54431 Cesar Abraham Vallejo Mendoza, I.E.P. N° 54601 Ccochacocha, I.E.P. N° 54430 Pucurhuay, I.E.P. N° Señor de los Milagros, en los distritos de Curasco, CURPAHUASI Y Huayllati Provincia de Grau, región Apurímac.

Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. integrada: Warmakuyay n° 56106 de totoral, distrito de san Jorenoímo provincia de Andahuaylas – región Apurímac.

Mejoramiento de los servicios educativos de las I.E.P. N° 54046 de Huayllabamba, N° 54075 Raúl luna cordero, N° 54905 Sur América de Illanya, N° 54873 nuestra Señora Virgen de Guadalupe de limapata, N° 54904 bancapata, N° 54036 señor de Exaltacion y N° 54560 de Pachachaca, Distrito y provincia Abancay, Región Apurímac.

Mejoramiento del Servicio para el Fortalecimiento de Capacidades de aprendizaje de la I.E de nivel secundario: Pampahuite, Ccorichichina, Tamboraccay, del distrito de Curpahuasi, Huayllati, Provincia de Grau, Región Apurímac

Mejoramiento de los Servicios Educativos de las I.E.P.N°54606 de Totoray, Asmayacu, Ocoruro, 54056 de Lucmos y el 54020 de Pisonaypata distrito Curahuasi Provincia Abancay, Región Apurímac (des.soc.)

Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de nivel inicial: Cconccacca, progreso, Picosayhuasi, Huayao, Chacapampa, Curasco, Taylla, Casancca del distrito de progreso y Curasco, provincia de Grau Región Apurímac

Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial: Tacla, Ccochaccocha, Tambo, Yanarico, Chuchaucasa, Tastapata, Huascar del distrito de Curasco, Huayllati, Curpahuasi, Provincia de Grau, Región Apurímac

Los proyectos en mención fueron registrados en el aplicativo informático SISPIP propio de la Oficina Regional de Pre Inversión. Y no cuenta con mucha

información porque se registró culminando el año en curso pero si dieron inicio con el estudio.



Conclusiones

- a. Las acciones previas para dar inicio con el seguimiento y monitoreo de la formulación de un proyecto de inversión pública en el sector de educación, es priorizar los proyectos y conformar un equipo multidisciplinario que permita la formulación dentro de los plazos establecidos, el jefe de proyecto realiza el plan de trabajo o términos de referencia, según sea el caso. Esta priorización debe ser objetiva es decir debe estar dentro de un proceso de planificación de corto, mediano y largo plazo para conseguir las metas y resultados que se establecieron en el marco de un proceso de desarrollo verdadero y no como lo que sucede hasta ahora; manoseado por la influencia política que desvirtúa el fin de la formulación de un proyecto.

- b. Generalmente no se logra cumplir el cronograma establecido de 4 meses según el SNIP, porque no se cuenta con un buen equipo de seguimiento y monitoreo durante la formulación un proyecto por varias razones; el equipo que se conforma generalmente no tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo las tareas en el plazo establecido: ejemplo levantamiento topográfico, coordinación con los involucrados, etc. El personal no tiene elementos técnicos y justificatorios para afrontar una serie de hechos nuevos que se presentan y los cuales se debe resolver en el menor tiempo posible, durante el periodo en estudio los proyectos fueron formulados en un tiempo mayor a 2 años, dentro de las dificultades se vio que no se cuenta con información sistematizada, adecuadamente en las instituciones públicas del sector: ejemplo UGELs, DRE-a si se quiere saber cuántas I.E.I están equipadas al 100% con todos sus recursos pedagógicos y así en los otros niveles, por otro lado durante la evaluación de los proyectos de inversión del sector Educación la Oficina de programaciones e Inversiones no entrega en el tiempo establecido los

proyectos a su cargo, por la sobrecarga de proyectos generando un desempeño laboral deficiente por parte del personal que labora en dicha área, y el poco personal con que cuenta esta oficina, esto ocasiona el incumplimiento del cronograma establecido, estos retrasos llevan a aumentar el costo de formulación de un proyecto de inversión pública y la falta de credibilidad de nuestra población ante la gestión del Gobierno Regional.

- c. La Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac para hacer seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión del sector Educación que se vienen formulando no cuenta con especialistas en la materia y no tiene personal capacitado, para dar soluciones a los posibles problemas en el camino de la formulación de un proyecto.

Recomendaciones

- a. Conformar los equipos técnicos multidisciplinarios que nos permita iniciar con el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública en especial en el sector educación, para ello se tiene que establecer un programa de selección de personal a cargo de un equipo de profesionales con amplia experiencia en formulación de PIPS (o puede ser una empresa especializada en selección de recursos humanos) para determinar sus habilidades, experiencias y demás conocimientos y que nos permita formular dentro de los plazos establecidos por ello se debe establecer salidas al campo previas a elaborar el PDT para conocer en el lugar de los hechos la situación problemática en que se encuentra los beneficiarios y que luego se convertirá en el problema que se reflejara en el plan de trabajo.

- b.** Los proyectos de inversión pública se deben formular en los plazos establecidos en el plan de trabajo y/o en los términos de referencia establecidos en el SNIP, Se plantee un buen PDT o TDR, cada proyectos tenga su propio equipo multidisciplinario. Y estudios complementarios por el tema de contrataciones como estudios de suelos, con el fin de reducir en tiempo de formulación de los PIPs, a la vez Revisar las experiencias de los consultores en cuanto la entrega de los trabajos encargados en el plazo establecido ya que por razones administrativas y otras no entregan estos estudios. El impacto económico en cuanto se realiza el seguimiento y monitoreo de manera adecuada en la formulación de un PIP, es poco calculado y no se tiene estimaciones de esto. Por otro lado también no se tiene cifras ni estimaciones económicas en cuanto a la inadecuada formulación de los PIPs, ya sea por cualquier razón y las consecuencias técnicas y políticas de no terminar un proyecto en el plazo establecido.
- c.** Fortalecer las capacidades operativas de los recursos humanos en formulación y evaluación de PIP y conformar un equipo técnico adecuado que tenga todos los profesionales y sean competentes, para alcanzar las metas que se puedan cumplir.
- d.** Tampoco se tiene estudios sobre cómo la población beneficiaria va perdiendo credibilidad en las labores que realizan los profesionales de esta oficina o de la institución pública involucrada.
- e.** Para garantizar proyectos sostenibles es necesario realizar seguimiento y monitoreo en las tres etapas de un proyecto de inversión pública.

Bibliografía

- 27293, L. N. (2008). ARTICULO 4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. Obtenido de http://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/file/manual/ley_SNIP_julio08.pdf
- 28044, L. N. (2003). LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Obtenido de http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
- CAAL, E. R. (s.f.). MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Obtenido de https://docs.google.com/file/d/1RWGPYJZQI3GQjtlW7MBWFic2Px1kMwELM4TSH4Zno_Ris84goBOOyB4X6F83/edit?usp=sharing&pli=1
- Castro, S. A. (Julio de 2013). Sistema de monitoreo inteligente para detectar fallas en inversor multinivel. Obtenido de <http://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1841/614535.pdf?sequence=1>
- CELIS, D. H. (2011). AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. Obtenido de <http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/auditoria-recursos-humanos-gestion-municipal.htm>
- CHAIN, N. S. (2011). PROYECTO DE INVERSIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. CHILE: PEARSON EDUCACIÓN DE CHILE S.A.
- Cutipa, F. C. (2009). EL MAPIC EN LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. En F. C. Cutipa, EL MAPIC EN LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (pág. 347). Diseño y Diagramaciones: Pelayo Apaza SANCHEZ, SAGITARIO IMPRESORES.
- Estado, L. d. (2009). articulo 52: soluciones de controversias. Obtenido de [http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Ley_y_Reglamento_2009_02feb09\(2\).pdf](http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Ley_y_Reglamento_2009_02feb09(2).pdf)



- Finanzas, M. d. (s.f.). BANCO DE PROYECTOS. Obtenido de http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/new-bp/operaciones-bp.php
- Finanzas, M. d. (s.f.). Inversión Pública. Obtenido de http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2558%3Adireccion-general-de-politica-de-inversiones&catid=308&Itemid=101079&lang=es
- Finanzas, M. d. (JUNIO de 2011). PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. Obtenido de http://www.snip.gob.pe/contenidos/seguimiento/Guias_Metodologicas/Pautas_de_Seguimiento/Seguimiento_y_Monitorero_22.pdf
- Gubernamentales, C. d. (2006). Ley de presupuesto de la republica manual de gestion gubernamental. Lima: REAL EDITORES.
- Gubernamentales, C. d. (2006). ley de presupuesto de la republica manual de gestiones gubernamentales. Lima: real editores.
- Hernandez Celis, D. (2004). Deficiencias de control interno en el proceso de ejecución presupuestal. Obtenido de www.gestiopolis.com
- Maria, G. M. (1972). La evolucion del presupuesto público del Perú y las mejoras a introducirse. Obtenido de www.gestiopolis.com
- MARTINEZ, E. C. (s.f.). MANUAL DE FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES. Obtenido de <http://es.slideshare.net/FernandoMartinSantanna/manual-de-evaluacion-de-proyectos-sociales?related=1>
- MEF. (2011). Aplicativo Informatico Banco de Proyectos. Obtenido de http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/nd_AnexoSNIP02_Aplicativo_Informatico_del_Banco_de_Proyectos.pdf
- Mendoza, S. V. (2007). Pasos para elaborar proyecto y tesis de investigación científica. En S. V. Mendoza, Pasos para elaborar proyecto y tesis de investigación científica (pág. 32). San Marcos primera edición.
- Nuria Forcada, M. C. (2008). Experiencias exitosas en proyectos de plantas industriales. Revista ingeniería de construcción , 3-5.

- PERUANO, E. (15 de FEBRERO de 2009). Aprueban el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública , pág. 15.
- Pública, L. d. (2006). Obtenido de http://www.regiónpiura.gob.pe/documentos/ley_27293.pdf
- publica, S. n. (2006). Resolución Directorial nº0001-2006-EF/68.01.
- Roberto, T. R. (2004). control de calidad en el desarrollo industrial. Obtenido de Investigación presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal
- Salcedo, A. M. (2012). Seguimiento y Evaluación de la gestión Estratégica del Ministerio de Administración Pública 2006 - 2010. Obtenido de <http://biblioteca.funlode.net.do/Tesis-iglobal/Alta-direccion-publica/ADP%20514%20TESIS,%20A.%20SALCEDO,%2010-0021.PDF>
- Salcedo, A. M. (Febrero de 2012). Seguimiento y Evaluación de la Gestión Estratégica del Ministerio de Administración Pública 2006 - 2010. Obtenido de <http://biblioteca.funlode.net.do/Tesis-iglobal/Alta-direccion-publica/ADP%20514%20TESIS,%20A.%20SALCEDO,%2010-0021.PDF>
- SAMPIERI, R. H. (2010). Metodología de la investigación. INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
- Sampieri, R. H. (2010). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN quinta edición. Mexico: INTERAMERICANA EDITORES S.A.
- SOLANO, R. A. (Marzo de 2011). Propuesta de una metodología técnica para el desarrollo de un Sistema Informático de Monitoreo y Evaluación de los programas y proyectos de inversión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Recuperado el Diciembre de 2014, de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/2629/1/Tesis%20Rosa%20Velasco.pdf>
- Sosa, C. M. (enero de 2013). Análisis del actual sistema nacional de inversión pública de Honduras . Recuperado el diciembre de 2014, de http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112390/cf-aguilar_cs.pdf?sequence=1

- SUPO, J. (2010). www.SeminariosdeInvestigacion.com. Obtenido de <http://seminariosdeinvestigacion.com/niveles-de-investigacion/>
- VERA, F. M. (2006). Analisis y estudio comparativo de los programas de computación para la administración de proyectos. Obtenido de <http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Analisis%20y%20estudio%20comparativo.pdf>



ANEXOS



ANEXO 02
GUIA DE ENTREVISTA

Instrucción: Señores (as), esperando conocer el proceso de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública del sector educación en la Oficina Regional de Pre Inversión del Gobierno Regional de Apurímac año 2013 - 2014. En el presente trabajo de investigación recogemos la presente información a los funcionarios responsables de las respectivas áreas.

1. Entrevista a coordinadores de Proyectos de Inversión Publica en el sector Educación.

Nombre del Proyecto:

2. La formulación de un proyecto de inversión, cumple con el cronograma establecido en el plan de trabajo o términos de referencia.

- a. Si
- b. No

3. El Proyecto que usted ha elaborado se encuentra a nivel de :

- a. Perfil
- b. Factibilidad

4. ¿Cómo se viene realizando actualmente el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública en el sector de educación?

.....
.....
.....
.....

5. ¿Cuál es el monto de inversión total a precios de mercado de los proyectos?

.....
.....
.....

6. ¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión pública en el sector educación?

.....
.....
.....
.....

7. ¿Qué recomendaciones daría usted para que se pueda realizar un seguimiento y monitoreo adecuado a los proyectos de inversión pública en el sector educación?

.....
.....
.....
.....
.....



CUADROS ESTADISTICOS



ANEXO 3

PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO 2013

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIO
1	268054	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCLLACCASA-PACCAYPATA-COYLURQUI-TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC	\$ 657,022,115.00	TRANSPORTE	ABANCAY, GRAU, Y COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
2	264750	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LA REGIÓN APURIMAC	\$ 15,662,547.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA
3	250282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC	\$ 11,122,121.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
4		CONSTRUCCION DEL AERÓDROMO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	\$ 9,722,911.00	TRANSPORTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
5	250205	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO EL ORO, HUACULLO DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC.	\$ 15,309,721.00	EDUCACIÓN	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
6	251986	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECCLLA, DISTRITO HUANCARAMA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC	\$ 13,156,894.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
7	250282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC	\$ 11,415,960.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
8	250390	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 665 COLLAURO, 670 RATCAY, 207 MOLLEPIÑA, 024 CURPAHUASI, 196 CCOTRO, 112 CHAPIMARCA, 201 MARQUECCA; DISTRITOS DE GAMARRA, CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU REGIÓN APURIMAC	\$ 9,640,339.00	EDUCACIÓN	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
9	251914	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO: IE. N54030 VIRGEN DEL CARMEN, DE HUANIPACA, IE. N 54072 SAN JUAN DE LIMANQUI, IE. N. 54070 DE PACOBAMBA, IE. N 54466 RICARDO PALMA DE KIUÑALLA, DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC	\$ 9,256,395.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
10	273234	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUAMANAIRE - CUNCACC - LAMBRASPATA - CCOCHA QUISCAPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 4,953,040.00	TRANSPORTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
11	246479	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CATEGORIAS I-1 Y I-2 DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC	\$ 17,619,725.00	SALUD	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA

12	258253	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION GRAU PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC	\$ 3,447,132.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
13	250253	MEJORAMIENTO CARRET. DEPART.: INTERSECCION STA. MARIA DE CHICMO DV. HUACCANA-PISCOBAMBA-OCABAMBA-ONGOY-HUACCANA-CHINCHEROS/NUEVA ESPERANZA-URANMARCA-MUÑAPUCRO-COCHARCAS-SAÑOCC-MIRAFLORES/TOTORABAMBA-DV. URANMARCA Y DV. COCHARCAS/DV. CHINCHEROS Y DV. CAYARA-CHALLHUANI/HUA -PTERIO PAMPAS/MOYACCASA-CURAMPA-HAC. PULCAY-RIO PAMPAS, PROV. ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - APURIMAC	\$ 173,047,181.00	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA
14	250050	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: SANTA ROSA-MOCCHOCO-SOJO-MASOPAMPA-PTE. AMARU-HUANCAPAMPA-PISCOYA- PTE. TURISA-MATARA-ANTABAMBA/DV. CARAYBAMBA-CARAYBAMBA-YANAQUILCA-MOLLEBAMBA-ABRA KCOEILO-ANTABAMBA/SANTA ROSA-SANTIAGO-ANCOBAMBA/CHALHUANCA-YANACA-SARAICA/SOCOSANI-SARAICA-CHANTA-POCOHUANCA/HUANCAPAMPA-MISCAPATA-AYAHUAY-PACHACONAS, PROV. DE AYMARAES Y ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 142,090,611.00	TRANSPORTE	AYMARAES ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
15	249960	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: DV. LAMBRAMA - LAGUNA TACCAJA - PTE. MOLINO - JUQUI - PALPACACHI - LLAULLIPATA - HACIENDA COLLAURO - PTE. MATALLA - PFACO / DV. RAMAL JUQUI - TARIBAMBA - PICHIBAMBA - SARCONTA - PACCAYPATA - OLLABAMBA - PTE. AMARUYOC - PFACO / PTE. MATALLA - VILCARO - MANASQUI - HUAYLLATI - DV. PALCA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 107,813,414.00	TRANSPORTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
16	249499	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: DV. CHUQUIBAMBILLA - CHIRIRQUI - PATAYPAMPA - PIYAY - SAN JUAN DE VIRUNDO - TURPAY - TOTORA OROPESA - MAMARA - SAN ANTONIO - MISKA - AYRIHUANCA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 73,150,668.00	TRANSPORTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
17	250156	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: COYLLURQUI - CHAHUAY - NAHUINLLA - PAMPUTA - DV. CHALCOBAMBA - FUERABAMBA - FERROBAMBA - DV. CHALLHUAHUACHO / PFACO - PALLPARO - COYLLURQUI - ABRA LLAMALLUPA - COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 72,944,103.00	TRANSPORTE	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
18	250004	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: HUANCABAMBA - LAG. SUYTUCCOCHA - CAIHUACHAHUA - LUCRE - TINTAY - PTE. PAMPATAMA / DV. SAÑAYCA - SAÑAYCA - TOROHUISCCANA - AYAPAMPA, PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 57,021,627.00	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA
19	159624	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA CHUMBAO - MARGEN IZQUIERDA	\$ 49,961,147.00	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA

20	249968	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CASINCHIHUA - PICHIRHUA - ATUMPATA - CALLUNHUACHO- CHARAURO - CHALHUANI - HACIENDA CAROLINA - CASINCHIHUA / CASINCHIHUA - CHACOCHÉ - ANCHICHA / PTE. YACA - OCOBAMBA - CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 46,871,636.00	TRANSPORTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
21	250224	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: PTE. ISURAY - CONGOTA - PISACCASA - MARA / MARA - DV. COCHA - HAQUIRA / HAQUIRA - DV. MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 44,577,429.00	TRANSPORTE	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
22	236688	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA FUERABAMBA, DE LOS NIVELES PRIMARIA N50651 Y SECUNDARIA, EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	\$ 32,534,957.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
23	250130	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CHAMPACCOCHA - ARGAMA - MITUPAMPA - TOCTOPATA - QUILLABAMBA - SOTCCOMAYO - MATAPUQUIO - DV. MATAPUQUIO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 31,225,923.00	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
24	159651	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA HUANCARAY	\$ 23,257,584.00	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
25	250149	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: PTE. ANTARUMI - TAQUEBAMBA - SAN MATEO - SAN JUAN DE CHACÑA - TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	\$ 18,507,701.00	TRANSPORTE	AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA
26	159662	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA URIPA - CHINCHEROS	\$ 17,510,189.00	AGROPECUARIA	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA
27	166718	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO. 775 ANTAPUNCO, NO. 772 BELLAVISTA, NO. 713 CCOCHA, NO. 717 HAPUPAMPA, NO. 771 HUANCACALLE GRANDE, NO. 777 HATUNRUMIYOC, NO. 179 HUANCASCA, NO. 714 LLAC-HUA Y NO. 752 PATAN DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC	\$ 13,114,356.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
28	248284	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE EDUCATIVO DE LAS I.E.I 329 PAMPAHURA, 353 MATECILLA, 937 LAMBRASPATA, 938 HUACCAYURA, 198 TAMBO, 039 SANTA ANA, 143 LLACTABAMBA, I.E.I SAYHUA DEL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN APURIMAC	\$ 11,286,223.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
29	266905	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS H.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC	\$ 9,999,223.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA
30	246512	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGIÓN APURIMAC	\$ 9,996,624.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA

31	246513	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUIHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,994,688.00	MEDIO AMBIENTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
32	246503	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAEES - REGION APURIMAC	\$ 9,992,028.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAEES	ADMINISTRACION DIRECTA
33	242498	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,987,691.00	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA
34	228352	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,980,846.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
35	228010	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,972,892.00	MEDIO AMBIENTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
36	275220	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,970,503.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
37	229035	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,968,174.00	MEDIO AMBIENTE	COTABAMBAS GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
38	246533	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAEES - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,966,009.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAEES	ADMINISTRACION DIRECTA
39	240841	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,962,964.00	MEDIO AMBIENTE	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA
40	242614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N°54654 CHIHUARQUE, I.E.P N°54086 TAMBO, I.E.P N°54710 LLACTABAMBA, I.E.P N°54475 SOCCORO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y LA I.E.P N°54663 SALLAC, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	\$ 9,961,519.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
41	275005	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,949,602.00	EDUCACIÓN	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA
42	227993	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,948,105.00	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA

43	246502	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC	\$ 9,926,684.00	MEDIO AMBIENTE	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA
44	246545	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,924,361.00	MEDIO AMBIENTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
45	246674	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	\$ 9,920,147.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
46	259303	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,912,593.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
47	246496	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,907,550.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
48	266491	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,897,742.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
49	173227	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IE. INICIALES 770 YERBABUENAYOC, 764 CHAHUAY, 768 PATAHUASI, 767 SIJAHUI, 763 PALLPARO, 950 SORCCO, 766 YADQUIRI Y 191 ACPITAN, DISTRITO DE COYLLURQUI, COTABAMBA, REGION APURIMAC.	\$ 9,891,931.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
50	257027	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,876,353.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
51	246694	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAE, ANTABAMBA Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	\$ 9,853,198.00	EDUCACIÓN	AYMARAE ANTABAMBA Y GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
52	246548	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC	\$ 9,803,667.00	MEDIO AMBIENTE	GRAU Y ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
53	159653	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA PACUCHA	\$ 9,764,242.00	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
54	161966	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURÍMAC	\$ 9,714,071.00	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA

55	242613	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA EN LA COMUNIDAD DE SOTAPA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	\$ 8,120,263.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
56	246585	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES DIVINO MAESTRO DE MATAPUQUIO Y JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	\$ 7,506,753.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
57	278163	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	\$ 6,664,225.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
58	266325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS OFERTADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION APURIMAC, REGION APURIMAC	\$ 6,417,804.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA
59	165243	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54018 RAMÓN CASTILLA DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	\$ 5,890,002.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
60	251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 5,666,778.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
61	175039	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC	\$ 5,514,913.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
62	225675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	\$ 5,169,848.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
63	241728	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 4,956,415.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
64	236629	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 756 FUERABAMBA - JARDÍN, EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	\$ 4,940,448.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
65	258979	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES CHICUCORRAL, BARROBAMBA, HUATURO, HUALLPAHUASI, PATACHACRA, MOYOPATA, DESAGUE, ÑAHUI, PALTAYHUAYCCO, INCAHUASI, PATAPATA, CONDORCUNCA, ALGODONPAMPA, VICAUSONCCO, CHACAPAMPA Y ACCOPAMPA DE LA COMUNIDAD DE COTARMA DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	\$ 4,712,211.00	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
66	236541	CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL FUERABAMBA - CUNA, EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	\$ 4,619,704.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA

67	251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 4,132,831.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
68	242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 3,986,798.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
69	196956	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU - APURIMAC	\$ 3,950,007.00	AGROPECUARIA	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
70	241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 3,614,132.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
71	251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 3,577,155.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
72	241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 3,472,502.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
73	241739	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 3,270,495.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
74	197458	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY - MANA ATISCCA - PATY , DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 3,218,597.00	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
75	241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 2,933,276.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
76	141967	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA - HUANCA (UMUYTO) - HATUNRUMIYOC - PISCOKAILLA - CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	\$ 2,888,846.00	TRANSPORTE	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
77	241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 2,746,726.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
78	249633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 2,550,976.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
79	259770	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHACA NAHUIPUCYO , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 2,527,180.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA

80	251582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO MACCASPACCA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 2,439,886.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
81	241733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	\$ 2,392,159.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
82	249390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHIHUARQUE, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 2,377,900.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
83	241740	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 2,293,014.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
84	251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 2,141,048.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
85	241746	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 2,132,377.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
86	275116	INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC REGION APURIMAC.	\$ 2,098,373.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
87	249559	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MATECCLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 2,076,795.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
88	259284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE YANACCA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 2,071,534.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
89	249296	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 2,068,140.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
90	241751	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	\$ 2,056,881.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
91	241741	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUEUNAPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	\$ 1,893,463.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
92	242793	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 1,756,030.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA

93	242806	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 1,676,010.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
94	251587	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCALUANCA AHUALLA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 1,638,081.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
95	242099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBA - APURIMAC	\$ 1,608,211.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
96	249833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICSUPILLO, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBA - APURIMAC	\$ 1,599,756.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
97	242084	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBA - APURIMAC	\$ 1,583,686.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
98	258169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACAHUA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBA - APURIMAC	\$ 1,494,670.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
99	241747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 1,464,008.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
100	241752	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE ALTO, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	\$ 1,376,540.00	SANEAMIENTO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
101	257913	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUMAHUIRE, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBA - APURIMAC	\$ 1,372,953.00	SANEAMIENTO	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA
102	249338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	\$ 1,348,836.00	SANEAMIENTO	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
103	264584	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA POBLACION, EN LA REGIÓN APURIMAC	\$ 1,198,168.62	CULTURA Y DEPORTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA
104	242457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA REGION DE APURIMAC	\$ 1,190,000.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA
105	253698	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DE L DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY	\$ 978,119.65	ENERGIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA
106	265662	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	\$ 768,576.49	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA

107	172635	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HUAYO, ENTRE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURMAC.	\$ 443,386.83	TRANSPORTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA
108	253738	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL TINCOCO DE LA COMUNIDAD DE POCCANCCA, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.	\$ 355,463.87	TRANSPORTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA
109	236239	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA - REGION APURIMAC.	\$ 1,111,299.24	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	ANTABAMBA	CONTRATA

Fuente: Elaboración propia



ANEXO 4

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP 2013									
N°	Código Único/ SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Situación	Fecha Registro	Fecha Viabilidad	Beneficiarios	Código SIAF
1	251986	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECCLLA, DISTRITO HUANCARAMA- ANDAHUAYLAS-APURÍMAC	S/. 13,156,894.00	EDUCACIÓN	VIABLE	27/02/2013		2060	2234553
2	250282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	S/. 10,846,402.00	EDUCACIÓN	VIABLE	26/02/2013		4401	2234407
3	266905	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,999,223.00	EDUCACIÓN	VIABLE	11/07/2013	11/09/2013	7302	2185059
4	246512	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAE - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,996,624.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	17/05/2013	8074	2234961

5	242498	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,987,691.00	AMBIENTE	VIABLE	02/01/2013	06/09/20 13	123111	2234052
6	275220	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,970,503.00	EDUCACIÓN	VIABLE	01/10/2013	22/10/20 13	7321	2186650
7	240841	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS- REGIÓN APURIMAC	S/. 9,962,964.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	25/06/20 13	10200	2234101
8	275005	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,949,602.00	EDUCACIÓN	VIABLE	27/09/2013	04/10/20 13	6984	2185877
9	246502	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC	S/. 9,926,684.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	11/06/20 13	14645	2234102
10	246545	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHÉ Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,924,361.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	16/05/20 13	6998	2234960
11	246674	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	S/. 9,920,147.00	AMBIENTE	VIABLE	04/01/2013	02/05/20 13	14962	2177775
12	259303	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,912,593.00	EDUCACIÓN	VIABLE	08/05/2013	29/08/20 13	7714	2234459
13	246496	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,907,550.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	31/05/20 13	7365	2234959
14	266491	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,897,742.00	EDUCACIÓN	VIABLE	06/07/2013	22/08/20 13	6305	2184900

15	257027	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,876,353.00	EDUCACIÓN	VIABLE	24/04/2013	04/06/2013	6219	2234460
16	246694	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAE, ANTABAMBA Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,853,198.00	EDUCACIÓN	VIABLE	03/01/2013	30/01/2013	7368	2166936
17	246548	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC	S/. 9,803,667.00	AMBIENTE	VIABLE	03/01/2013	25/06/2013	1530	2234100
	258043	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC	9658668	PLANEAMIENTO , GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	25/04/2013	02/06/2014	14963	2234332
18	241271	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 04 SUB CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,542,173.00	AMBIENTE	VIABLE	02/01/2013	29/04/2014	350560	2234045
	280231	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TÚPAC AMARU, PROVINCIA Y DISTRITO DE CHINCHEROS-APURÍMAC	9110303	EDUCACIÓN	EN FORMULACION	22/11/2013		5043	
19	261218	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	S/. 8,546,499.00	AMBIENTE	VIABLE	24/05/2013	02/07/2014	160030	2250114
20	268344	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	S/. 8,419,249.00	AMBIENTE	VIABLE	22/07/2013	11/12/2014	9668	2250276
21	264750	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PISCICOLA OMAR CAMPOS PEREZ DEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURIMAC	S/. 8,358,201.00	PESCA	FORMULACION	24/06/2013		8903	2194712
22	250390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC	S/. 7,020,328.00	EDUCACIÓN	VIABLE	08/02/2013	24/09/2015	965	2234552
23	278163	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	S/. 6,664,225.00	EDUCACIÓN	VIABLE	29/10/2013	13/11/2013	4018	2187160

24	266325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS OFERTADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION APURIMAC, REGION APURIMAC	S/. 6,417,804.00	PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	06/07/2013	06/09/2013	9621	2192442
25	251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	S/. 5,666,778.00	SANEAMIENTO	VIABLE	19/02/2013	03/04/2013	429	2178726
26	258979	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES CHICUCORRAL, BARROBAMBA, HUATURO, HUALLPAHUASI, PATACHACRA, MOYOPATA, DESAGUE, NAHUI, PALTAYHUAYCCO, INCAHUASI, PATAPATA, CONDORCUNCA, ALGODONPAMPA, VICAUSONCCO, CHACAPAMPA Y ACCOPAMPA DE LA COMUNIDAD DE COTARMA DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	S/. 4,712,211.00	AGROPECUARIO A	VIABLE	08/05/2013	15/11/2013	1009	2187605
	270914	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA, TOCCYASCCA Y CCATUNHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	4656282	AGROPECUARIO A	VIABLE	15/08/2013	14/07/2014	2380	2250345
	265883	INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA EL DESPLIEGUE Y ACCESO A RED DE TELECOMUNICACIONES EN LAS II.EE Y POSTAS MEDICAS EN LAS COMUNIDADES EN 17 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC	4383750	COMUNICACIONES	VIABLE	04/07/2013	13/09/2013	1108	2194475
27	251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	S/. 4,132,831.00	SANEAMIENTO	VIABLE	19/02/2013	03/04/2013	737	2178727
28	278911	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESBORDES EN LAS MARGENES DE LAS QUEBRADAS DE LOS RIOS HUACCRACUCHO, PURUCHACA Y COLCAQUI PROGRESIVAS KM 0+00, KM 1+600 Y KM 14+240, DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL MARIÑO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/. 3,642,238.00	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	VIABLE	07/11/2013	05/08/2014	2555	2250645
29	251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 3,577,155.00	SANEAMIENTO	VIABLE	22/02/2013	19/03/2013	497	2168168
	281364	CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHARAZO SOBRE LA CARRETERA PALPACACHI - COLLAURO - COYLLURQUI DISTRITO COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	2615315	TRANSPORTE	EN FORMULACION	09/12/2013		8118	2194159

30	249633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 2,550,976.00	SANEAMIENTO	VIABLE	30/01/2013	04/02/2013	297	2168177
31	259770	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHACA NAHUIPUCYO , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 2,527,180.00	SANEAMIENTO	VIABLE	10/05/2013	19/06/2013	476	2183848
32	251582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO MACCASPACCA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 2,439,886.00	SANEAMIENTO	VIABLE	22/02/2013	08/04/2013	290	2178728
33	249390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHIHUARQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 2,377,900.00	SANEAMIENTO	VIABLE	29/01/2013	04/02/2013	343	2168158
34	251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 2,141,048.00	SANEAMIENTO	VIABLE	19/02/2013	12/03/2013	256	2168153
35	275116	INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC REGION APURIMAC.	S/. 2,098,373.00	PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	30/09/2013	29/10/2013	404190	2187136
36	249559	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MATECLLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 2,076,795.00	SANEAMIENTO	VIABLE	30/01/2013	04/02/2013	265	2168169
37	259284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE YANACCA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 2,071,534.00	SANEAMIENTO	VIABLE	08/05/2013	19/06/2013	344	2183849
38	249296	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 2,068,140.00	SANEAMIENTO	VIABLE	28/01/2013	06/03/2013	286	2168161
	253753	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE PAMPATAMA BAJA. DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAE, REGION APURIMAC	1971431	AGROPECUARIO	VIABLE	20/03/2013	09/07/2013	1400	2234650
9	251587	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANCA AHUALLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS -	S/. 1,638,081.00	SANEAMIENTO	VIABLE	22/02/2013	19/03/2013	197	2168164

		APURIMAC							
10	249833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICSUPILLO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 1,599,756.00	SANEAMIENTO	VIABLE	04/02/2013	06/03/2013	248	2168165
11	258169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACCAHUA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 1,494,670.00	SANEAMIENTO	VIABLE	26/04/2013	03/06/2013	269	2178734
42	257913	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUMAHUIRE , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 1,372,953.00	SANEAMIENTO	VIABLE	24/04/2013	03/06/2013	275	2178735
43	249338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/. 1,348,836.00	SANEAMIENTO	VIABLE	28/01/2013	04/02/2013	290	2168148
	248904	INSTALACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE INTERNET Y MULTIMEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES DE LLACHUA, BELLAVISTA, CCAPACCASA, HUAYLLAYOC, YURICANCHA, PISACCASA, FUERABAMBA, TAMBULLA, CCASANCCA, RECORD DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - APURIMAC	1279405	COMUNICACIONES	VIABLE	28/01/2013	23/04/2013	2518	2235111
14	264584	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA POBLACION, EN LA REGIÓN APURIMAC	S/. 1,198,168.62	CULTURA Y DEPORTE	VIABLE	06/07/2013	23/08/2013	13118	2184524
45	283035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	S/. 950,238.12	EDUCACIÓN	VIABLE	20/12/2013	14/04/2014	2247	2250789
	261436	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA, REGION APURIMAC	935876	AGROPECUARIA	VIABLE	24/05/2013	09/07/2013	1250	2183495
46	265662	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	S/. 768,576.49	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	01/07/2013	17/07/2013	109653	2183514
	277462	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DE LA MICRORED ANDARAPA, DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE	286500	SALUD	VIABLE	23/10/2013	23/10/2013	6553	2190508

	ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC							
277485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD KAQUIABAMBA DE LA MICRORED PACUCHA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	286500	SALUD	VIABLE	23/10/2013	23/10/2013	2876	2190502



ANEXO 5

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCACIÓN DURANTE EL PERÍODO 2013

N°	PROYECTO	Mes		Año		
		-3	4	1	2	2
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC					X
2	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	X				
3	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	X				
4	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	X				
5	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	X				
6	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	X				
7	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC	X				
8	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	X				
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC					X
10	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	X				
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC		X			
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECCLLA, DISTRITO HUANCARAMA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC					X

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 6

TIEMPO DE FORMULACION Y EVALUACION EN LAS OFICINAS DE ORPI Y OPI AÑO 2013

N°	PROYECTO	ORPI				OPI			
		Mes		Año		Mes		Año	
		-3	6	1	+1	-3	6	1	+1
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC			X					X
2	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
3	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
4	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
5	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
6	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
7	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
8	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	X				X			
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC		X						X
10	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	X				X			
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	X				X			
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECCLLA, DISTRITO HUANCARAMA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC				X				X

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 7

PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO 2014								
N°	COD SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1		" MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DEL RECURSO HIDRICO EN LA SUB CUENCA DEL RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC"	PERFIL	AGROPECUARIA	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 45,000.00	RO
2		" RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE HABITAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS (VICUÑAS) EN LA REGION APURIMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
3		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL PROGRAMA FORESTAL DE LA REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 30,000.00	RO
4		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL DE APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 1,000,000.00	RO
5		MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS DE LA PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	CONTRATA	S/. 10,000.00	RO
6		MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS PRADERAS NATIVAS ALTOANDINAS EN 18 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DE RIO ANTABAMBA - REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 5,000.00	RO
7		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES COMO MECANISMO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA SUB CUENCA DEL RIO APURIMAC - REGION APURIMAC.	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 12,000.00	RO
8		MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DEL AGUA Y EL AMBIENTE CUENCAS DE LA REGION APURIMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
9		RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRICOLAS Y EL AMBIENTE EN CUENCAS DE LA REGION APURIMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
10		RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN CUENCAS DE LA REGION APURIMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
11		MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS FORESTALES NATIVOS EN CUENCAS DE LA REGION APURIMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
12		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA REGION APURIMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
13		RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 5,000.00	RO
14		AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE CHALHUAHUACHO Y PROGRESO DE LA REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU - COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO
15		AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD PARACCAYMAYU DE LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 80,000.00	RO

16	INSTALACION DEL COLISEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	CULTURA Y DEPORTE	ABANCAY	CONTRATA	S/. 70,800.00	RO
17	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA REGION APURIMAC (EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA CON UNA CULTURA DE PAZ EN APURIMAC)	TDR A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD	CULTURA Y DEPORTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 200,000.00	RO
18	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS DISTRITOS DE PROGRESO, HUAYLLATI, CURASCO Y CURPAHUASI- PROVINCIA DE GRAU, APURIMAC	PDT PERFIL Y FACTIBILIDAD	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 260,857.50	RO
19	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS DISTRITOS DE ANTABAMBA, PACHACONAS, LUCRE, CHALHUANCA, TINTAY, JUSTO APU SAHUARAURA, PROVINCIA DE ANTABAMBA Y AYMARAES, APURIMAC	PDT PERFIL Y FACTIBILIDAD	EDUCACION	ANTABAMBA AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 391,286.25	RO
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P N°54046 DE HUAYLLABAMBA, 54075 RAUL UNA CORDERO, 54905 SUR AMERICA DE ILLANYA, 54873 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE DE LIMAPATA, 54904 BANCAPATA, 54036 SEÑOR DE LA EXALTACION Y 54560 DE PACHACHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PDT PERFIL Y FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 65,214.38	RO
21	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P N° 54606 DE TOTORAY, ASMAYACU, OCORURO, 54056 DE LUCMOS Y EL 54020 DE PISONAYPATA DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 65,214.38	RO
22	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P DE TOCSOSAURI N° 902, CHULLAQUICHCCA, SANTA ROSA DE PECCOY N° 903, ACHIBAMBA N° 904, SANTA ROSA DE CUNYACC N° 905 Y HUACCANA N° 954, DISTRITO DE COCHARCAS Y HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 51,910.45	RO
23	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P DEL DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 65,214.38	RO
24	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.I N° 23, N° 132 DE CONCHACOTA, CCRAYHUACHO, HUANACOPAMPA, ESCOHORNO, TAMBOPATA Y HUAYAO EN LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBILLA, CURASCO Y PROGRESO, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 70,000.00	RO
25	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.ES BENJAMIN HERENCIA, DAVID SAMANES OCAMPO, FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TINTAY Y LAS I.ES SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHURAHURA AYMARAES - APURIMAC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	PERFIL	EDUCACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 180,000.00	RO

	EDUCATIVO DE LA I.E WARMACUYAY N° 56106 DE TOTORAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC							
26	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E WARMACUYAY N°56106 DE TOTORAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	PLAN DE TRABAJO PERFIL	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 46,000.00	RO	
27	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E BASICA BEATO PIERRE FRANCOIS 01 DE ABANCAY Y 07 DE CURAHUASI, DISTRITO DE ABANCAY Y CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 32,000.00	RO	
28	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PLAN DE TRABAJO PERFIL FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 90,000.00	RO	
29	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 129,750.00	RO	
30	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO EL ORO, HUACULLO DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC.	PERFIL	EDUCACION	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 9,000.00	RO	
31	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA VICTOR ACOSTA RIOS DE LA COMUNIDAD DE CONCACHA, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 5,000.00	RO	
32	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E FRANCISCO BOLOGNESI DE HUAYO, DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU	PERFIL	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 8,000.00	RO	
33	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 04 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 12,000.00	RO	
34	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 54009 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 10,000.00	RO	
35	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y ARTICULACION DE INSTITUCIONES PARA LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LAS MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA EN LA REGION APURIMAC	TDR PERFIL Y FACTIBILIDAD	PROTECCION SOCIAL	REGIONAL	CONTRATA	S/. 110,000.00	RO	

36	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 7 PROVINCIAS	PERFIL	PROTECCION SOCIAL	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
37	MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN 24 DISTRITOS DE ALTA VULNERABILIDAD EN LA PROVINCIA DDE GRAU, COTABAMBAS, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y ANTABAMBA DE LA REGION APURIMAC	PERFIL	SALUD	REGIONAL	CONTRATA	S/. 433,980.00	RO
38	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS; PS CURANCO, PS CHUÑUHUACHO, PS HUANCARAY, PS PALCAYÑO, PS HUACULLO, PS MUTCANI, PS LLANACOLPPA Y PS SANTA ROSA DE LA MICRO RED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC	PERFIL	SALUD	ANTABAMBA	CONTRATA	S/. 85,816.60	RO
39	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	FACTIBILIDAD	SALUD	ABANCAY	CONTRATA	S/. 386,136.39	RO
40	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE TAMBOBAMBA - REGION APURIMAC	PERFIL Y FACTIBILIDAD	SALUD	COTABAMBAS	CONTRATA	S/. 530,842.00	RO
41	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CATEGORIA I-1 Y I-2 DE LA MICRO RED HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC	PERFIL	SALUD	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 10,000.00	RO
42	MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION DE LA REGION APURIMAC (FAMILIAS APURIMEÑAS SALUDABLES)	PERFIL FACTIBILIDAD	SALUD	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
43	INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA USO DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DEL MEDIO RURAL, EN LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	ENERGIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 35,985.08	RO
44	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 17 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 42,000.00	RO
45	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN CINOC PROVINCIAS DE LA REGION DE APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 42,000.00	RO
46	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO REGION APURIMAC	PLAN DE TRABAJO PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 450,000.00	RO
47	CREACION SERVICIOS PUBLICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARQUES INDUSTRIALES TECNO ECOLOGICOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY ANDAHUAYLAS DE LA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 35,763.60	RO
48	DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES DE DUCTOS EN LA CIUDAD DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS DE LA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	ENERGIA	REGIONAL	CONTRATA	S/. 520,000.00	APP
49	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE CHOCCECANCHA, ANCATIRA, SANTA ROSA, CHULCUISA, CHAMPACCOCHA Y ARGAMA ALTA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 70,000.00	RO
50	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ORO Y EL COBRE EN LA	PERFIL FACTIBIL	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	S/. 250,000.00	RO

	REGION APURIMAC	IDAD						
51	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PAPA NATIVA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	S/. 342,000.00	RO	
52	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SAYWITE ALTA, SAN LUIS ALTO, OCCORURO, CCORIPAMPA, TOTORAY, LA UNION Y 24 DE JUNIO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 363,262.00	RO	
53	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES ASMAYACU, PUMAHUACHO Y QUISCAPATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 52,674.00	RO	
54	CREACION DE LOS CENTROS DE ARTICULACION COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHALHUAHUACHO (COTABAMBAS) DE LA REGION DE APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	S/. 395,886.46	RO	
55	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHINCHEROS Y ANCCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	CHINCHEROS	CONTRATA	S/. 10,500.00	RO	
56	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 23 COMUNIDADES CAMPESINAS DE 14 DOSTROPS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	REGIONAL	CONTRATA	S/. 10,000.00	RO	
57	CONSTRUCCION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHINCHEROS, ABANCAY Y CURAHUASI	TDR PERFIL Y FACTIBILIDAD	ENERGIA	REGIONAL	CONTRATA	S/. 3,600,000.00	APP	
58	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 9 LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE TAMBOBAMBA DEL DISTRITO DE HUANIPACA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	PERFIL	ENERGIA	ABANCAY	CONTRATA	S/. 40,000.00	RO	
59	PROGRAMA DE TURISMO EN LA REGION DE APURIMAC	PLAN DE TRABAJO	TURISMO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 15,000,000.00	RO	
60	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACION DE MIRADORES TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE Y FAUNA (OSOS Y CONDORES) EN EL CAÑON DEL APURIMAC DEL SECTOR TURISTICO DE KIUNALLA - LACCHIRHUAY, DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 65,000.00	RO	
61	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY	PERFIL	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 55,000.00	RO	
62	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO ANDAHUAYLAS LLIUPAPUQUIO SONDOR LAGUNA DE PACUCHA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA	PERFIL FACTIBILIDAD	TURISMO	ANDAHUAYLAS	CONTRATA	S/. 1,000,000.00	RO	

	DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC							
63	SISTEMA HIDRAULICO DE LAS LAGUNAS DE TACCATA DISTRITO LAMBRAMA PROVINCIA ABANCAY	TDR PERFIL Y FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	CONTRATA	S/. 1,000,000.00	RO	
64	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LA REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	PESCA	REGIONAL	CONTRATA	S/. 60,000.00	RO	
65	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION (LADRILLOS Y BLOQUES DE CONCRETO) EN LA REGION APURIMAC	PERFIL	PRODUCTIVO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 56,000.00	RO	
66	INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION, INTERPRETACION, ORIENTACION, DISFRUTE DEL PAISAJE Y ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICOS, ANDENERIAS DE CARAYBAMBA, BAÑOS TERMALES DE PINCAHUACHO, BOSQUE DE TITANCAS, FIESTA MAYOR DEL SEÑOR DE ANIMAS, TEMPLO CHUQUINGA Y TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAMPAMARCA DISTRITOS DE CHALHUANCA, CARAYBAMBA Y COTARUSE DE LA PROVINCIA DE AYMARAE REGION APURIMAC	PDT APROBADO	TURISMO	AYMARAE	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 52,000.00	RO	
67	INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE FORMALIZACION Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS EN LA REGION DE APURIMAC	PLAN DE TRABAJO	MINAS	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 40,000.00	RO	
68	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS ANDINOS: TARWI (LUPINUS MUTABILIS) Y HABA (VICIA FADA) EN LOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	PRODUCTIVO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 53,568.00	RO	
69	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES CON LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ALTERNATIVO DE MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN LAS PROVINCIAS DE GRAU, COTABAMBA Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	GRAU, COTABAMBA Y ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 85,150.76	RO	
70	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO EN LOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	PRODUCTIVO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 42,385.50	RO	
71	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL: TACLLA, CCOCHACCOCHA, TAMBO, YANARICO, CHUCHAUCCASA, TASTAPATA, HUASCARO DEL DISTRITO DE CURASCO, HUAYLLATI, CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 54,542.20	RO	
72	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE CCONIUNU, HUANCAHUANCA, ORNOPAMPA, ERAPAMPA, PUCAPUCA, SECCORO, ANCCOACCO, ILLARACSA, TAHUARAY, CONCHU, UCHURCA Y CACHISAMANA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA,	PDT PERFIL	AGROPECUARIA	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 40,000.00	RO	

		PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC						
73		INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SONCCORI, ERAPATA, SUNTTUMOLLE, CCOCHAPATA, LLAMARUMI, CCOHAPAMPA, MAYHUAYPATA, JAHUAPAMPA, CCOABAMBA, PATIRARA, USAYMA EN LOS DISTRITOS DE VILCABAMBA Y MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PDT PERFIL	AGROPECUARIA	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 41,000.00	RO
74		MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 30,000.00	RO
75	268054	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCLLACCASA - PACCAYPATA - COYLLURQUI - TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBA, REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	INFRAESTRUCTURA	GRAU, COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
76	131923	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ANTABAMBA - HUACULLO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	INFRAESTRUCTURA	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
77	149345	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC	FACTIBILIDAD	INFRAESTRUCTURA	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
78	77723	CONSTRUCCION CARRETERA OSCCOCCA - COTAHUARCA - HUICHIHUA - HUAQUIRCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA Y HUAQUIRCA, PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	INFRAESTRUCTURA	GRAU ANTABAMBA	CONTRATA		RO
79	165454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TALAVERA - HUANCARAY - SAN ANTONIO DE CACHI Y CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	INFRAESTRUCTURA	ANDAHUAYLAS	CONTRATA		RO
80		MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL SUR EN LOS TRAMOS: CARRETERA IZCAHUACA - CHUNCHUMAYO - HUACULLO - HAQUIRA DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES, ANTABAMBA Y COTABAMBA, REGION APURIMAC	PERFIL	INFRAESTRUCTURA	AYMARAES, ANTABAMBA Y COTABAMBA	CONTRATA		RO
81	259821	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CABONERA - HUANIPACA - KIUÑALLA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	INFRAESTRUCTURA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 45,800.00	RO
82		INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHALHUANCA DE LOS DISTRITOS DE CAPAYA, SORAYA, IHUAYLLO Y COLCABAMBA Y CHAPIMARCA EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 90,000.00	RO
83	278911	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCCARO, TAMBOBAMBA, COTABAMBA - APURIMAC	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	COTABAMBA	CONTRATA	S/. 39,200.00	RO

84		MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DE LOS RIOS HUACRACOCHO, PURUCHACA Y COLCAQUI - CANAL MARIÑO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ABANCAY	CONTRATA	S/. 66,930.00	RO
85	172799	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHALHUANCA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAEAS DE LA REGION DE APURIMAC	FACTIBILIDAD	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	AYMARAEAS	CONTRATA	S/. 200,000.00	RO
86		MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LAS I.E.P N° 54271 DE TOTORA, N°54289 DE SANTA ROSA DE ANCCO , N° 54294 DE HUACULLO, N°54292 DE KILCATA, N° 54296 DE SONCCOCCOCHA Y N° 54291 DE YUMIRE DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 38,797.50	RO
87		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P. N°54046 DE HUAYLLABAMBA, N° 54075 RAUL LUNA CORDERO, N°54905 SUR AMERICA DE ILLANYA, N°54873 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 53,238.20	RO
88		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADA: WARMAKUYAY N°56106 DE TOTORAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGION APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 48,338.00	RO
89		MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS INTEGRADA DE LA I.E. EL CARMELO, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY - REGION APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 54,810.00	RO
90		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS BASICOS ESPECIALES CEBE N°01 BEATO PIERRE FRANCOIS JAMET, CEBE N°12 CARMELO DEL DISTRITO DE ABANCAY, CEBE N°07 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, CEBE N° 02 DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, CEBE N° 03 DISTRITO DE SAN JERONIMO Y CEBE N° 13 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY CHINCHERO S Y ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 63,389.50	RO
91		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 54511 DE ASMAYACU, OCORURO, N° 54056 DE LUCMOS, N° 54020 OCCORURO, N° 54606 DE TOTORAY Y N° 54054 DE VACAS, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 46,738.00	RO
92		MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S. BENJAMIN HERENCIAZ, DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LAS I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAEAS - APURIMAC	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 31,423.88	RO
93		MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) EN LAS I.I.EE DE NIVEL PRIMARIO DE LA REGION APURIMAC		EDUCACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO

94	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS IIEE DE NIVEL INICIAL DE LA REGION APURIMAC		EDUCACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
95	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS INSTITUCIONES NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ISTP Y ISPP EN LA REGION APURIMAC		EDUCACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
96	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS CAPITALES DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA GRAU, CHINCHEROS Y COTABAMBAS - REGION APURIMAC		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ANTABAMBA, GRAU, CHINCHEROS Y COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
97	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
98	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL OLFELINATO DIVINA PROVIDENCIA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC		PROTECCION SOCIAL	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
99	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACION EN PROCESO DE INCLUSION EN LA REGION DE APURIMAC		PRODUCTIVO	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
100	INSTALACION DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE MATARA DEL DISTRITO DE HUAQUIRCA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC		PROTECCION SOCIAL	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
101	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
102	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977 CUNYARI DEL DISTRITO DE ANDARAPA, N° 54653 ANYANIZO DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA, N° 5500816 ISCHU ORCCO, N°54494 CCALLO OCCO DEL DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631 CHIQUILLAN DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC		EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA		RO
103	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	2830335	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	S/. 950,238.12	RO

Fuente: Elaboración Propia



ANEXO 8

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS SNIP AÑO 2014

Nº	Código Único/S NIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Situación	Fecha Registro	Ultimo Estudio	Nivel Viabilidad	Fecha Viabilidad	Beneficiarios	Código SIAF
	279110	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE TAMBOMBAMBA DEL DISTRITO DE TAMBOMBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	S/. 66,627,429.00	SALUD	EN FORMULACION	03/01/2014	PERFIL	FACTIBILIDAD		17517	2194676
	302251	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ADECUADO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y LA GESTANTE EN 24 DISTRITOS DE ALTA VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICION CRONICA EN LA REGION APURIMAC	S/. 33,143,922.00	SALUD	EN FORMULACION	21/08/2014	FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD		24034	2262860
	293572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P 54046, I.E.P 54905, I.E.P 54873, I.E.P 54560, I.E.P 54041 DEL DISTRITO DE ABANCAY Y LAS I.E.P 54036, I.E.P 54075 DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	S/. 19,939,594.00	EDUCACION	EN FORMULACION	29/04/2014	FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD		6564	
	310967	INSTALACION FORESTAL PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DEL SUELO, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO Y PROGRESO DE LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	S/. 17,532,728.00	AMBIENTE	EN FORMULACION	29/12/2014	PERFIL	FACTIBILIDAD		14129	
5	292675	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 16,932,815.00	SANEAMIENTO	VIABLE	16/04/2014	PERFIL	PERFIL	12/06/2015	4159	2272942
	291687	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOBUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	S/. 14,149,587.00	SALUD	EN EVALUACION	07/04/2014	PERFIL	PERFIL		2814	2195021
	297102	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	S/. 8,836,922.00	CULTURA Y DEPORTE	VIABLE	11/06/2014	PERFIL	PERFIL	27/08/2015	5673	2264795
8	308015	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAEAS -	S/. 8,678,505.00	EDUCACION	VIABLE	20/11/2014	PERFIL	PERFIL	14/12/2015	1847	2302886

		APURÍMAC										
	291377	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA DEL RÍO ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC	S/. 4,503,276.00	AMBIENTE	VIABLE	01/04/2014	PERFIL	PERFIL	26/11/2014	16294	2251022	
1	291989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC	S/. 4,211,160.00	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	VIABLE	09/04/2014	PERFIL	PERFIL	13/07/2016	1150	2278805	
1	288201	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HACIENDA PAMPA, TROJA, MOYOC, SAN FRANCISCO, SAN PEDRO, SANTA ISABEL, QUISCAPATA, HUARA QASA, PUNCUTUY DE LA COMUNIDAD DE TAMBOBAMBA DISTRITO DE ABANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY- APURIMAC	S/. 1,021,964.05	ENERGÍA	VIABLE	28/03/2014	PERFIL	PERFIL	18/09/2014	110	2250942	
1	311015	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CEBE N°07 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, CEBE N°02 DEL DISTRITO ANDAHUAYLAS, CEBE SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, CEBE N° 13 DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, CEBE URIPA DEL DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO, APURIMAC	S/. 1,964,705.00	EDUCACIÓN	VIABLE	18/02/2014	PERFIL	PERFIL	01/09/2016	163		
1	283035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	S/. 950,238.12	EDUCACIÓN	VIABLE	20/12/2013	PERFIL	PERFIL	14/04/2014	2247	2250789	
1	250390	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC	S/. 7,020,328.00	EDUCACIÓN	VIABLE	08/02/2013	PERFIL	PERFIL	24/09/2015	965		
1	246474	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LAS IEP N54271 DE TOTORA, N54289 DE SANTA ROSA DE ANCCO, N54294 DE HUACULLO, N54292 DE KILCATA, N54295 DE SONCCOCCOCHA Y N54291 DE YUMIRE DEL DISTRITO OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -APURIMAC	S/. 9,713,015.00	EDUCACIÓN	FORMULACIÓN	29/12/2012	PERFIL	PERFIL		4,129		

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
 EDUCATIVO DE LAS I.E.S
 AYAHUAY DEL DISTRITO EL
 ORO, SAN JUAN BAUTISTA DE
 LA SALLE DEL DISTRITO DE
 OROPESA, GIRALDO
 CONTRERAS TRUJILLO DEL
 DISTRITO DE ANTABAMBA Y
 ANTONIO RAYMONDI DEL
 DISTRITO DE PACHACONAS DE
 LA , PROVINCIA DE ANTABAMBA
 - APURIMAC

16,440,494.00

S/. EDUCAC
 IÓN

VIABLE

25/12/2013

PERFIL

PERFIL

23/03/201
 6

5,171

16 : 250205

fu : Banco de proyectos del SNIP



ANEXO 9

TIEMPO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR EDUCACION AÑO 2014

N°	PROYECTO	Mes		Año		
		-3	4	1	2	2+
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P 54046, I.E.P 54905, I.E.P 54873, I.E.P 54560, I.E.P 54041 DEL DISTRITO DE ABANCAY Y LAS I.E.P 54036, I.E.P 54075 DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC					X
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURÍMAC					X
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC			X		
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC		X			
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC					X
6	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LAS IEP N54271 DE TOTORA, N54289 DE SANTA ROSA DE ANCCO, N54294 DE HUACULLO, N54292 DE KILCATA, N54295 DE SONCCOCCOCHA Y N54291 DE YUMIRE DEL DISTRITO OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC					X
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S AYAHUAY DEL DISTRITO EL ORO, SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS DE LA , PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC					X

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 10

TIEMPO RETENIDO DE LOS PROYECTOS EN LAS OFICINAS DE ORPI Y OPI

N°	PROYECTO	ORPI				OPI				
		Mes		Año		Mes		Año		
		-3	6	1	+1	-3	6	1	+1	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.P 54046, I.E.P 54905, I.E.P 54873, I.E.P 54560, I.E.P 54041 DEL DISTRITO DE ABANCAY Y LAS I.E.P 54036, I.E.P 54075 DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC				X	X				
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURÍMAC				X	X				
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC				x	x				
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	x				x				
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201 MARQUECCA, DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC				x	x				
6	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LAS IEP N54271 DE TOTORA, N54289 DE SANTA ROSA DE ANCCO, N54294 DE HUACULLO, N54292 DE KILCATA, N54295 DE SONCCOCCOCHA Y N54291 DE YUMIRE DEL DISTRITO OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA -APURIMAC	x				x				
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S AYAHUAY DEL DISTRITO EL ORO, SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS DE LA , PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC				x	x				

Fuente: Elaboración propia

PROYECTOS PRIORIZADOS, 2013





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° -2013-GRAP/11/GRDS.

PARA : Med. José Lizárraga Trujillo
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 13 de Febrero del 2013.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo, así mismo, para informarle que previa reunión sostenida con la Oficina Regional de Pre Inversión y Gerencia Regional de Desarrollo Social se realizó la priorización de la CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AÑO LECTIVO 2013, para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta cuadro de priorización de proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Oficina Regional de Pre Inversión
[Signature]
Ing. Juan Ciferri Salceda
DIRECTOR REGIONAL DE PRE INVERSION

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

FECHA: 20 / 02 / 2013 EXP: 350

PROVEIDO ADMINISTRATIVO

Ing. María Leticia José Antonio
CHMG/GRDS
e Ing. Alain C. informan a los
coordinadores de la gerencia para dar
inicio con la formulación

FECHA: 21 / 02 / 2013

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

FECHA: 18 / 02 / 2013 EXP: 423

PROVEIDO GERENCIAL

PARA OPPI
Aprobación de la cartera
de proyectos

FECHA: 20 / 02 / 2013



N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIO	ESTUDIO
1	250282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	S/. 11,415,960.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
2	250390	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEI 665 COLLAURO, 670 RATCAY, 207 MOLLEPIÑA, 024 CURPAHUASI, 196 CCOTRO, 112 CHAPIMARCA, 201 MARQUECCA, DISTRITOS DE GAMARRA, CURPAHUASI Y CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,640,339.00	EDUCACIÓN	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
3	251914	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO: IE. N54030 VIRGEN DEL CARMEN, DE HUANIPACA, IE. N. 54072 SAN JUAN DE LIMANQUI, IE. N. 54070 DE PACOBAMBA, IE. N 54466 RICARDO PALMA DE KIUÑALLA, DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,256,395.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
4	246479	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CATEGORIAS I-1 Y I-2 DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC	S/. 17,619,725.00	SALUD	EN FORMULACION	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
5	236688	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA FUERABAMBA, DE LOS NIVELES PRIMARIA N50651 Y SECUNDARIA, EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	S/. 32,534,957.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL PDT FACTIBILIDAD



6	166718	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO. 775 ANTAPUNCO, NO. 772 BELLAVISTA, NO. 713 CCOCHA, NO. 717 HAPUPAMPA, NO. 771 HUANCACALLE GRANDE, NO. 777 HATUNRUMIYOC, NO. 179 HUANCASCA, NO. 714 LLAC-HUA Y NO. 752 PATAN DEL DISTRITO DE HAQUIRA. PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC	S/. 13,114,356.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
7	248284	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE EDUCATIVO DE LAS I.E.I 329 PAMPAHURA, 353 MATECLLA, 937 LAMBRASPATA, 938 HUACCAYURA, 198 TAMBO, 039 SANTA ANA, 143 LLACTABAMBA, I.E.I.SAYHUA DEL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC	S/. 11,286,223.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
8	266905	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,999,223.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
9	275220	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,970,503.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
10	242614	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N°54654 CHIHUARQUE, I.E.P N°54086 TAMBO, I.E.P N°54710 LLACTABAMBA, I.E.P N°54475 SOCCORO, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y LA I.E.P N°54663 SALLAC, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	S/. 9,961,519.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL



11	275005	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,949,602.00	EDUCACIÓN	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
12	246694	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,853,198.00	EDUCACIÓN	AYMARAES ANTABAMBA Y GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
13	242613	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA EN LA COMUNIDAD DE SOTAPA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	S/. 8,120,263.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
14	246585	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES DIVINO MAESTRO DE MATAPUQUIO Y JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	S/. 7,506,753.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
15	278163	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	S/. 6,664,225.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
16	165243	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54018 RAMÓN CASTILLA DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	S/. 5,890,002.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL



17	175039	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC	S/. 5,514,913.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
18	225675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	S/. 5,169,848.00	EDUCACIÓN	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL





INFORME N° 30 -2013-GRAP/GRDE – UF.

PARA : Ing. Samuel Isaac Niño de Guzmán Ríos
SUB GERENTE DE MYPES Y COMPETITIVIDAD

ASUNTO : **PRIORIZACION DE PROYECTO**

FECHA : **Abancay, 29 de Marzo del 2013.**

Por el presente, me es grato dirigirme a Ud. Para alcanzar a su despacho la priorización y continuidad del proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DE L DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY"** CODIGO SNIP 253698, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta cuadro de priorización de proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

C.c. ORPI
SGAPS
Archivo



INFORME N° 65 -2013-GRAP/GRDE – SGMYC.


PARA : Ing. Zenón Warthon Campana
ECONÓMICO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ASUNTO : REMITO DOCUMENTO PARA SU CONOCIMIENTO
REF. : INFORME N° 65 -2013-GRAP/GRDE – UF.
FECHA : Abancay, 03 de Abril del 2013.

Por el presente, me es grato dirigirme a Ud. Para alcanzar a su despacho la priorización y continuidad del proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAYWITE DE L DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY"** CODIGO SNIP 253698, en coordinación con la ORPI – SGMYC – SGAPS-responsable de la unidad formuladora en la GRDE. El mismo que debe ser validado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

C.c. ORPI
SGAPS
Archivo





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
 AMBIENTE



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 031-2013-GRAP/12/GRRNGMA

PARA : Med. José Lizárraga Trujillo
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 30 de Enero del 2013.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo remitirle el **CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS**, para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta cuadro de priorización de proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente

Atentamente,

OFICINA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
 Unión Warthon Campana
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 GERENCIA GENERAL

FECHA: 02/02/2013 y 423

PROCESO GERENCIAL

PARA: OPPI
 DAR ATENCION



PRIORIZACION DE PROYECTOS 2013 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

N°	CODIGO SNA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIO	ESTUDIO
1	159662	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA URIPA - CHINCHEROS	S/. 17,510,189.00	AGROPECUARIA	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	POT FACTIBILID.
2	246512	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAE - REGION APURIMAC	S/. 9,996,624.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAE	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
3	242498	MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC	S/. 9,987,691.00	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
4	229035	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURIMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBA Y GRAU - REGION APURIMAC	S/. 9,968,174.00	MEDIO AMBIENTE	COTABAMBA GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
5	246533	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAE - REGION APURIMAC	S/. 9,966,009.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAE	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
6	246502	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAD Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC	S/. 9,926,684.00	MEDIO AMBIENTE	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
7	159653	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA PACUCHA	S/. 9,764,242.00	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
8	258979	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES CHICUCORRAL, BARROBAMBA, HUATURO, HUALLPAHUASI, PATACHACRA, MOYOPATA, DESAGUE, ÑAHUI, PALTAYHUAYCCO, INCAHUASI, PATAPATA, CONDORCUNCA, ALGOONPAMPA, VICAUONCCO, CHACAPAMPA Y ACCOPAMPA DE LA COMUNIDAD DE COTARMA DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	S/. 4,712,211.00	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
9	196956	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU - APURIMAC	S/. 3,950,007.00	AGROPECUARIA	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"



MEMORANDO Nº 1053 -2013-GR-APURIMAC-13-GRI.

PARA : Ing. Juan Cisneros Sulcahuaman
DIRECTOR REGIONAL DE PRE INVERSION.

ASUNTO : **PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

REF. : **INFORME Nº 226 -2013-GR.APURIMAC-GG/DRPI.**

FECHA : **Abancay, 28 de junio del 2013.**

Por el presente, me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de remitirle mediante el presente, la priorización de los proyectos de inversión pública de la función de transportes, para la viabilización de perfiles de acuerdo al documento de referencia según cuadro resumen:

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO
268054	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCLLACCASA-PACCAYPATA-COYLLURQUI-TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC
	CONSTRUCCION DEL AERÓDROMO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
273234	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUAMANAIRE - CUNCACC - LAMBRASPATA - CCOCHA QUISCAPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
250253	MEJORAMIENTO CARRET.DEPART. :INTERSECCION STA.MARIA DE CHICMO DV.HUACCANA-PISCOBAMBA-OCABAMBA-ONGOY-HUACCANA-CHINCHEROS/NUEVA ESPERANZA-URANMARCA-MUÑAPUCRO-COCHARCAS-SAÑOCC-MIRAFLORES/TOTORABAMBA-DV.URANMARCA Y DV.COCHARCAS/DV.CHINCHEROS Y DV.CAYARA-CHALLHUANI/HUA -PTE.RIO PAMPAS/MOYACCASA-CURAMPA-HAC. PULCAY-RIO PAMPAS, PROV. ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - APURIMAC
250050	MEJORAMIENTO DE LA CARRET. DEPARTAMENTAL: SANTA ROSA-MOCCHOCCO-SOJO-MASOPAMPA-PTE. AMARU-HUANCAPAMPA-PISCOYA- PTE. TURISA-MATARA-ANTABAMBA/DV. CARAYBAMBA-CARAYBAMBA-YANAQUILCA-MOLLEBAMBA-ABRA KCOELLO-ANTABAMBA/SANTA ROSA-SANTIAGO-ANCOBAMBA/CHALHUANCA-YANACA- SARAICA/SOCOSANI-SARAICA-CHANTA-POCOHUANCA/HUANCAPAMPA-MISCAPATA-AYAHUAY-PACHACONAS, PROV. DE AYMARAES Y ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
249960	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: DV. LAMBAMA - LAGUNA TACCAJA - PTE. MOLINO - JUQUI - PALPACACHI - LLAULLIPATA - HACIENDA COLLAURO - PTE. MATALLA - PFACO / DV. RAMAL JUQUI - TARIBAMBA - PICHIBAMBA - SARCONTA - PACCAYPATA - OLLABAMBA - PTE. AMARUYOC - - PFACO / PTE. MATALLA - VILCARO - MANASQUI - HUAYLLATI - DV. PALCA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
249499	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: DV. CHUQUIBAMBILLA - CHIRIRQUI - PATAYPAMPA - PIYAY - SAN JUAN DE VIRUNDO - TURPAY - TOTORA OROPESA - MAMARA - SAN ANTONIO - Miska - AYRIHUANCA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
250156	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: COYLLURQUI - CHAHUAY - ÑAHUINLLA - PAMPUTA - DV. CHALCOBAMBA - FUERABAMBA - FERROBAMBA - DV. CHALLHUAHUACHO / PFACO - PALLPARO - COYLLURQUI - ABRA LLAMALLUPA - COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Jr. Puno 107
Abancay-Apurimac-Perú

Teléfonos: (083) 32-2936
Email: ginfraestructura@regionapurimac.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

250004	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: HUANCABAMBA - LAG. SUYTUCCOCHA - CAIHUACHAHUA - LUCRE - TINTAY - PTE. PAMPATAMA / DV. SAÑAYCA - SAÑAYCA - TOROHUISCCANA - AYAPAMPA, PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
249968	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CASINCHIHUA - PICHIRHUA - ATUMPATA - CALLUNHUACHO - CHARAURO - CHALHUANI - HACIENDA CAROLINA - CASINCHIHUA / CASINCHIHUA - CHACOCHO - ANCHICHA / PTE. YACA - OCOBAMBA - CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
250224	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: PTE. ISURAY - CONGOTA - PISACCASA - MARA / MARA - DV. COCHA - HAQUIRA / HAQUIRA - DV. MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
250130	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: CHAMPACCOCHA - ARGAMA - MITUPAMPA - TOCTOPATA - QUILLABAMBA - SOTCCOMAYO - MATAPUQUIO - DV. MATAPUQUIO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
250149	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: PTE. ANTARUMI - TAQUEBAMBA - SAN MATEO - SAN JUAN DE CHACÑA - TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
161966	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC
251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
241728	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CONCACHA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
241748	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
241739	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA UMUYTO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
197458	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY - MANA ATISCCA - PATY , DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
141967	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE CCOSAMA – HUANCA (UMUYTO) – HATUNRUMIYOC - PISCOKALLA – CHICURUMI - EMPALME RUTA AP 111 (PALLALLIPAMPA), DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC

Jr. Puno 107
Abancay-Apurímac-Perú

Teléfonos: (083) 32-2936
Email: ginfraestructura@regionapurimac.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



'Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria'

241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
249633	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE KARHUACAHUA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
259770	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PICHACA NAHUIPUCYO , DISTRITO DE TAMBOMBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC
251582	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMBO MACCASPACCA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
241733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAY, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC
249390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHIHUARQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
241740	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
251236	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
241746	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
249559	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MATECLLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
259284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DE YANACCA , DISTRITO DE TAMBOMBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC
249296	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HAPURO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
241751	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO ORCCO, DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC
241741	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUEUNAPAMPA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
242793	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAMBRASPATA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
242806	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUAHUACHO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
251587	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHUANCA AHUALLA , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Jr. Puno 107
Abancay-Apurimac-Perú

Teléfonos: (083) 32-2936
Email: ginfraestructura@regionapurimac.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Partido de la Inversión Pública, el Ambiente y la Seguridad Alimentaria



242099	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA SAN JOSE , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
249833	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUICSUPILLO , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
242084	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCOCHA DESPENSA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC
258169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE OCCACAHUA , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC
241747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CCORIPAMPA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
241752	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAYWITE ALTO , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC
257913	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUMAHUIRE , DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC
249338	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AHUANUQUE , DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
172635	CONSTRUCCION DE PUENTE PEAFONAL HUAYO, ENTRE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC
253738	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL TINCOCC DE LA COMUNIDAD DE POCCANCCA, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 Gerencia Regional de Infraestructura
 Ing. Robinson Palacios Moreano
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
 Archivo

FECHA: 24.06.2013 EXP.: 1208

FECHA: 28.1.06.2013 EXP.: 728

PROVEIDO GERENCIAL
 PARA ORPI
 Devolver y dar atención



PROVEIDO ADMINISTRATIVO

Ing. Blain Revisa y da
 autorización e indicar.

FECHA: 30.06.2013

Jr. Puno 107 Abancay Apurímac Perú
 Teléfonos: (083) 32-2936
 Email: infraestructura@regionapurimac.gob.pe
 FECHA: 09.07.2013 ORPI





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Año de la Inversión por el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria



INFORME N° 326 -2013-GRAP/11/GRDS.

PARA : Ing. Juan Cisneros Sulcahuaman
DIRECTOR REGIONAL DE PRE INVERSION.

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 03 de Julio del 2013.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo, así mismo, para informarle que previa reunión sostenida con la Oficina Regional de Pre Inversión y Gerencia Regional de Desarrollo Social se realizó la priorización de la CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AÑO LECTIVO 2013, para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO
264750	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LA REGION APURIMAC
258253	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION GRAU PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC
266325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS OFERTADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION APURIMAC, REGION APURIMAC
275116	INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PIP EN EL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC REGION APURIMAC.
242457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA REGION DE APURIMAC
265662	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC
236239	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA - REGION APURIMAC

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
Prof. Abel Chuqui Niño de Guzmán
GERENT
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

C.c. ORPI
Archivo
CHMG/GRDS

FECHA: 09 / 07 / 2013 EXP: 111

PROVEIDO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO SOCIAL
Secretaría indicar que para aprobación

Jr. Puno 107 Abancay. Seguimos creciendo a aprobación de Gerencia
Teléfonos: directo (083)32-4084 central (083) 32 1022 anexo 140 FAX (083) 32-4084
grds@regionapurimac.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO
 AMBIENTE



Área de Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

INFORME N° 124 -2013-GRAP/12/GRRNGMA

PARA : Med. José Lizárraga Trujillo
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 21 de Junio del 2013.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo remitirle el **CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS**, para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta cuadro de priorización de proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 Oficina Regional de Recursos Naturales
 y Gestión del Medio Ambiente
 Zenon Warthon Campana
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 GERENCIA GENERAL

FECHA: 09/06/2013 EXP: 923

PROVEIDO GERENCIAL

PARA ORPI
 para su atención y priorización
 respectiva.

FECHA: / /

GERENTE GENERAL



PRIORIZACION DE PROYECTOS 2013 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

N°	CODIGO SROP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIO	ESTUDIO
1	159624	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA CHUMBAB - MARGEN DQUEIRDA	S/. 49.961.147.00	AGROPECUARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL POT FACTIBILIDAD
2	159651	SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA HUANCARAY	S/. 23.257.584.00	AGROPECUARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	POT FACTIBILIDAD
3	246513	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTIA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC	S/. 9.994.688.00	MEDIO AMBIENTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
4	246503	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC	S/. 9.992.028.00	MEDIO AMBIENTE	AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
5	228352	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	S/. 9.980.846.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
6	228010	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	S/. 9.972.892.00	MEDIO AMBIENTE	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
7	240841	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGION APURIMAC	S/. 9.962.954.00	MEDIO AMBIENTE	CHINCHEROS	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL
8	227993	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMILLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC	S/. 9.948.105.00	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	POT PERFIL



9	246545	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHÉ Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9.924.361.00	MEDIO AMBIENTE	ABANCAY	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PDT PERFIL
10	246674	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9.920.147.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PDT PERFIL
11	246496	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9.907.550.00	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PDT PERFIL
12	246548	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DROPEZA Y TRAPICHE DE LA PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9.803.667.00	MEDIO AMBIENTE	GRAU Y ANTABAMBA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PDT PERFIL





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria



INFORME N° -2013-GRAP/11/GRDS.

PARA : Med. José Lizárraga Trujillo
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 29 de agosto del 2013.

Es grato dirigirme a su despacho con la finalidad de saludarlo, así mismo, para informarle que previa reunión sostenida con la Oficina Regional de Pre Inversión y Gerencia Regional de Desarrollo Social se realizó la priorización de la CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AÑO LECTIVO 2013, para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta cuadro de priorización de proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

~~GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC~~
~~Prof. Mikhail Chumacero de Guzmán~~
~~GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL~~

C.c. ORPI
Archivo
CHMG/GRDS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA GENERAL

FECHA: 29.1.08.2013 EXP. 1128

PROVEIDO GERENCIAL

Ing. María Luisa Pava
información de priorización
y dar respuesta.

02/09/2013



N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	GOSTO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIO	ESTUDIO
1	250282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	S/. 11,122,121.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
2	250205	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO EL ORO, HUACULLO DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC.	S/. 15,309,721.00	EDUCACIÓN	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
3	251986	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECCLLA, DISTRITO HUANCARAMA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC	S/. 13,156,894.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
4	259303	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,912,593.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL




5	266491	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,897,742.00	EDUCACIÓN	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
6	173227	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IE. INICIALES 770 YERBABUENAYOC, 764 CHAHUAY, 768 PATAHUASI, 767 SIJAHUI, 763 PALLPARO, 950 SORCCO, 766 YADQUIRI Y 191 ACPITAN, DISTRITO DE COYLLURQUI, COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC.	S/. 9,891,931.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
7	257027	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELS ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC	S/. 9,876,353.00	EDUCACIÓN	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
8	236629	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 756 FUERABAMBA - JARDÍN, EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	S/. 4,940,448.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
9	236541	CREACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL FUERABAMBA - CUNA, EN EL CENTRO POBLADO NUEVA FUERABAMBA, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	S/. 4,619,704.00	EDUCACIÓN	COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL
10	264584	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LA POBLACION, EN LA REGIÓN APURIMAC	S/. 1,198,168.62	CULTURA Y DEPORTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	PDT PERFIL



**FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



Fecha de la última actualización: **22/07/2016**

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 250282

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	22 EDUCACIÓN
División Funcional	047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	EDUCACION

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	ABANCAY

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre:	OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
Persona Responsable de Formular:	ANGHINETH CONTERAS B. GUIDO CONTRERAS S. FLABIO MENDOZA U.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	CARLOS RENATO POBLETE ZEGARRA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Nombre:	REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	MG. WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación



PROYECTOS PRIORIZADOS, 2014





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



INFORME N° 033-2014-GRAP/12/GRRNGMA

A : Med. José Lizárraga Trujillo
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

FECHA : Abancay, 23 de Enero del 2014.

Es muy grato dirigirme a su Despacho, con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo remitirle el **CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS** para la formulación de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversión, en tal sentido solicito a su despacho su aprobación y tramite correspondiente.

Se adjunta Cuadro de Priorización de Proyectos.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención y fines que vea por conveniente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Baléw Javier Boluarte Silva
GERENTE REGIONAL

23 ENE 2014
02 febrero

0176

23 ENE. 2014

ORPI
Para su atención y
cierre de



PRIORIZACION DE PROYECTOS 2014 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

N°	COD SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
1	S/C	"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUB CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA – REGIÓN APURÍMAC".	PERFIL	AGROPECUARIA	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	45.000,00	RO	EN PROCESO DE FORMULACION
2	S/C	"RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE HABITAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS (VICUÑAS) EN LA REGION APURIMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	80.000,00	RO	EN IDEA
3	241271	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PROGRAMA FORESTAL DE LA REGIÓN APURÍMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	DGPI	30.000,00	RO	EN FORMULACION
4	S/C	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE APURÍMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	DGPI	1.000.000,00	RO	ELABORACION DE PDT
5	261218	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	DGPI	10.000,00	RO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES UF ORPI
6	S/C	"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PRADERAS NATIVAS ALTOANDINAS EN 18 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DEL RIO ANTABAMBA – REG. APURÍMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	5.000,00	RO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
7	S/C	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES COMO MECANISMO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SUB CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	12.000,00	RO	EN FORMULACION
8	S/C	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Y EL AMBIENTE EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
9	S/C	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS Y EL AMBIENTE EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
10	S/C	RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
11	S/C	MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NATIVOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
12	S/C	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN APURÍMAC.	PDT PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
13	268170	"RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC".	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	5.000,00	RO	SE ENTREGO OBSERVACIONES Y ESTA EN EVALUACION
14	S/C	AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE CHALHUAHUACHO Y PROGOTRESO DE LA REGION APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU - COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	GRRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
15	S/C	AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD PARACCAYMAYU DE LA PROVINCIA DE GRAU -APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	GRRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP

GRRNN
FORMULA A
TODO COSTO
GRRNN
FORMULA A
TODO COSTO

GRRNN
FORMULA A
TODO COSTO





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



INFORME N° 060 -2013-GRAP/11/GRDS

AL : MÉD. JOSÉ LIZÁRRAGA TRUJILLO
GERENTE GENERAL REGIONAL.

ASUNTO : INFORME DE PROYECTOS EN CONTINUIDAD

FECHA : Abancay, 25 de Febrero del 2014.

Me dirijo a usted para informar lo siguiente:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente; asimismo, para informarle que previa reunión sostenida con la Oficina Regional de Pre Inversión, Gerencia Regional de Desarrollo Social se realizó la priorización de la **CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AÑO LECTIVO 2014**, la misma que adjunto al presente para su conocimiento y así continuar con las acciones de trabajos acordados.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Dr. Carlos Monteagudo Gonzales
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
Fecha: 26 FEB 2014 Exp. 524
Hoja 01 folio
PROVEIDO ADMINISTRATIVO
Gerente General
Fecha: 28 FEB 14

C.c. ORPI
Archivo
CHMG/GRDS
Roxana R.

Jr. Puno 107 Abancay-Apurímac
Teléfonos: Directo (083) 32-4084 Central (083) 32-1022 anexo 140 FAX (083)32-4084
grds@regionapurimac.gob.pe



N°	COD SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
8	S/C	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.P. DEL DISTRITO PACOBAMBA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"	PDT PERFIL PERFIL PDT FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDS	65.214,38	RO
9	S/C	PERFIL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.I. N° 23, N° 132 DE CONCHACOTA, CCARAYHUACHO, HUANACOPAMPA, ESCOHORNO, TAMBOPATA Y HUAYAO EN LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBILLA, CURASCO Y PROGRESO, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC"	PDT PERFIL PERFIL	EDUCACION	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	70.000,00	RO
10	203547	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES BENJAMIN HERENCIA, DAVID SAMANEZ OCAMPOS, FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TINTAY Y LAS IES SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHURAHURA, AYMARAES - APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	REGIONAL	CONTRATA	GRDS	180.000,00	RO
11	S/C	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. WARMAKUYAY N° 56106 DE TOTORAL, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO ROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	Plan de Trabajo PERFIL	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDS	46.000,00	RO
12	S/C	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.BASICA BEATO PIERRE FRANCOIS 01 DE ABANCAY Y 07 DE CURAHUASI, DISTRITOS DE ABANCAY Y CURAHUASI; PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDS	32.000,00	RO
13	151115	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	Plan de Trabajo PERFIL FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	ALTA DIRECCION	90.000,00	RO
14	167720	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA , DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	EDUCACION	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDS	129.750,00	RO
15	250205	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO EL ORO, HUACULLO DEL DISTRITO DE OROPESA, GIRALDO CONTRERAS TRUJILLO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA Y ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC".	PERFIL	EDUCACION	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	9.000,00	RO



N°	COD SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
23	S/C	PERFIL : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS EE.SS; PS CURANCO,PS CHUÑUHUACHO, PS HUANCARAY, PS PALCAYÑO, PS HUACULLO, PS MUTCANI, PS LLANACCOLLPA Y PS SANTA ROSA DE LA MICRO RED ANTABAMBA. PROVINCIA DE ANTABAMBA. REGION APURIMAC	PERFIL	SALUD	ANTABAMBA	CONTRATA	ORPI	85.816,60	RO
24	146493	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	FACTIBILIDAD	SALUD	ABANCAY	CONTRATA	ORPI	386.136,39	RO
25	S/C	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE TAMBOBAMBA - REGION DE APURIMAC.	PERFIL Y FACTIBILIDAD	SALUD	COTABAMBAS	CONTRATA	ORPI	530.842,00	RO
26	246479	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CATEGORÍA 1-1 Y 1-2 DE LA MICRO RED HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS-REGION APURIMAC"	PERFIL	SALUD	COTABAMBAS	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	10.000,00	RO
27	S/C	MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN APURIMAC (FAMILIAS APURIMEÑAS SALUDABLES)	PERFIL FACTIBILIDAD	SALUD	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDS		RO
								2.131.774,99	
TOTAL								21.241.254,67	





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 001-2014-GRAP/12/GRRNGMA


A : Ing. Karen Priscilla Portocarrero Messa
Oficina Regional de Pre Inversión

ASUNTO : PRIORIZACION DE PROYECTO.

FECHA : Abancay, 31 de Marzo del 2014

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la priorización del Proyecto: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC", código SNIP: 268170, para su aprobación.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Baliew Javier Boluarte Silva
GERENTE REGIONAL

c.c.:
Archivo.

Jr Puno N° 107 2do. Piso
Abancay - Apurímac

Telefax: (083) 321174 Central (083) 321022 anexo 156
grrngma@regionapurimac.gob.pe



PRORIZACION DE PROYECTOS 2014 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

N°	COD SWP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
1	S/C	"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUB CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA – REGIÓN APURÍMAC"	PERFIL	AGROPECUARIA	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	45.000,00	RO	EN PROCESO DE FORMULACION
2	S/C	"RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE HABITAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS (VICUÑAS) EN LA REGION APURIMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	80.000,00	RO	EN PROCESO
3	241271	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PROGRAMA FORESTAL DE LA REGIÓN APURÍMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	DGPI	30.000,00	RO	EN FORMULACION
4	S/C	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE APURÍMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	DGPI	1.000.000,00	RO	ELABORACION DE PDI
5	26123B	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	DGPI	10.000,00	RO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES UP ORPI
6	S/C	"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PRADERAS NATIVAS ALTOANDINAS EN 18 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA – REG. APURÍMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	5.000,00	RO	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
7	S/C	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES COMO MECANISMO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SUB CUENCA DEL RÍO ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	12.000,90	RO	EN FORMULACION
8	S/C	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Y EL AMBIENTE EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDI PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
9	S/C	RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRICOLAS Y EL AMBIENTE EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDI PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
10	S/C	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDI PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
11	S/C	MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NATIVOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN APURÍMAC	PDI PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
12	S/C	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN APURÍMAC	PDI PERFIL	MEDIO AMBIENTE	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	RRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
13	268170	"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC"	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	5.000,00	RO	SE ENTREGO OBSERVACIONES Y ESTA EN EVALUACION
14	S/C	AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LOS DISTRITOS DE CHALHUAHUACHO Y PROGRESO DE LA REGIÓN APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU - COTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	GRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP
15	S/C	AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA MANCOMUNIDAD PARACAYMAYU DE LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	PERFIL	MEDIO AMBIENTE	GRAU	ADMINISTRACION DIRECTA	GRNN	80.000,00	RO	IDEA DE PIP

GRNN
FORMULA A TODO COSTO
GRNN
FORMULA A TODO COSTO

GRNN
FORMULA A TODO COSTO

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Baltov Javier Boluarte Silva
GERENTE REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático



Informe N° 35-2014-GRAP/GRDE-UF

AL :Ing. Rodolfo VISAGA ALVAREZ
SUB GERENTE DE MYPES Y COMPETITIVIDAD

ASUNTO: PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE-2014

FECHA :Abancay, 31 de Marzo 2014.

Por el presente, me es grato dirigirme a Ud. para alcanzar a su despacho la priorización de proyectos al primer trimestre del año 2014, producto de las reuniones sostenidas entre la ORPI - SGMyc - SGAPS - Responsable de la UF en la GRDE. El mismo que debe ser validado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Es cuanto comunico a Ud para que se sirva determinar lo conveniente

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SGAPS
Ing. Ruyil B. Hurtado Nuñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.c.
Adjunto anexo 1 (cuadro priorización, 02 folios)
SGAPS
Archivo.

31 MAR 2014

284

Pass a GDC
Comunicación 10/11/14



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DESARROLLO ECONOMICO

CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 2014

N°	COD ENP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL ESTUDIO
	SC	"INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA USO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS DEL MEDIO RURAL, EN LAS SIETE (07) PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC"	FACTIBILIDAD	ENERGIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	35 965,00
	141001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 17 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	SR CHANKA	RO	42.000,00
3	S/C	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION DE APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	42.000,00
	SC	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO REGION APURIMAC	PLAN DE TRABAJO PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	450.000,00
	SC	CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARQUES INDUSTRIALES TECNO ECOLOGICOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS DE LA REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	COMERCIO	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	36.763,60
	SC	DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES DE DUCTOS EN LA CIUDAD DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC.	PERFA FACTIBILIDAD	ENERGIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	ALTA DIRECCION	APP	520.000,00
	212745	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE CHOCCECANCHA, ANCATIRA, SANTA ROSA, CHULCUISA, CHAPACCOCHA Y ARGAMA ALTA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	70.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ORO Y EL COBRE EN LA REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	GRDE	RO	250.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PAPA NATIVA REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	GRDE	RO	342.000,00
	SC	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SAYWTE ALTA, SAN LUIS ALTO, OCCORURO, COORIPANPA, TOTORAY, LA UNION Y 24 DE JUNIO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	363.262,00
	SC	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE ASHAYACU, PUMAHUACHO Y QUISCAPATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	62.674,00
	SC	CREACION DE LOS CENTROS DE ARTICULACION COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHALHUHUACHO (COTABAMBA) DE LA REGION DE APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	COMERCIO	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	GRDE	RO	396.886,48
	190181	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHINCHEROS Y ANCCO HUAYLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	CHINCHEROS	CONTRATA	SR CHANKA	RO	10.500,00
14	14.1124	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 23 COMUNIDADES CAMPESINAS DE 14 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	SR CHANKA	RO	10.000,00
	SC	CONSTRUCCION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHINCHEROS, ABANCAY Y CURAHUASI	IDR PERFA FACTIBILIDAD	ENERGIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	DGPI	APP	3.600.000,00
16	S/C	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 9 LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE TAMBOMBAMA DEL DISTRITO DE HUANIPACA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	PERFA FACTIBILIDAD	ENERGIA	ABANCAY	CONTRATA	ORPI	RO	40.000,00
	S/C	PROGRAMA DE TURISMO EN LA REGION DE APURIMAC	PLAN DE TRABAJO	TURISMO	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	15.000.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACION DE MIRADORES TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAYSAJE Y FAUNA (OSOS Y CONDORES) EN EL CAÑON DEL APURIMAC DEL SECTOR TURISTICO DE KUNALLA, LACCHIRHUAY, DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	65.000,00
	SC	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY	PERFA FACTIBILIDAD	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	56.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO ANDAHUAYLAS LILIPAPUJIMO SONDOR LAGUNA DE PACUCHA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC	PERFA FACTIBILIDAD	TURISMO	ANDAHUAYLAS	CONTRATA	DGPI	RO	1.000.000,00
	SC	SISTEMA MORALICO DE LAS LAGUNAS DE TACCATA DISTRITO LAJIBRAMA PROVINCIA ABANCAY	IDR PERFA FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	CONTRATA	GRDE	RO	1.000.000,00
22	254750	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LA REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	PESCA	REGIONAL	CONTRATA	ORPI	RO	60.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION (LADRILLOS Y BLOQUES DE CONCRETO) EN LA REGION APURIMAC	PERFIL	TRANSFORMACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	56.000,00
	SC	INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION INTERPRETACION ORIENTACION, DISFRUTE DE PAYSAJE Y ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICOS ANDENIERAS DE CARAYAMBIA, BAÑOS TERMALES DE PUMAHUACHO, BOSQUE DE TITANAS, FIESTA MAYOR DEL SEÑOR DE ANIMAS, TEMPLO CHUQUINGA Y TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAMPAMARCA DISTRITOS DE CHALHUANCA CARAYAMBIA Y COTARUSE DE LA PROVINCIA DE AYMARAE REGION APURIMAC	PDT APROBADO	TURISMO	AYMARAE	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	52.000,00
24	SC	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMALIZACION Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS EN LA REGION DE APURIMAC	PLAN DE TRABAJO	MINAS	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	40.000,00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SGC/DC
Rosa de Huilado Niñez





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático



Informe N° 35-2014-GRAP/GRDE-UF

AL :Ing. Rodolfo VISAGA ALVAREZ
SUB GERENTE DE MYPES Y COMPETITIVIDAD

ASUNTO: PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE-2014

FECHA :Abancay, 31 de Marzo 2014.

Por el presente, me es grato dirigirme a Ud. para alcanzar a su despacho la priorización de proyectos al primer trimestre del año 2014, producto de las reuniones sostenidas entre la ORPI - SGMyc - SGAPS - Responsable de la UF en la GRDE. El mismo que debe ser validado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Es cuanto comunico a Ud para que se sirva determinar lo conveniente

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SGMYC
Ing. Rutil B. Hurtado Nuñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMACIÓN

C.c.
Adjunto anexo 1 (cuadro priorización, 02 folios)
SGAPS
Archivo.

31 MAR 2014

284

Pase a GDC
Formación



CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 2014

N°	COD. EMP.	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL ESTUDIO
	SC	INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA USO DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DEL MEDIO RURAL, EN LAS SIETE (07) PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	ENERGIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	35 985,08
	141001	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 17 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	SR CHANKA	RO	42 000,00
3	5/C	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION DE APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	42.000,00
	SC	PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO REGION APURIMAC	PLAN DE TRABAJO PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	450.000,00
	SC	CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PARQUES INDUSTRIALES TECNO ECOLOGICOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS DE LA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	35.763,60
	SC	DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES DE DUCTOS EN LA CIUDAD DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC.	PERFIL FACTIBILIDAD	ENERGIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	ALTA DIRECCION	APP	520.000,00
	212745	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE CHOCCECANCHA, ANCATIRA, SANTA ROSA, CHULCUSA, CHAMPACCOCHA Y ARGAMA ALTA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	70.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ORO Y EL COBRE EN LA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	GRDE	RO	250.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PAPA NATIVA REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	REGIONAL	CONTRATA	GRDE	RO	342.000,00
	SC	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SAYWITE ALTA, SAN LUIS ALTO, OCCORURO, CCOORUPAMPA, TOTORAY, LA UNION Y 24 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	363.262,00
	SC	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE ASMAYACU, PUMAHUACHO Y QUISCAPATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	52.674,00
	SC	CREACION DE LOS CENTROS DE ARTICULACION COMERCIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, CHALHUHUACHO (COTABAMBA) DE LA REGION DE APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	COMERCIO	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	GRDE	RO	395.886,48
	180181	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHINCHEROS Y ANCCO HUAYLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	CHINCHEROS	CONTRATA	SR CHANKA	RO	10.500,00
14	141224	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 23 COMUNIDADES CAMPESINAS DE 14 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS REGION APURIMAC	PERFIL	AGROPECUARIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	SR CHANKA	RO	10.000,00
	SC	CONSTRUCCION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHINCHEROS, ABANCAY Y CURAHUASI	IDR PERFIL FACTIBILIDAD	ENERGIA	MULTIPROVINCIAL	CONTRATA	DGPI	APP	3.600.000,00
16	5/C	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS 9 LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE TAMBOMBAMBA DEL DISTRITO DE HUANIPACA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	PERFIL	ENERGIA	ABANCAY	CONTRATA	ORPI	RO	48.000,00
	5/C	PROGRAMA DE TURISMO EN LA REGION DE APURIMAC	PLAN DE TRABAJO	TURISMO	MULTIPROVINCIAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	15.000.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACION DE MIRADORES TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE Y FAUNA (OSOS Y CONDORES) EN EL CANYON DEL APURIMAC DEL SECTOR TURISTICO DE KIMALLA, LACCHRUHUAY, DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	65.000,00
	SC	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY	PERFIL	TURISMO	ABANCAY	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	55.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO ANDAHUAYLAS LLUPAPUJIO SORDO/LAGUNA DE PACUCHA DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC	PERFIL FACTIBILIDAD	TURISMO	ANDAHUAYLAS	CONTRATA	DGPI	RO	1.000.000,00
	SC	SISTEMA HIDRAULICO DE LAS LAGUNAS DE TAGGATA, DISTRITO LAMBRAHA, PROVINCIA ABANCAY	IDR PERFIL FACTIBILIDAD	AGROPECUARIA	ABANCAY	CONTRATA	GRDE	RO	1.000.000,00
22	254750	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PEJERREY EN LA REGION APURIMAC	FACTIBILIDAD	PESCA	REGIONAL	CONTRATA	ORPI	RO	60.000,00
	SC	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION (LADRILLOS Y BLOQUES DE CONCRETO) EN LA REGION APURIMAC	PERFIL	TRANSFORMACION	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	56.000,00
		INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION INTERPRETACION ORIENTACION, DISFRUTE DE PAISAJE Y ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICOS ANDENERIAS DE CARATAMBA, BAÑOS TERMALES DE PINCHAHUACHO, BUSQUE DE TITANCAS, FIESTA MAYOR DEL SEÑOR DE ANIMAS, TEMPLO CHUCUNGA Y TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PANAPAMARCA DISTRITOS DE CHALHUANCA CARATAMBA Y COTARUSE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES REGION APURIMAC	PDI APROBADO	TURISMO	AYMARAES	ADMINISTRACION DIRECTA	ORPI	RO	52.000,00
24	SC	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMALIZACION Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS EN LA REGION DE APURIMAC	PLANE DE TRABAJO	MINAS	REGIONAL	ADMINISTRACION DIRECTA	GRDE	RO	40.000,00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SG-3/C
Ing. Raúl B. Huizado Núñez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”



INFORME Nº 326 -2014 GR.APURIMAC-GG/DRPI.

A : Ing. ZENON WARTHON CAMPANA
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ASUNTO : REMITO DOCUMENTO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS.

REFERENCIA : INFORME Nº 70 -2014 GRAP/GRDE/SGMYC.

FECHA : Abancay, 09 de Abril del 2014.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo remitirle adjunto a la presente el documento de la referencia en el cual nos remiten la priorización de proyectos del primer trimestre al respecto debo informar que dicha documentación se debe remitir a la Gerencia General con copia a esta dirección.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
Ing. Karen Priscilla Portocarrero Messa
DIRECTORA REGIONAL PRE INVERSIÓN

C.C
Doc. Personal.
Archivo

10 ABR. 2014 1114

G.G.
R. Portocarrero
C.R.P.I.



Jr. Puno Nº 107
Telf. /321840 Anexo: 119
Abancay - Apurímac

Teléfonos (083) 321840 /321431/322617/321

www.regionapurimac.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO



"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME No. 116 -2014-GRAP/GRDE

AL : Méd. José Lizárraga Trujillo
GERENTE GENERAL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

ASUNTO : Solicita Autorización de Priorización de Proyectos.

REF. : Informe No. 326-2014.GR.APURIMAC-GG/ORPI

FECHA : Abancay, lunes 14 de abril del 2014

Me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle adjunto al presente el documento de referencia, el que contiene la priorización de proyectos al primer Trimestre del año 2014, para su conocimiento y se sirva disponer su formulación a través de la Oficina Regional de Pre Inversión.

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
 Ing. Zenón Warthon Campana
 Gerente Regional Desarrollo Económico

c.c.
 S.G.Mypes
 O.R.P.I.
 Archivo.

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
 OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
 FECHA: 15 ABR 2014 EXP: 1036
 HORA: ADMINISTRATIVO
 Srta. Kuzuya Archivo; Entregan...
 una copia de documentos para
 seguimiento y monitoreo.
 Fecha: 15/04/14 ORPI

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
 GERENCIA GENERAL
 FECHA: 14 ABR 2014 EXP: 2671
 PARA: ORPI
 Para su atención
 FECHA: 14/04/14

ZWC/GRDE
 Sim/SIGRDE





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SUB REGION DE GRAU

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"



Chuquibambilla ,Mayo 19 del 2014.

OFICIO N° 253 -2014-GRAP/GSRG

Señor:
Med. Jose Lizarraga Trujillo
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBIDO
8638
Registro
Firma
La recepción del documento no es señal de conformidad

Abancay.-

ASUNTO : REMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE GRAU.

Es muy grato dirigirme a su Despacho, con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo remitirle el CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE GRAU para la formulacion de los perfiles de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con la Oficina Regional de Pre Inversion, en tal sentido solicito a su despacho su aprobacion y tramite correspondiente.
Se Adjunta Cuadro de Priorizacion de Proyectos de Inversion Publica .

En espera de la merecida atencion que brinde al presente,expreso a Ud. las muestras de mi especial consideracion y estima.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION - GRAU
Julio César Cosío Berrío
GERENTE

C.c.
GSRG
Archivo

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
FECHA: 23 MAY 2014 EXP: 1400
HORA: 02:10 PM
C.c. PROVEIDO ADMINISTRATIVO
Ing. Nozely Nieves
Ing. Antonio Serrano
Procedimientos y acuerdos
Fecha: 26 M.S 2014

ORFID
[Signature]





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
SUB REGION DE GRAU

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
 "AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL DE GRAU

A. CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 2014

Nº	CODIGO SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	DISTRITO	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL ESTUDIO
1	S/C	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS ANDINOS: TARWI (LUPINUS MUTABILIS) Y HABA (VICIA FADA) EN LOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU, REGION DE APURIMAC.	PDT PERFIL	PRODUCTIVO	MULTIDISTRITO (14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU)	ADMINISTRACION DIRECTA	GSRG	RO	53,568.00
2	S/C	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES CON LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ALTERNATIVO DE MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN LAS PROVINCIAS DE GRAU, COTABAMBA Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	PROVINCIAS DE GRAU, COTABAMBA Y ANTABAMBA	ADMINISTRACION DIRECTA	GSRG	RO	85,150.76
3	S/C	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO OVINO EN LAS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	PRODUCTIVO	MULTIDISTRITO (14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU)	ADMINISTRACION DIRECTA	GSRG	RO	42,385.50
4	S/C	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL: TACLLA, CCOCHACCOCHA, TAMBO, YANARICO, CHUCHAUCCASA, TASTAPATA, HUASCARO DEL DISTRITO DE CURASCO, HUAYLLATI, CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC	PDT PERFIL	EDUCACION	CURASCO, HUAYLLATI, CURPAHUASI	ADMINISTRACION DIRECTA	GSRG	RO	54,542.20





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



INFORME N° 161 - 2014-GRAP/12/GRRNGMA

A : Arq. Carlos Jiménez Carazas
Gerente General Regional

ASUNTO : REMITO PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION

FECHA : Abancay, 17 de Julio del 2014

Es muy grato dirigirme a su despacho, con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo remitir la priorización de los siguientes Proyectos de Inversión Pública, según cuadro adjunto, además se recomienda la Elaboración del Proyecto denominado "CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS LAMBRAMA, ULLPUHUAYCCO, ÑACCHERO, ANCHICHA, CHINCHICHACA Y SAN MARTIN, EN LA PROVINCIA DE ABANCAY", que fue identificado en la elaboración del PLANGRACC, propuesta que fue presentada por el Gobierno Regional de Apurímac.

Es todo cuanto informo a usted, para su atención.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Richard D. Casaverante Guillén
Ing. Richard D. Casaverante Guillén
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE PRE INVERSION
FECHA: 22 JUL 2014 EXP: 2013
PARA: [illegible]
REMITIDO ADMINISTRATIVO
Ing. Alexander Tapia
conocimiento y acciones
haga de conocimiento

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL
FECHA: 21 JUL 2014 EXP: 1976
ORPI
Por su atención
21/07/14

c.c.
Archivo.





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION



N°	COD. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD	NIVEL	FUNCION	ESTADO	U - FORMULADORA	COSTO ESTUDIO	MONTO DE INVERSION
1	259821	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHALHUANCA DE LOS DISTRITOS DE CAPAYA, SORAYA, IHUAYLLO Y COLCABAMBA Y DEL RIO PACHACHACA EN LOS DISTRITOS DE COLCABAMBA Y CHAPIMARCA EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC.	ADMINISTRACION DIRECTA	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EVALUACION	GERENCIA SUB REGIONAL AYMARAES	45,800.00	8,567,507.00
2	S/C	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCCARO, TAMBOBAMBA, COTABAMBAS - APURIMAC.	ADMINISTRACION DIRECTA	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	FORMULACION	GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS	90,000.00	8,500,000.00
3	278911	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DE LOS RIOS HUACRACOCHO, PURUCHACA Y COLCAQUI - CANAL MARIÑO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.	CONTRATA	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EVALUACION	OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION	39,200.00	3,409,390.00
4	SC	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCAUSAMIENTO DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO LAS AMERICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-REGION APURIMAC.	CONTRATA	PERFIL	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	TDR	OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION	66,930.00	3,500,000.00
5	172799	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHALHUANCA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGION APURIMAC.	CONTRATA	FACTIBILIDAD	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	FORMULACION	OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION	200,000.00	24,577,477.00

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE
Ing. Richard D. Casaverde Guillén
GERENTE REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



MEMORANDO N° 672 -2014-GRAP/11/GRDS

AL : Ing. Priscilla PORTOCARRERO MESSA
DIRECTORA OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

ASUNTO : Priorización para la formulación de proyectos a nivel de perfil

FECHA : Abancay, 22 de agosto del 2014

Visto, el Informe N° 753-2014 GR.APURIMAC-GG/ORPI suscrito por usted remitiendo el cuadro de priorización de proyectos para la formulación de estudios de pre inversión, al respecto remito a su Despacho la **priorización de proyectos educativos para la formulación de estudios de pre inversión, que son los siguientes:**

- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LAS IEP N° 54271 DE TOTORA N° 54289 DE SANTA ROSA DE ANCCO, N° 54294 DE HUACULLO, N° 54292 DE KILKATA, 54298 SONCCOCCOCHA, Y N° 54291 DE YUMIRE DEL DISTRITO DE OROPESA. PROVINCIA DE ANTABAMBA APURÍMAC.
- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS IEP N° 54046 DE HUAYLLABAMBA, N° 54075 RAUL LUNA CORDERO, N° 54905 SUR AMAERICA DE ILLANYA N° 54873 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE DE LIMAPATA, N° 54904 BANCAPATA, N° 54036 SEÑOR D ELA EXALTACIÓN Y 54560 DE PACHACHACA DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA I.E. INTEGRADA WARMAKUYAY N° 56106 DE TOTORAL, DISTRITO DE SAN GERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGION APURIMAC.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS INTEGRADA DE LA IE EL CARMELO, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS BACICOS ESPECIALES CEBE 01 BEATO PIERRE FRANCOIS JAMET, CEBE N° 12 CARMELO DEL DISTRITO DE ABANCAY, CEBE N° 07 DEL DISTRITO DE CUARAHUASI, CEBE N° 02 DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, CEBE N° 03 DISTRITO SAN JERONIMO Y CEBE N 13 DEL DIDTRITO DE CHINCHEROS; DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS – REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 54511 DE ASMAYACU, OCCORURO, N° 54056 DE LUCMOS, 54020 OCCORURO, N° 54606 DE TOTORA Y N° 54054 DE VACAS DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCTIVO DE LAS IES BENJAMIN HERENCIA Z. DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LAS IES SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA- AYMARAE-APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS II.EE. DE NIVEL PRIMARIO DE LA REGION APURIMAC

Jr. Puno 107 Abancay-Apurímac
Teléfonos: Directo (083) 32-4084 Central (083) 32-1022 anexo 140 FAX (083)32-4084





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"




- MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL DE LA REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS INSTITUCIONES NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA ISTP Y ISPP EN LA REGION APURIMAC.

Se anexa 19 folios.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Prof. Mikhaíl Chungui Niño de Guzman
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

22 AGO 2014 2382
21 Jobs
Ing. H. Luisa Flores
pensar, información y
conocimiento y acción
25 08 2014


Archivo
MCHNG/GRDS

Roxana R.

Jr. Puno 107 Abancay-Apurímac
Teléfonos: Directo (083) 32-4084 Central (083) 32-1022 anexo 140 FAX (083)32-4084



Repositorio Institucional - UNAMBA - PERÚ



GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Luz en los Andes"



INFORME N° 52 - 2014-GRAP/11/GRDS/UF

AL : Prof. MIKHAIL CHUNQUI NIÑO DE GUZMAN.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ASUNTO : Priorización para la formulación de Proyecto a nivel de Perfil.

FECHA : Abancay, 06 de Octubre del 2014.


Me dirijo a usted para informarle que la Dirección Regional de Pre inversión tiene programado la formulación de los proyectos a nivel de perfil para lo que se requiere emitir el documento de priorización para el segundo semestre correspondiente.

A continuación se detalla la relación de proyectos a formularse:

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA GRAU, CHINCHEROS Y COTABAMBAS- REGION APURIMAC
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL ORFELINATO DIVINA PROVIDENCIA DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACION EN PROCESO DE INCLUSION EN LA REGION APURIMAC.
- INSTALACION DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE MATARA DEL DISTRITO DE HUAQUIRCA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC.
- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL, DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIMAC.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y atención correspondiente

Atentamente


Edison U. Chirinos Maneses
COORDINADOR UF GRDS.

17 OCT 2014






Abancay 15 de Octubre del 2014

OFICIO Nº 001-2014-IME/GRA/DREA/DGI

SEÑOR. : Prof. MIKHAIL CHUNQUI NIÑO DE GUZMAN.
 GERENTE REGIONAL DE DESRROLLO SOCIAL.

Presente.



ASUNTO : RÉMITO CUADRO DE PRIORIZACION DE PROYECTOS.

Tengo a bien de dirigirme a usted. Para hacer de su conocimiento. y remitirle el cuadro de Priorización de Proyectos para la formulación de los perfiles por parte de la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Educación Perfiles que corresponde al año 2014 Presupuestados a través del Programa Presuestal 091 Acceso de la Población de 3 a 16 años a los servicios Educativos Públicos de Educación Básica Regular Meta 0028 Gestión para la Generación de nuevos Espacios Educativos de Calidad para el Incremento de cobertura en Educación Inicial.

En tal sentido solicito a su despacho tenga a bien su aprobación a través de Gerencia de Infraestructura y por intermedio de la ORPI del Gobierno Regional de Apurímac. Se adjunta al presente el cuadro de priorización de Proyectos.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

Mina

15 OCT. 2014

*Dr. Esteban Alvarado, Coord. de la
 U.F. Formuladora para su
 atención e informe.*



PRIONIZACION DE PROYECTOS EN I.E.I. 2,014 - UNIDAD FORMULADORA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

N°	COD. SNIP	FUNCION FINAL	ACTIVIDADES	FUNCION	PROVINCIA	MODALIDAD DE ESTUDIOS	DEPENDENCIA QUE PRIORIZO	COSTO DEL ESTUDIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	SC	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977 CUNYARI DEL DISTRITO DE ANDARAPA, N° 54653 ANYANIZO DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA, N° 55006-16 ISCHU ORCCO, N° 54494 CCALLO OCCO DEL DISTRITO DE TUMAY HUARACA, N° 54631 CHIUILLAN DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC"	PERFI.	EDUCACION	ANDAHUAYLAS	ADMINISTRACION DIRECTA	UF EDUCACION	S/. 84,129.36	RO

[Handwritten signature and stamp]





GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 1091 2014-GR-APURÍMAC-13-GRI.

AL : ING. KAREN PRISCILA PORTOCARRERO MESSA
DIRECTORA REGIONAL DE PRE INVERSION.

ASUNTO : PRIDRIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

REF. : INFORME N° 841-2014-GR.APURIMAC-GG/DRPI

FECHA : Abancay, 13 de Octubre del 2014

Por el presente me dirijo a usted con la finalidad de remitirle mediante el presente, la priorización de los proyectos de inversión pública de la función de transportes, para la viabilización de perfiles de acuerdo al documento de la referencia según cuadro resumen:

Cod. Snip	Proyecto
268054	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCLLACCASA-PACCAYPATA-COYLLURQUI-TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC
131923	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ANTABAMBA-HUACULLO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC
149345	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA , DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRAND - ANTABAMBA - APURIMAC
77723	CONSTRUCCION CARRETERA OSCCOCCA-COTAHUARCAY-HUICHIHUA-HUAQUIRCA, DISTRITOS DE CHUQUIBAMBILLA Y HUAQUIRCA, PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC
165454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TALAVERA-HUANCARAY-SAN ANTONIO DE CACHI-CHIARA, DISTRITOS DE TALAVERA, HUANCARAY, SAN ANTONIO DE CACHI Y CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC
S/C	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEL SUR EN LOS TRAMOS: CARRETERA IZCAHUACA-CHUNCHUMAYO-HUACULLO-HAQUIRA DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES, ANTABAMBA Y COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC
S/C	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CABONERA-HUANIPACA-KIUÑALLA, PROVINCIA DE ABANCAY-REGION APURIMAC

Atentamente,



Ing. Robinson Palacios

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

FECHA: 13 OCT 2014 EXP: 2829

HORA: 07:40

PROVEIDO ADMINISTRATIVO

Ing. J. A. Serrano

Señor Informes de

y acciones pertinentes

C.c.
GG
Archivo





GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



MEMORANDO N° 001-2014-GRAP/11/GRDS

A : Ing. KAREN PRISCILLA PORTOCARRERO MESSA
 Directora de la Oficina Regional de Pre Inversión

ASUNTO : Priorización para la formulación del proyecto a nivel de perfil.

FECHA : Abancay, 10 de noviembre de 2014

Visto, el Informe N° 53-2014-GRAP/11/GRDS/UF, suscrito por el Coordinador de la UF de la GRDS, manifestando que la Dirección Regional de Educación Apurímac está solicitando la priorización del Proyecto a nivel de Perfil:

"Mejoramiento del servicio educativo inicial en las instituciones educativas N° 977 Cunyari del distrito de Andarapa; N° 54653 Anyanizo del distrito de Kaquiabamba; N° 54725 Santiago de Yanama; 5500616 Ischu Orcco; N° 54494 Ccallo Occo del distrito de Tumay Huaraca; N° 54631 Chiquillan del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac"

Remito el documento indicado en primer párrafo para su conocimiento y acciones administrativas según corresponda.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 Prof. Mikhail Chunqui Niño de Guzmán
 GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
 OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN
 FECHA: 11 NOV. 2014 EXP: 30155
 HORA: 04:10 PM
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
 Archivar
 Ing. M. Luisa Flores
 Lic. Ramiro Pacheco
 Fecha: 11 / 11 / 2014
 Sr. Edison Chirinos

Archive
 MGHNQ/GRDS
 Roxana R.

Jr. Puno 107 Abancay Apurímac
 Teléfonos: Directo (083) 32-4084 Central (083) 32-1022 anexo 140 FAX (083)32-4084





GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Luz en los Andes"



INFORME N° 53 - 2014-GRAP/11/GRDS/UF

AL : Prof. MIKHAIL CHUNQUI NIÑO DE GUZMAN.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ASUNTO : Priorización para la formulación de Proyecto a nivel de Perfil.

FECHA : Abancay, 06 de Noviembre del 2014.

Me dirijo a usted para informarle que la Dirección Regional de Educación Apurímac viene solicitando la Priorización de los proyecto a nivel de perfil:

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 977 CUNYARI DEL DISTRITO DE ANDARAPA; N° 54653 ANYANIZO' DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA; N° 54725 SANTIAGO DE YANAMA; N° 5500616 ISCHU ORCCO; N° 54494 CCALLO OCCO DEL DISTRITO DE TUMAY HUARACA; N° 54631 CHIQUILLAN DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC.

Quienes se encargaran por intermedio de la Unidad formuladora de dicha entidad de la formulación de los perfiles para lo cual requieren la priorización teniendo en cuenta la necesidad urgente de contar con los servicios de los Centros Educativos iniciales de la provincia de Andahuaylas.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y atención correspondiente

Atentamente

GOSIBIBO REGIONAL DE APURIMAC

Edison U. Chirinos Maneses
 COORDINADOR UF ORAS.

03 NOV. 2014

Confirmando a D. P. P. para su conocimiento y acciones administrativas según correspondiente.

10 11 14





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”



INFORME Nº 994 -2014-GR.APURIMAC-GG/DRPI

A : **Prof. MIKHAIL CHUNQUI NIÑO DE GUZMAN**
Gerente Regional de Desarrollo Social

Asunto : SOLICITO PRIORIZACION DEL PIP.

Referencia : INFORME Nº 014-2014-GR-APURIMAC-GG/DRPI/NNNU

Fecha : Abancay, 24 de Noviembre del 2014.

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de informarle que se viene reformulando el Plan de Trabajo para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP Educativo denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CEBE Nº 01, CEBE Nº 12 DEL DISTRITO DE ABANCAY, CEBE Nº 07 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, CEBE Nº 02 DISTRITO DE ANAHUAYLAS, CEBE SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, CEBE Nº 13 DEL DISTRITO CHINCHEROS, APURIMAC”. Pero tras la Solicitud de la incorporación del Centro Básico Especial de Uripa del Distrito de Anco huayllo, provincia de Chincheros al presente PIP.

Se Solicita a su Despacho se realice la RECTIFICACION del presente documento con la inclusión del presente documento de priorización con la inclusión del CEBE Uripa, la que debe tomar como denominación “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CEBE Nº 01, CEBE Nº 12 DEL DISTRITO DE ABANCAY, CEBE Nº 07 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, CEBE Nº 02 DISTRITO DE ANAHUAYLAS, CEBE SAN JERONIMO, CEBE Nº 13 DEL DISTRITO CHINCHEROS, CEBE URIPA DEL DISTRITO DE ANCO HUAYLLO, REGION APURIMAC”. Así mismo Solicito la Priorización del Proyecto “RECUPERACION RESTAURACION DEL MONUMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LA IGLESIA CATEDRAL DE ABANCAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC”. Adjunto al presente Cuadro de Priorización

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN

Ing. Karen Priscilla Portocarrero Messa
DIRECTORA REGIONAL PRE INVERSIÓN

24 NOV. 2014

C.c.
Archivo
F.Y.T.C/DRPI

Jr. Puno N° 107
Tel / 321840 Anexo 119
Abancay-Apurimac

Teléfonos (083) 321840 /321431/322617/321

www.regionapurimac.gub.pe





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Luz en los Andes"



INFORME N° 58 - 2014-GRAP/11/GRDS/UF

AL : Prof. MIKHAIL CHUNQUI NIÑO DE GUZMAN.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ASUNTO : Priorización para la formulación de Proyecto a nivel de Perfil.

FECHA : Abancay, 26 de Noviembre del 2014.



Me dirijo a usted para informarle que la Oficina Regional de Pre inversión viene solicitando la Priorización de los proyectos a nivel de perfil:

❖ Mejoramiento del Servicio Educativo del CEBE N° 01; CEBE N° 12 del Distrito de Abancay, CEBE N° 07 Del Distrito de Curahuasi, CEBE N° 02 Distrito de Andahuaylas, CEBE San Jerónimo Distrito de San Jerónimo, CEBE N° 13 del Distrito de Chincheros, CEBE Uripa Del Distrito de Anco Huayllo ; así mismo el Proyecto de RECUPERACION RESTAURACION DEL MONUMENTO ARTISTICO CULTURAL DE LA IGLESIA CATEDRAL DE ABANCAY, DISTIRTO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.

Para lo cual señor Gerente sirvase emitir un documento de Priorización de los Perfiles en Mención.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y atención correspondiente

Atentamente

 **GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC**

Edison U. Chirinos Meneses
COORDINADOR UF GRDS.

26 NOV. 2014

*Laurencia Gonzalez solici.
para la priorización respectiva*

11 12 14





GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"



INFORME N° 58-2014-GRAP/11/GRDS

AL : MÉD. JOSE LIZÁRRAGA TRUJILLO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ASUNTO : Solicita rectificación de denominación de proyecto y priorización para la formulación de proyectos a nivel de perfil.

FECHA : Abancay, 2 de diciembre del 2014

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente e informar lo siguiente:

Visto, el Informe N° 58-2014-GRAP/11/GRDS/UF, suscrito por el Coordinador de la UF de la GRDS, informando que la Oficina Regional de Pre Inversión viene solicitando la rectificación del siguiente proyecto a nivel de perfil:

- ✓ *Mejoramiento del servicio educativo del CEBE N° 1, CEBE N° 12 del Distrito de Abancay, CEBE 07 del distrito de Curahuasi, CEBE N° 02 distrito de Andahuaylas, CEBE San Jerónimo del distrito de San Jerónimo, CEBE N° 13 del distrito Chincheros, Apurímac"*

Debe incluirse al **Centro Básico Especial de Uripa, del distrito de Anco Huayllo, Chincheros; y debe tomar como denominación:**

- ✓ *Mejoramiento del servicio educativo del CEBE N° 1, CEBE N° 12 del Distrito de Abancay, CEBE 07 del distrito de Curahuasi, CEBE N° 02 distrito de Andahuaylas, CEBE San Jerónimo del distrito de San Jerónimo, CEBE N° 13 del distrito Chincheros, CEBE uripa del distrito de Anco Huayllo, Región Apurímac"*

Asimismo, se solicita la **priorización del PIP indicado en el párrafo anterior y los siguientes PIPs:**

- ✓ *"Recuperación restauración del monumento artístico cultural de la iglesia Catedral de Abancay, distrito y provincia de Abancay, Región Apurímac".*
- ✓ *Instalación del coliseo deportivo en la localidad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay – Región Apurímac.*

Es cuanto tengo que informar para su conocimiento y se emita un documento de priorización de los perfiles en mención.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Prof. Aníbal Chuquiñano de Guzmán
 GERENTE GENERAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

02 DIC. 2014 8196

Archivo
 MCHNG/GRDS
 Roxana R.



Jr. Puno 107 Abancay-Apurímac
 Teléfonos: Directo (083) 32-4084 Central (083) 32-1022 anexo 140 FAX (083)32-4084

